



T.C.  
**GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ**

2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME  
VE DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
TOKAT 2009



**T.C**  
**GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ**

**2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE**  
**DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**  
**TOKAT- 2009**



## **2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

### **1. Yönetici Özeti**

Kamu mali yönetim sisteminde değişiklik yapan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu idarelerinin ve mali yönetimde görevli olanların kamu kaynaklarının elde edilmesi, yönetimi ve kullanılmasında yürüttükleri faaliyetler ile iş ve işlemleri nedeniyle hiyerarşik üstlerine, denetim ve değerlendirme yapmakla görevli kuruluşlar ile kamuoyuna hesap ve bilgi verme sorumluluğu getirmiştir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun'un 25 inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleştirme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir.

Üniversitemiz, 1992 yılında 3837 sayılı Kanunla kurulmuş ve kurulduğu günden itibaren, çağdaş, dinamik, paylaşımcı, bilgi ve teknoloji üreten, bölgenin, sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayan bir kurum olmuş ve olmaya devam etmektedir. Üniversitemiz, fiziki altyapı yatırımlarını tamamlama yolunda olup, 2008 yılı yatırım ödeneklerinin sektör bazında dağılımı, %39'unu eğitim sektörü, %13'ünü eğitim-beden eğitimi ve spor sektörü, %45'ini sağlık sektörü ve %3'ünü de teknolojik araştırmalarla ilgili makine-teçhizat, mal ve malzeme alımları oluşturmaktadır.

Üniversitemiz gelişen mimari teknolojiye uygun hizmet binalarının yaptırılması ve teknolojik makine-teçhizatla donatılmış hizmet binası, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmayı hedeflenmiş olup, bu hedef doğrultusunda fiziki alt yapı yatırımlarının ve eğitim hizmet binalarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitemiz "2008 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu" 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

**Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİ**  
**Rektör**

## **2. Genel Değerlendirme**

### **• Kuruluşun Vizyonu :**

Havza gelişimi ve tarıma dayalı teknolojik araştırmalarda dünya çapında kabul gören, bölge halkı ile bilimi buluşturan, doğa ve çevre dostu, uygulamalı eğitime öncelik veren, yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölge üniversitesi olmak.

### **• Kuruluşun Misyonu :**

Yükseköğretim kurumlarının ülkede yayılması politikasıyla Tokat'ta kurulan üniversitemizin misyonu, kanunla verilen temel görevlerinin yanı sıra bölge halkının sosyokültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak ve uluslararası alana açılmaktır.

### **• Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri :**

- Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkmak
- Atatürk ilke ve inkılablarına gönülden bağlılık
- Akademik özgürlük
- Akademik mükemmellik
- Azim ve kararlılık
- Bilimsellik
- Çağdaşlık
- Etik değerlere bağlılık
- Katılımcılık
- Liyakat
- Sorumluluk bilinci
- Şeffaflık
- Üretkenlik
- Ülkemize hizmet

### **• Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları :**

Finansman Kaynakları:

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri


2) İkinci Öğretim Gelirleri

B) Bütçe Dışı Kaynak


- Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır

**• Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi :**

Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık ve Teknolojik Araştırmalar olmak üzere 4 sektör altında toplanmıştır. Eğitim-Yükseköğretim sektöründe 7 adet, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 1 adet, Sağlık Sektöründe 3 adet, Teknolojik Araştırmalar Sektöründe ise 1 adet ileri araştırma proje ile Bilimsel Araştırma Projeleri yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alan grafik ve tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

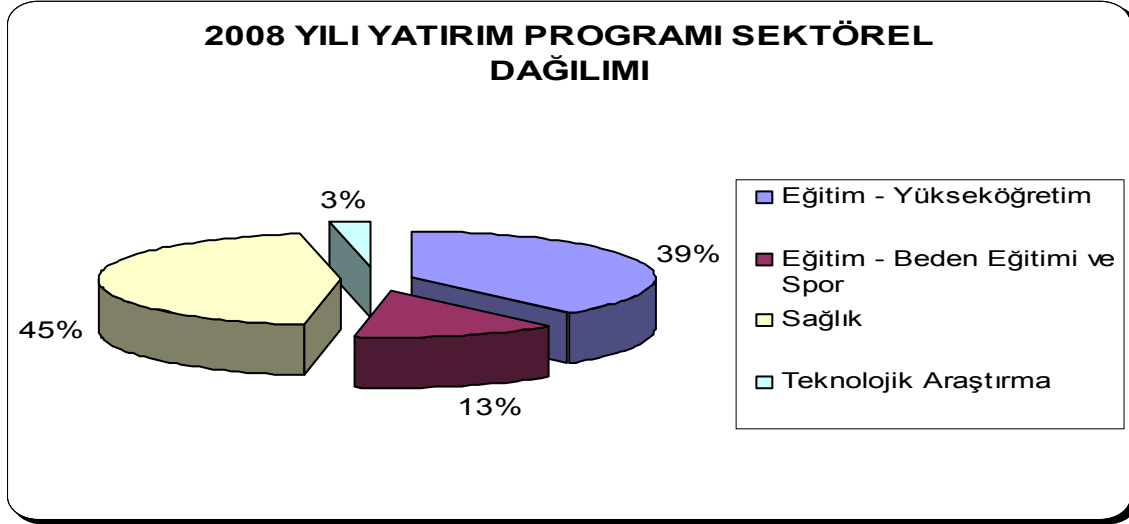

Sektör Bazında Dağılım

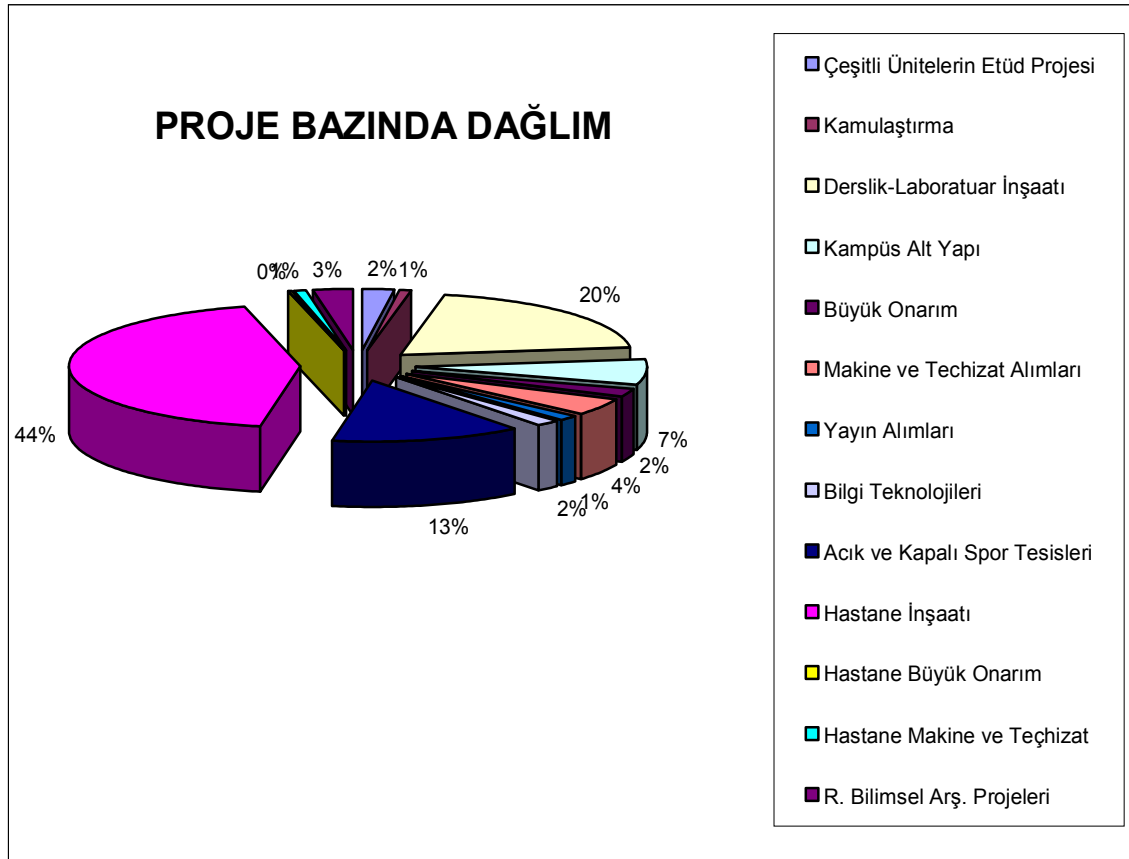

Proje Bazında Dağılım

2008 Yılı Ödenek Durumu Sektör-Proje Bazında



Sektörü	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM			(Bin TL)
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2008 Yılı Ödeneği
<b>SEKTÖR TOPLAMI</b>			<b>83.797</b>	<b>8.880</b>
<b>Etüd-Proje İşleri Toplamı</b>			<b>1.527</b>	<b>500</b>
1994H031235	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	1994-2008	1.527	500
<b>Devam Eden Projeler Toplamı</b>			<b>79.890</b>	<b>6.000</b>
1994H031280	Derslik-Laboratuvar İnşaatı	1994-2009	54.890	4.500
	Derslik Laboratuvar (Şartlı Bağış)	2007-2009		0
1994H031270	Kampüs Altyapısı	1994-2009	25.000	1.500
<b>Yeni Projeler Toplamı</b>			<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
2008H032390	Büyük Onarım	2008-2008	500	500
2008H032400	Makine ve Teçhizat Alımları	2008-2008	1.000	1.000
2008H032410	Yayın Alımları	2008-2008	300	300
2008H032420	Bilgi Teknolojileri	2008-2008	400	400

Sektörü	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM (KAMULAŞTIRMA)			(Bin TL)
	Kamulaştırma	2008-2008	180	180

Sektörü	EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR			(Bin TL)
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2007 Yılı Ödeneği
<b>SEKTÖR TOPLAMI</b>			<b>7.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Devam Eden Projeler Toplamı</b>			<b>7.000</b>	<b>3.000</b>
1994H050110	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1994-2008	7.000	3.000

Sektörü	SAĞLIK			(Bin TL)
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2008 Yılı Ödeneği
<b>SEKTÖR TOPLAMI</b>			<b>26.206</b>	<b>10.000</b>
<b>Devam Eden Projeler Toplamı</b>			<b>25.956</b>	<b>9.750</b>
2005I000600	Hastane İnşaatı	2005-2008	25.956	9.750
<b>Yeni Projeler Toplamı</b>			<b>250</b>	<b>250</b>
2008I000550	Büyük Onarım	2000-2008	50	50
2008I000560	Makine ve Teçhizat Alımları	2008-2008	200	200

Sektörü	TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR			(Bin TL)
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2008 Yılı Ödeneği
<b>SEKTÖR TOPLAMI</b>			<b>630</b>	<b>630</b>
<b>Yeni Projeler Toplamı</b>			<b>630</b>	<b>630</b>
2008K120660	Rektörlük Bilimsel Araşt. Projeleri	2008-2008	630	630

<b>ÜNİVERSİTE TOPLAMI</b>			<b>117.633</b>	<b>22.510</b>
---------------------------	--	--	----------------	---------------



## FİZİKİ ALANLAR CEVELİ

S.No	Hizmet Binası Adı	Mevcut Fiziki Kapalı Alanlar m <sup>2</sup>							Devam Eden Ve Yıllara Sarı Fiziki Kapalı Alanlar m <sup>2</sup>						Ü. Kampus Alanı m <sup>2</sup>		
		İdari Binalar	Derslik	Laboratuvar	Kantin/Kafe Vb.	Lojman	Yurt	Kapalı Spor T.	İdari Binalar	Derslik	Laboratuvar	Kantin/Kafe Vb.	Yurt	Açık Spor T.		Toplam	
1	Rektörlük	4.950	0	0	0	5.799	0	0	10.749	0	0	0	0	0	0	0	10.749
2	Ziraat Fakültesi	13.540	920	6.104	200	0	0	0	20.764	0	0	0	0	0	0	0	20.764
3	Fen-Edebiyat Fakültesi	11.621	2.375	3.353	100	0	0	0	17.449	0	0	0	0	0	0	0	17.449
4	İktisadi ve İd.Bil. Fakültesi	7.895	1.680	360	215	0	0	0	10.150	0	0	0	0	0	0	0	10.150
5	Tıp Fakültesi	4.196	114	370	0	0	0	0	4.680	0	0	0	0	0	0	0	4.680
6	Eğitim Fakültesi	10.201	1.790	165	100	0	0	0	12.256	2.500	10.000	0	0	0	0	12500	24.756
7	Üniversite Eğitim Hastanesi	13.045	0	0	60	0	0	0	13.105	0	0	0	0	0	0	0	13.105
8	Hastane Binası	22000	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000
9	Tokat Beden Eğt. Spor Yük. Ok.	1.150	650	80	320	0	0	4.530	6.730	0	0	0	0	0	0	0	6.730
10	Tokat Sağlık Yüksekokulu	1.245	820	135		0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	2.200
11	Zile Dinçerler Turizm ve Otel. Yük. Ok.	1.960	400	175	70	0	0	0	2.605	6.725	630	300	645		0	8300	10.905
12	Tokat Meslek Yüksekokulu	7.895	1.680	360	215	0	0	0	10.150	0	0	0	0	0	0	0	10.150
13	Niksar Meslek Yüksekokulu	2.490	1.140	135	385	0	0	0	4.150	0	0	0	0	0	0	0	4.150
14	Erbaa Meslek Yüksekokulu	2.490	1.140	135	385	0	0	0	4.150	0	0	0	0	0	0	0	4.150
15	Zile Meslek Yüksekokulu	2.490	1.140	135	385	0	0	0	4.150	0	0	0	0	0	0	0	4.150
16	Turhal Meslek Yüksekokulu	2.294	2.626	290	1.290	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	6.500
17	Almus Meslek Yüksekokulu	475	120	100	100	0	0	0	795	2.000	1.500	500	500	0	0	4500	5.295
18	Reşadiye Meslek Yüksekokulu	600	215	0	0	0	0	0	815	0	0	0	0	0	0	0	815
19	Artova Meslek Yüksekokulu	885	210	0	106	0	0	0	1.201	0	0	0	0	0	0	0	1.201
20	Koyulhisar Meslek Yüksekokulu	1.200	2400	400	800	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	4.800
21	Kelkit Araştırmalar Merkezi	652	0	0	0	0	0	0	652	0	0	0	0	0	0	0	652
22	Merkezi Kafeterya	0	0	0	3700	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700
23	Merkezi Kütüphane	3.470	0	0	0	0	0	0	3.470	0	0	0	0	0	0	0	3.470
24	Misafirhane	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3000	3.000
25	Kampus Isı Merkezi	2.050	0	0	0	0	0	0	2.050	0	0	0	0	0	0	0	2.050
26	Yemekhane	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
27	Kreş Binası	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300
28	Yurt	0	0	0	0	0	1150	0	1.150	0	0	0	0	0	0	0	1.150
<b>TOPLAM</b>		<b>118.794</b>	<b>19.420</b>	<b>12.297</b>	<b>12.931</b>	<b>5.799</b>	<b>1.150</b>	<b>4.530</b>	<b>174.921</b>	<b>14.225</b>	<b>12.130</b>	<b>800</b>	<b>1.145</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>203.521</b>

**Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mevcut Taşınmazları ve Kapalı Mekânları**

<b>Tablo 1: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı</b>				
Yerleşke Adı	Mülkiyet Duruma göre Taşınmaz alanı(m <sup>2</sup> )			Toplam (m <sup>2</sup> )
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	
Taşlıçiftlik Kampüsü	1.112.898,00	351.542,00		1.464.440,00
Araştırma Uyg.Hast.		83.977,00		83.977,00
Tıp Yataklı Hastanesi		2.829,00		2.829,00
Lojmanlar	3.339,00			3.339,00
Turhal MYO		112.529,97		112.529,97
Zile MYO	107.543,00	34.142,92		141.685,92
Erbaa MYO		463.950,00		463.950,00
Niksar MYO	1.436,00	861.215,00		862.651,00
Reşadiye MYO		21.181,68		21.181,68
Almus MYO		31.843,00		31.843,00
Artova MYO		7.768,71		7.768,71
Koyulhisar MYO	20.724,75			20.724,75
<b>TOPLAM</b>	<b>1.245.940,75</b>	<b>1.970.979,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216.920,03</b>

<b>Tablo 2: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı</b>			
Yerleşke Adı	Kapalı alan miktarı(m <sup>2</sup> )		Toplam (m <sup>2</sup> )
	Üniversite	Maliye Hazinesi	
Taşlıçiftlik kampüsü	102.404	-	102.404
Şehir Yerleşkesi	42.699	-	42.699
İlçe Okullar	29.818	-	29.818
<b>TOPLAM</b>	<b>174.921</b>	<b>-</b>	<b>174.921</b>

<b>Tablo3: kapalı mekanların hizmet alanlarına göre dağılımı</b>				
Hizmet alanı	Taşlıçiftlik Kampüsü	Şehir Yerleşkesi	İlçeler	Toplam(m <sup>2</sup> )
Eğitim	76.519		29.166	105.685
Sağlık		38.435		38.435
Beslenme	8.200			8.200
Kültür	3.470			3.470
Spor	4.105	425		4.530
Diğer (idari,tesis,depo vb.)	10.110	3.839	652	14.601
<b>TOPLAM</b>	<b>102.404</b>	<b>42.699</b>	<b>29.818</b>	<b>174.921</b>



**Tablo4: Lojmanların dağılımı**

Hizmet alanı	Taşlıçiftlik Kampüsü	Şehir yerleşkesi	Toplam (m <sup>2</sup> )	Açıklama
Meydan Lojmanları	-	1.719	1.719	Tablo3 de şehir yerleşkesi içerisinde diğer kısmında
Fidanlık Lojmanları	-	1.620	1.620	Tablo3 de şehir yerleşkesi içerisinde diğer kısmında
Kampüs Lojmanları	1.960	-	1.960	Tablo3 de Taşlıçiftlik kampüsü içerisinde diğer kısmında
Rektörlük konutu	-	500	500	Tablo3 de şehir yerleşkesi içerisinde diğer kısmında
<b>TOPLAM</b>	<b>1.960</b>	<b>3.839</b>	<b>5.799</b>	

**• 2008 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı :**

2008 yılında 22.000 m<sup>2</sup> Araştırma ve Uygulama Hastanesi Binası tamamlanmıştır.

**• 2008 Yılı Yatırım Uygulamaları :**

- **Genel Yatırım Uygulama Durumu:** 2008 Yılı Yatırım Programı ile Üniversitemize 22.510.000,00-TL'sı ödenek tahsis edilmiştir. 2008 Yılı Program Revizyonu ve 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7'inci maddesinin 3. fıkrası gereğince Yatırımları Hızlandırma Ödeneği'nden 2.000.000,00-TL'sı Derslik-Laboratuar Projesine, 2.000.000,00-TL'sı Kampüs Altyapısı Projesine ve 1.900.000,00-TL'sı da Hastane İnşaatı Projesine olmak üzere toplam 5.900.000,00-TL'sı aktarma yapılmıştır.

2008 yılında projelerin yıl içerisindeki durumları dikkate alınarak, Derslik Laboratuar Projesindeki 1.500.000,00-TL'sı, Kampus Altyapı Projesine, Sağlık Sektörü Büyük Onarım Projesindeki 50.000,00-TL'sı, Eğitim Sektörü Büyük Onarım Projesine aktarılmıştır. Ayrıca İleri Araştırma Projesi kapsamında 2007 yılında yurtdışından makine-teçhizat alımı yapılmış ve 702.702,00-TL'sı akreditif artışı olarak 2008 yılına devretmiştir ve ödenek eklemesi yapılmıştır. Yine aynı proje için Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 130.000,00-TL'sı aktarma yapılmıştır. Üniversitemiz öz gelirlerinden (II. Öğretim) eğitim sektörü makine-teçhizat alımı projesine 30.000,00-TL'sı, bilgi teknolojileri projesine de 105.000,00-TL'sı ödenek eklemesi yıl içerisinde yapılmıştır.

Ayrıca Üniversitemiz Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu inşaatı şartlı bağış ve yardımlar ile 2007 yılında yapımına başlanılmıştır. Dinçerler ailesi tarafından 2.800.000,00-TL'sı bağış yapılmış olup, 2007 yılında 2.000.000,00-TL'sı kullanılarak büyük bir bölümü tamamlanan proje için 2008 yılında da 800.701,27-TL'sı harcama yapılmıştır.



## Yıl İçerisinde Proje Stokunda Yapılan Maliyet, Ödenek Revizyonları ve Sektörel Bazda Proje Nakdi Gerçekleşme Seviyeleri

Sektörü : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM (TL)											
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2008 Yılı Ödeneği	Eklene (Kurum İçi)	Düşülen (Kurum İçi)	Yedek Ödenekten	Bloke	Toplam Ödenek	Harcama Miktarı	Gerçekleşme (%)
1994H031235	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	1994-2008	1.527.000,00	500.000,00					500.000,00	337.539,00	67,51
1994H031280	Derslik-Laboratuar İnşaatı	1994-2009	54.890.000,00	4.500.000,00		-1.500.000,00	2.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	Derslik-Laboratuar İnşaatı (Şartlı Bağış)				800.701,27				800.701,27	798.385,00	99,71
1994H031270	Kampüs Altyapısı	1994-2009	25.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2007H031750	Büyük Onarım	2008-2008	500.000,00	500.000,00	50.000,00				550.000,00	545.415,00	99,17
2007H031760	Makine ve Teçhizat Alımları	2008-2008	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00	927.200,00	92,72
	İkinci Öğretim Gelirlerinden				30.000,00				30.000,00	29.209,00	97,36
2007H031770	Yayın Alımları	2008-2008	300.000,00	300.000,00					300.000,00	298.376,00	99,46
2007H031780	Bilgi Teknolojileri	2008-2008	400.000,00	400.000,00					400.000,00	128.115,00	32,03
	İkinci Öğretim Gelirlerinden		0,00		105.000,00				105.000,00	104.851,00	99,86
	Kamulaştırma		180.000,00	180.000,00					180.000,00		0,00
SEKTÖR TOPLAMI			83.797.000,00	8.880.000,00	2.485.701,27	-1.500.000,00	4.000.000,00	0,00	13.865.701,27	8.169.090,00	58,92

Sektörü : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (TL)											
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2008 Yılı Ödeneği	Eklene (Kurum İçi)	Düşülen (Kurum İçi)	Yedek Ödenekten	Bloke	Toplam Ödenek	Harcama Miktarı	Gerçekleşme (%)
1994H050110	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1994-2008	7.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00	1.842.181,00	61,41
SEKTÖR TOPLAMI			7.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.842.181,00	61,41

Sektörü : SAĞLIK (TL)											
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2008 Yılı Ödeneği	Eklene (Kurum İçi)	Düşülen (Kurum İçi)	Yedek Ödenekten	Bloke	Toplam Ödenek	Harcama Miktarı	Gerçekleşme (%)
2005I000600	Hastane İnşaatı	2005-2008	25.956.000,00	9.750.000,00	1.900.000,00				11.650.000,00	11.262.448,00	96,67
2007I000530	Büyük Onarım	2008-2008	50.000,00	50.000,00		-50.000,00			0,00	0,00	0,00
2007I000540	Makine ve Teçhizat Alımları	2008-2008	200.000,00	200.000,00					200.000,00	188.017,00	94,01
SEKTÖR TOPLAMI			26.206.000,00	10.000.000,00	1.900.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	11.850.000,00	11.450.465,00	96,63

Sektörü : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR (TL)											
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2008 Yılı Ödeneği	Eklene (Kurum İçi)	Düşülen (Kurum İçi)	Yedek Ödenekten	Bloke	Toplam Ödenek	Harcama Miktarı	Gerçekleşme (%)
2003K120510	İleri Araştırma Projeleri	2003-2008	0,00		702.702,00		130.000,00		832.702,00	832.702,00	100,00
2007K120890	Rektörlük Bilimsel Araşt. Projeleri	2007-2007	630.000,00	630.000,00					630.000,00	425.275,00	67,50
SEKTÖR TOPLAMI			630.000,00	630.000,00	702.702,00	0,00	130.000,00	0,00	1.462.702,00	1.257.977,00	86,00
ÜNİVERSİTE TOPLAMI			117.633.000,00	22.510.000,00	5.088.403,27	-1.550.000,00	4.130.000,00	0,00	30.178.403,27	22.719.713,00	75,28



### **Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar :**

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe ödenek tavanları, 5018 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanan “Orta Vadeli Mali Plan” ile belirlenmektedir. Bu ödenek tavanlarının sektörel bazda belirlenmesinde, önceden kurumların görüşlerinin alınması veya rakamsal olarak sektör-proje bazında teklif alınması suretiyle ödenek teklif tavanlarının belirlenmesi yatırım programı uygulayan kurumların projelerini sonuçlandırmasında ve amaçlarına ulaşmasında fayda sağlayacaktır.

Yeni ihtiyaçlar için son yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından yeni proje almakta zorluklar yaşanmaktadır.

Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır. Ancak, Maliye Bakanlığınca 2008 yılı yatırım ödenekleri bloke tutulmamıştır.

### **3. 2008 Yılı Proje Uygulamaları :**

#### **Sektörü: Eğitim – Yükseköğretim**

#### **1. 1994H031235 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:**

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi işi için, 2008 Yılı Yatırım Programı ile 500.000,00-TL'sı ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında 337.539,00-TL'sı harcanarak 16.000 m<sup>2</sup> Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Projesi ile 7.500 m<sup>2</sup> Eğitim Fakültesi Binası projesi çizdirilmiştir.



Tıp Fakültesi Morfoloji Binası



Eğitim Fakültesi Binası

#### **2. 1994H031280 Derslik – Laboratuar İnşaatı Projesi:**



Derslik – Laboratuvar İnşaatı Projesi için 2008 Yılı Yatırım Programı ile 4.500.000,00-TL’sı ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamı içerisinde Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ile Eğitim Fakültesi Binası İnşaatları bulunmaktadır. Yıl içinde 1.000.000,00-TL’sı ek ödenek tahsis edilerek Almus Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı da bu proje kapsamına dahil edilmiştir.

Yine yıl içinde 1.000.000,00-TL’sı ek ödenek gelmiş olup toplam ödenek 6.500.000,00-TL’sı olmuştur. Bu projeden yıl içinde Kampus Altyapı projesine 1.500.000,00-TL’sı aktarma yapılmıştır. Almus Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı ve Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ihaleleri 2008 yılı içinde yapılmış ve sonuçlandırılmıştır. Bunlardan Almus Meslek Yüksekokulu İnşaatı işi 2008 yılı içinde sözleşmeye bağlanmış, ancak Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı işleri 2008 yılı içinde sözleşmeye bağlanamamıştır. Almus Meslek Yüksekokulu İnşaatı işinde yıl sonu olması nedeni ile hava şartlarının uygun olmaması ve diğer iki işin ise 2008 yılı içinde sözleşmeye bağlanamaması sebebi ile harcama yapılamamıştır.

Ayrıca, şartlı bağış ve yardımlar ile 2007 yılında yapımına başlanan Üniversitemiz Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu inşaatı işine 2008 yılında Dinçerler ailesi tarafından 800.000,00-TL’sı bağış yapılmış olup, yıl içinde yatırım programı ile ilişkilendirilerek gelir-gider kayıtları yapılmak suretiyle 800.000,00-TL’sı kullanılmıştır.



Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu İnşaatı

### 3. 1994H0312270 Kampüs Altyapısı Projesi:

2008 yılında Kampüs Altyapısı Projesi için 1.500.000,00-TL'si ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde mevcut ödenek harcanmış; 2.000.000,00-TL'si ek ödenek ve 1.500.000,00-TL'si Derslik Laboratuvar projesinden aktarma yapılarak toplam ödenek 5.000.000,00-TL'si olmuştur.

Bu proje kapsamında 5.000.000,00-TL'si harcanarak; Sağlık Kampüsünde Isı merkezi binası, 168m galeri, 150m çevre himaye çiti, 150m yağmur suyu hattı, 6.660m<sup>2</sup> prefabrik beton parke otopark ve yol kaplaması, 50m kanalizasyon hattı, 1 adet 1.600 kVA trafo, 550 kVA jeneratör, 3 adet 900 kVA UPS, 2.500m besleme hattı, 2.400m enerji hattı, 5 adet monoblok prefabrik köşk, 1 adet jeneratör kabini, 1 adet 1400 kVAr kompanzasyon, 97m<sup>2</sup> taş duvar, 50m perde duvar, 4 adet 1.000.000 kcal/h kapasiteli kalorifer kazanı, 1 adet 40 ton yakıt tankı, 336m ısıtma hattı, 168m temiz su hattı; Taşlıçiftlik kampusünde 2.281m<sup>2</sup> yemekhane çevre düzenlemesi karosiman kaplama, 3.309m yemekhane önü asfalt kaplamalı yol ve otopark, 1.840m Ziraat Fakültesi uygulama alanları himaye çitleri yapılması, Yemekhane binası için 312m ısıtma hattı, 156m temiz su hattı, 156m sac tava imalatı ve galeri aydınlatması, 156m internet hattı, 156m zayıf akım ve 156m kuvvetli akım besleme hattı, kapalı spor salonu için 732m ısıtma hattı, 366m temiz su hattı, 366m sac tava imalatı ve galeri aydınlatması, 366m internet hattı, 366m zayıf akım ve 366m kuvvetli akım besleme hattı yapılmıştır.



Sağlık Kampüsü Isı Merkezi-Şehir Yerleşkesi



Yemekhane Binası Çevre Düzenlemesi





#### 4. 2008H032390 Büyük Onarım Projesi:

2008 yılında Büyük Onarım Projesi için 500.000,00-TL'sı ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde bu ödeneğin harcanması sonucunda Hastane Büyük Onarım Projesinden 50.000,00-TL'sı ödenek aktarılmıştır. Büyük Onarım Projesi kapsamında 545.740,00-TL'sı harcanmış olup; Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümleri laboratuvarlarında alçıpan bölme duvar, boya işleri, A blok sınıflara perforje korkuluk yapılmış; Tıp Fakültesi Eğitim Binasında alçıpan bölme duvarlarla sınıf ve laboratuvar oluşturulması boya işleri, elektrik tesisat işleri, sıhhi tesisat işleri yapılmış; Rektörlük Binası 3.kat bay ve bayan tuvaletlerinin onarımı; Sürekli Eğitim Merkezi dersliklerinde alçı sıva, boya, granit, kalorifer ve elektrik tesisatı yapımı; Ziraat Fakültesi Balıkçılık Tesisleri Binasının dış cephe ısı yalıtımı, boya işleri, çatı oluklarının yenilenmesi, çatının aktarılması, elektrik tesisatı onarımı; Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Toprak Bölümü ve Tarla Bitkileri Bölümünde boya işleri, alçıpan duvar bölme işleri yapılmış; Kelkit Havzası Geliştirme Merkezinde kalorifer kazanının yenilenmesi; Niksar Meslek Yüksekokulunda amfi çatısının onarımı, bina içi boya işleri yapılmış; Zile Meslek Yüksekokulunda Konferans Salonu arkası drenaj hattı, kazan dairesi – C blok kalorifer tesisat hattı onarımı; Artova Meslek Yüksekokulunda bina çevre tretuarları, bina giriş merdiveni onarımı, yakıt tankı ilavesi yapılmış; Erbaa Meslek Yüksekokulunda 3 adet bay bayan tuvaletin fayans ve alüminyum asma tavan onarımı; Tokat Meslek Yüksekokulu Binası asansörü onarımı ve Yemekhane Binası Asansör imalatı yapılmıştır.

#### 5. 2008H032400 Makine ve Teçhizat Alımları Projesi:

2008 yılında Makine ve Teçhizat Alımları için 1.000.000,00-TL'sı ödenek tahsis edilmiş olup, bu proje kapsamında 2008 yılında 956.408,00-TL'sı harcanmıştır. Birim bazında ödenek dağılımı ve harcaması aşağıda gösterilmiştir.

#### 2008 Yılı Makine Teçhizat Detay Programı ve Gerçekleşme Durumu

Birim Adı	Ayrılan Ödenek	Harcanan Tutar
Rektörlük ve Bağlı İdari Birimler Bölümler Merkezler	220.000,00	150.956,00
Ziraat Fakültesi	100.000,00	107.300,00
Fen - Edebiyat Fakültesi	100.000,00	112.447,00
Tıp Fakültesi	400.000,00	387.121,00
Eğitim Fakültesi	100.000,00	95.545,00
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	50.000,00	44.546,00
Erbaa Meslek Yüksekokulu	15.000,00	15.831,00
Koyulhisar Meslek Yüksekokulu	15.000,00	13.454,00
Rektörlük ve Bağlı İdari Birimler Bölümler Merkezler*	30.000,00	29.208,00
<b>Toplam</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>956.408,00</b>

\* İkinci Öğretim Gelirlerinden Harcanan Tutar.

#### 6. 2008H032410 Yayın Alımları Projesi:



2008 Yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için ayrılan ödenek 300.000,00-TL'sidir. Toplam ödeneğimizin 298.375,94.-TL'si kullanılmıştır.

2007 Yılında basılı kitap sayımız 43.943 iken 2008 yılında ise bağışlarla birlikte bu sayı 50.045'e ulaşmıştır. Abone olunan veri tabanı sayımız 9 iken 2008 yılında bu sayı 10'a ulaşmış olup; ULAKBİM tarafından kullanıma sunulan veri tabanları ile birlikte toplam 19'a ulaşmıştır.

Türkiye'de ortalama yılda 20.000 kitabın basıldığını düşünecek olursak, Kütüphanemize basılan bu kitaplardan Üniversitemiz eğitim ve öğretimini destekleyecek nitelikte olanlardan en az 10.000 adedinin sağlanması, Dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için elektronik veri tabanı ve elektronik kitap aboneliklerimizin artırılması. E-Kütüphane hizmetlerinin yaygınlaştırılması temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

### 2008 Yılı Yayın Alımları ve Gerçekleşme Durumları

Alınan Yayınlar ve Veri Tabanları	Harcanan Tutar
Yabancı Ve Türkçe Basılı Yayın Alımı (5494 Adet)	95.606,39
Türkçe Basılı Süreli Yayın (105 Adet)	9.073,13
Solutions 360 Search Arayüz Programı	12.608,72
Elsevier Elektronik Kitap Paketi	65.249,64
Oxford University Press Veri Tabanı	3.043,55
American Chemical Society Veri Tabanı	6.453,06
Ebrary E-Kitap Paketi	6.330,28
Proquest (Abi/Inform Global + Agricola Plustex) Veri Tabanı	24.009,05
Springer Link (Springer & Kluwer) Veri Tabanı	30.400,20
Wiley Interscience Veri Tabanı	11.331,40
Jstor Veri Tabanı	17.973,49
Blackwell Veri Tabanı	16.297,03
<b>Toplam</b>	<b>298.375,94</b>

### 7. 2008H032420 Bilgi Teknolojileri Projesi:





2008 yılında Bilgi Teknolojileri için 400.000,00-TL'si ödenek ayrılmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Bilgi Teknolojileri Projesi kapsamında, 17.700,00-TL'si ile paket programlar, otomasyon bakım hizmeti, anti-virüs programları, 204.500,82-TL'si ile de bilgisayar donanım ürünleri alınmıştır. 2008 Yılı Program ödeneği ile yapılan veya alınan bilgi teknolojilerine ilişkin bilgiler aşağıda yeralan tablolarda olarak gösterilmiştir.

### 2008 Yılı Yazılım ve Program Alımları

MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
TAŞINIR İŞLEM MODÜLÜ (15 KULLANICILI)	1	9.000,00	10.620,00
IDE CAD STATİK 5 IDS ENTER PRISE	1	3.000,00	3.540,00
IDE CAD MİMAR 5 IDS ENTER PRISE	1	3.000,00	3.540,00
<b>TOPLAM</b>			<b>17.700,00</b>

### 2008 Yılı Bilgisayar ve Donanım Alımları

MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
BİLGİSAYAR	40 ADET	957,35	45.186,92
BİLGİSAYAR	30 ADET	1.138,59	40.306,09
BİLGİSAYAR	78 ADET	1.084,86	99.850,51
HP LAZERJET 1505 YIZICI	12 ADET	155,00	2.194,80
OKİ 4400 LAZER YAZICI	2 ADET	250,00	590,00
PHİLİPS 2,5 HDD	2 ADET	250,00	590,00
KİNGSTON 166553 MHZ REM	10 ADET	30,00	354,00
KİNGSTON 166400 MHZ REM	15 ADET	65,00	1.150,50
İNKO ADSL MODEM	1 ADET	125,00	147,50
MİCROSOFT MOUSE	40 ADET	45,00	2.124,00
FUSER FİLİM HP 1022	5 ADET	35,00	206,50
LG GSA-H55N DVD -RW	30 ADET	35,00	1.239,00
LOGITECH INTERNET PRO DESKTOP KLAVYE+MOUSE SETİ 967457-2125 PS/2 BAĞLANTILI	15 ADET	26,00	460,20
MİCROSOFT COMFORT CURVE VALUE PACK TR-Q KLAVYE+MOUSE (B2L-00061) USB BAĞLANTILI	33 ADET	32,00	1.246,08
MAXTOR 80GB 7200RPM 2MB CACHE PATA SABİT DİSK	15 ADET	62,00	1.097,40
MAXTOR 80GB 7200RPM 8MB CACHE SATA DİSK	25 ADET	55,00	1.622,50
SAMSUNG 500GB 7200RPM 16MB CAHCE SATA2 SABİT DISK	4 ADET	115,00	542,80
COLORS-IT 400U-FNJ 480W 12CM BİG (SİYAH FAN) GOLDEN POWER SUPPLY	35 ADET	35,00	1.445,50
HP LASERJET 1000/05/10/12/15/22,1200/20,1300/20 FUSER FİLM SLEEVE	20 ADET	27,00	637,20
ATEN-CS64UZ ÜRÜNÜN DETAYLI BİLGİLERİ	1 ADET	95,00	112,10
TOSHİBA STANDART 9V PİL (NEDA 1604, 6F22)	10 ADET	10,00	118,00
1200 MA 1.2 V KALEM PİL	16 ADET	16,00	302,08
ASUS P5VD2-VM P4M900 DDR2667 PCI-EX VGA+LAN+SATA ANAKART	5 ADET	75,00	442,50
INTEL CELERON D 336 2.8 GHZ 533 256K 64 BIT 775P	3 ADET	85,00	300,90
250 GB (2.5) 5400 8MB SPD5240CC PHILIPS USB2.0	1 ADET	207,00	244,26
KİNGSTON 256MB SD RAM 133MHZ (8 ÇİP)	10 ADET	47,00	554,60
256 MB SD RAM 100 MHZ (8 CHIP)	10 ADET	27,00	318,60
MAXELL 52X CD-R 100'LÜ PAKET	20 ADET	30,00	708,00
XEROX DVD+R 50'Lİ PAKET	6 ADET	25,00	177,00
LG 8X E50L EXTERNAL DVD RW	1 ADET	130,00	153,40
ASUSTEK NX1101 PCI 100/1000 ETHERNET KARTI	3 ADET	17,00	60,18
IDE DATA KABLOSU	10 ADET	1,50	17,70
<b>TOPLAM</b>			<b>204.500,82</b>

## 8. 1994H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:

2008 yılında Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 3.000.000,00-TL'si ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde Futbol Sahası ve Tribün Binası kalan işleri ile açık hava spor alanları yapımı işi ihalesi yapılmış ve sözleşmeye bağlanarak işe başlanmıştır. Bu proje kapsamında 2008 yılı içinde 1.842.181,00-TL'si harcanmış olup; Tribün Binası izolasyon ve dış sıva imalatları, çelik çatı imalatı, Futbol Sahası drenaj imalatları ve açık hava spor alanlarının zemin kaplamaları tamamlanmıştır.



Futbol Sahası ve Tribün İnşaatı



Futbol Sahası ve Tribün İnşaatı



### 9. 2005I000600 Hastane İnşaatı Projesi:

2008 yılında Hastane İnşaatı Projesi için 9.750.000,00-TL'si ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 1.900.000,00-TL'si ek ödenek daha tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında 11.262.448,00-TL'si harcanarak asma tavan, boya, granit, fayans, giydirme cephe, dış cephe kaplama, paslanmaz çelik su deposu, lavabo, wc taşı, eşanjör dairesi, aydınlatma imalat ve montajları tamamlanarak Hastane Binası İnşaatı bitirilmiştir.



Üniversite Hastanesi İnşaatı



Üniversite Hastanesi İnşaatı

### 10. 2008I000550 Hastane Büyük Onarımı Projesi:



2008 yılında Hastane Büyük Onarımı Projesi için 50.000,00-TL'sı ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 2008H032390 nolu Eğitim Sektörü Büyük Onarım Projesine 50.000,00-TL'sı aktarılmış ve bu proje kapsamında harcanmıştır.

### 11. 2008I000560 Makine ve Teçhizat Alımları Projesi:

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Makine ve Teçhizat Alımlarında kullanılmak üzere 2008 yılı yatırım bütçesi ile 200.000,00-TL'sı ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 188.017,00-TL'sı ile hastane hizmetlerinde kullanılmak üzere aşağıda gösterilen makine teçhizatlar alınmıştır.

#### 2008 Yılı Makine-Teçhizat Alımları

Bölüm	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Birim	Harcama Tutarı
KVC - Kardiyoloji	ACT Cihazı	1	Adet	10.800,00
KVC	Ventilatör Cihazı	2	Adet	34.020,00
Göz	Fakoemilsüfikasyon Cihazı	1	Adet	62.521,00
Üroloji	55 Kalem Cerrahi Alet	1	Set	15.895,00
Kadın Doğum	Laparoskopik Soğuk Işık Kaynağı	1	Adet	8.856,00
Göğüs Hst.	Ventilatör Cihazı	1	Adet	13.922,00
Çene Cerrahisi	Otoklav Cihazı	1	Adet	12.903,00
KVC	11 Kalem Cerrahi Alet	1	Set	18.360,00
Hemş. Hiz.	Ambu	3	Adet	196,70
Hemş. Hiz.	Laringoskop	2	Adet	3.116,80
Göz	Demirbaş Malzeme	9	Adet	7.427,43
<b>TOPLAM TUTAR</b>				<b>188.017,93</b>

**12. 2008K120660 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri:**

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Komisyonunca desteklenen ve devam eden projeler için 2008 yılında Döner Sermaye Gelirlerinden Bilimsel Araştırma Projeleri Payı olarak toplam 1.124.728,00-TL'si ödenek tahsis edilmiştir. Bilimsel Araştırma Komisyonunca desteklenen 27 adet proje için 2008 yılında 425.275,00-TL'si harcama yapılmış olup ayrıntılı proje dökümü aşağıda gösterilmiştir.

**2008 Yılında Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri**

Sıra No	Proje No	Proje Yöneticisi	Proje Adı	Süresi	Proje Bütçesi	2008 Yılı Harcaması
01	2007/34	Prof.Dr.Adem ÖNAL Fen Edebiyat Fakültesi	"Havaciva Bitkisi (Alkanna Tinctoria)'nin Selülozik ve Protein Elyaf Boyar Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması"	12 ay	9.999	1.003,00
02	2007/01	Yrd.Doç.Dr.Bedrettin SELVİ Fen Edebiyat Fakültesi	"Herbarium (Bitki Müzesi) Alt Yapısının Kurulması"	24 ay	52.756	20.608,70
03	2007/20	Doç.Dr.Rüstem CANGİ Ziraat Fakültesi	"Kazova Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Önemli Üzüm Çeşitlerinde Optimum Hasat Zamanlarının Saptanması, Verim ve Fitokimyasal İçeriklerin Belirlenmesi"	24 ay	4.345	168,74
04	2008/23	Prof. Dr.Osman KARKACIER İ.İ.B.F.	"Kelkit Havzasında Geliştirilebilecek Kırsal Sanayi Alternatifleri ve Uygulanabilirliği"	24 ay	20.699	2.524,02
05	2008/06	Prof.Dr.İzzet KADIOĞLU Ziraat Fakültesi	"Tokat'ta Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Görülen Küsküt Türleri (Cuscuta spp.) Yaygınlıklarının Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar"	12 ay	4.186	1.000,00
06	2008/14	Yrd.Doç.Dr.Semiha KURT Tıp Fak.	"Multipl Skleroz'da Metal İyon Taşıyıcısı Protein Gen (NRAMP1-SLC11A1) Polimorfizmlerinin Analizi"	18 ay	64.263	48.630,16
07	2008/19	Doç.Dr.İsa TELCİ Ziraat Fakültesi	"Tokat Florasında Doğal Yayılış Gösteren Mentha Spp. Türlerinin Bitkisel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Teknolojik Öneme Sahip Tiplerin Seçimi"	18 ay	29.360	2.790,70
08	2007/06	Yrd.Doç.Dr.Şenay SARICA Ziraat Fakültesi	"Çoklu Doymamış Yağ Asitlerince Zengin Etlik Bildirgin Karma Yemlerine Doğal Antioksidan İlavesinin Besi Performansı, Karkas Parametreleri, Etin Kalitesi Ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri"	12 ay	4.947	371,7
09	2008/05	Doç.Dr.Yusuf YANAR Ziraat Fakültesi	"Çorum İli Patates Üretim Alanlarında Gövde Kanseri ve Siyah Kabukluluk Hastalığı Etmeni Rhizoctonia solani' Hastalığı Etmeni Rhizoctonia solani' nin Yaygınlık ve Anastomosis Gruplarının Belirlenmesi"	12 ay	4.541	2.006,00
10	2006/27	Doç.Dr.Menderes SUIÇMEZ Fen Edebiyat Fakültesi	"Almus Baraj Gölünde (Tokat) Yaşayan Chalcaburnus chalcoides 'in Farklı Kimiği Yapılarından Yaş Tayini ve Bazı Populasyon Parametrelerinin Araştırılması"	30 ay	16.678	3274,5
11	2008/21	Doç.Dr.Muzaffer CAN Fen Edebiyat Fakültesi	"Anilin ve İndol Monomerlerinden İletken Kopolimer Sentezi ve Karakterizasyonu"	18 ay	16.926	10.030,00
12	2008/13	Doç.Dr.Naif GEBOLOĞLU Ziraat Fakültesi	"Farklı Pathcan Genotiplerinde in vitro Androgenesis ve Haploid Bitki Elde Edilmesi Olanaklarının Araştırılması"	12 ay	15.992	7.038,79
13	2008/24	Prof.Dr.Mehmet ARSLAN Eğitim Fakültesi	"Orta Öğretim Öğrencilerinin "Barış Eğitimi" Tutumu Geliştirmelerine Yönelik Model Bir Eğitim Programı"	22 ay	8.633	274,94
14	2007/05	Doç.Dr.Zafer ULUTAŞ Ziraat Fakültesi	"Karayaka Irkı Koyunlarda Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi"	12 ay	4.988	660,5

Desteklenen Proje Listesi-1

Sıra No	Proje No	Proje Yöneticisi	Proje Adı	Süresi	Proje Bütçesi	2008 Yılı Harcaması
---------	----------	------------------	-----------	--------	---------------	---------------------



15	2007/35	Doç.Dr.Güven ÇANKAYA Fen Edebiyat Fakültesi	“Metal-Si Diyotların C-V Karakteristiklerini Kullanarak Ara Yüze Hal Yoğunluğunun Hesaplanması ve Çeşitli Gazlara Göre Diyot Davranışlarının İncelenmesi”	12 ay	47.481	41.524,20
16	2008/25	Yrd.Doç.Dr.Özlem Yeşim ÖZBERK Eğitim Fakültesi	“Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum ile Düşünme Stilleri Arasındaki İlişki”	6 ay	10.000	1.266,14
17	2008/42	Yrd.Doç.Dr.Ahmet FENERCİOĞLU Turhal M.Y.O.	“Doğrusal Anahtarlamalı Relüktans Motor Tahrikli Asansör Sisteminin Prototip Tasarımı Ve Analizi”	18 ay	18.300	9.700,00
18	2008/33	Doç.Dr.Ahmet KARADAĞ Fen Edebiyat Fakültesi	“N- ve O- Donör Ligantlarla Yeni ve İşlevsel Siyano Köprülü Polimerik Komplekslerin Sentezi ve Karakterizasyonu”	6 ay	29.710	13.901,58
19	2008/57	Doç.Dr.Ahmet SARI Fen Edebiyat Fakültesi	“Isıl Enerji Depolama Amaçlı Bazı Yağ Asitlerinin PEMA, PMA ve PBMA Polimerleri ile Oluşturacağı Yeni Tip Kompozit Malzemelerin Hazırlanması, DSC Analiz Tekniği ile Enerji Depolama Özelliklerinin Isıl Kararlılıklarının Belirlenmesi”	18 ay	45.000	44.930,86
20	2008/40	Yrd.Doç.Dr.Salih SAYGI Fen Edebiyat Fakültesi	“Yük-Pompalama Spektroskopisi ile MOS Yapıların Arayüzey Hallerinin İncelenmesi”	12 ay	33.980	28.138,28
21	2008/30	Doç.Dr.Güven ÇANKAYA Fen Edebiyat Fakültesi	“Bazı metal-yarı İletken Schottky Yapıları ile Gaz Algılanması”	6 ay	4.998	4.998,00
22	2008/58	Doç.Dr.Durali MENDİL Fen Edebiyat Fakültesi	“Hidrür Oluşturmalı AAS ile Çevresel Örneklerde Bazı Toksik Türlerin Tayini”	12 ay	40.000	6.985,60
23	2008/46	Doç.Dr.Kenan YILDIZ Ziraat Fakültesi	“Genotipik Farklılığın Karadut Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkisi”	9 ay	4.155	2.161,76
24	2008/26	Doç.Dr.Kenan KARA Ziraat Fakültesi	“Amasya, Sivas ve Tokat İllerinin Kelkit Havzasındaki Farklı Böcek Takımlarında Bulunan Tachinidae (Diptera) Türleri Üzerinde Çalışmalar”	36 ay	9.955	4.130,00
25	2008/41	Yrd.Doç.Dr.Ersoy YILMAZ Eğitim Fakültesi	“Müziksel Enstrümanların Fiziksel Tınıları ile Frekanslarının Araştırılması, Ayarlanması ve Standardizasyonu”	8 ay	25.000	14.414,75
26	2008/56	Doç.Dr.Ayhan KAYAOĞLU Tıp Fakültesi	“Cerrahi Hastalarda Perioperatif Endoskopik Mukozal Değerlendirme”	12 ay	160.000	149.092,00
27	2003K120510 (DPT)	Doç.Dr.Orhan UZUN Fen Edebiyat Fakültesi	İleri Araştırma Projeleri, Moleküler Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Araştırma Merkezi Altyapısının Oluşturulması - Karadeniz Bölgesinde Yetişen Bazı Bitkilerin İzole Edilen Bileşik Tarımsal Zararlı Etkileri, Antioksid Biyo Aktivitelerinin İncelenmesi”	36 ay	900.000	3.649,78
<b>TOPLAM</b>					<b>2.310.948</b>	<b>425.274,70</b>

Desteklenen Proje Listesi-2

#### 4. Öneriler :



Kampüs Altyapısı ve Derslik Laboratuvar gibi büyük ve yıllara sari projelerde ödenek azlığı sebebiyle başlanılmış olan yatırımlar kısa sürede hizmete sunulmadığı için hizmet aksamalarına sebebiyet vermekte ve eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Fiziki altyapı yetersizliği ve modernizasyonun zamanında yapılamayışı kampüslerde yaşam standardının arzu edilen seviyede olmasını engellemektedir.

Bu nedenle;

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin İcmal Harcama/Finansman Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

İhtiyaçları karşılamada yetersiz olan, yatırım ödeneklerinin, Maliye Bakanlığınca bloke edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.

Yatırım projelerine ait ödeneklerin tamamının verilmesi projenin tüm yönleriyle (çevre, altyapı vb.) yapılıp uygulanmasını sağlayacaktır.

Sağlık hizmetlerinin, çağın gerektirdiği kalitede, hızlı ve güvenilir sunulması için gelişen teknolojiyle donatılmış yeni cihazların, hazırlanacak yatırım projeleriyle temin edilmesine yönelik ödenek tahsislerinin yapılması gerekmektedir

Ödeneklerin tamamının ilk 9 aylık dönemde serbest bırakılması, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracaktır.





## GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (\*)

Bütçe Türü: Özel Bütçe (Kurum Geneli)

2008 Yılı Fiyatlarıyla, (Bin TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2007 Sonu Kümülatif Harcama			2008 Yılı Program Ödenek			2008 Yılı Revize Ödenek			2008 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madencilik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İmalat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enerji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulaştırma.-Hab.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Turizm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eğitim	8	0	72.727	0	52.677	52.677	0	11.700	11.700	0	5.165	5.165	0	10.011	10.011
Sağlık	3	0	26.206	0	13.816	13.816	0	10.000	10.000	0	1.850	1.850	0	11.450	11.450
D.Kamu Hizm.	2	0	0	0	0	0	0	630	630	0	130	130	0	555	555
-İktisadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-SosyalRek.Bil.Arş.Proj.)	2	0	0	0	0	0	0	630	630	0	130	130	0	555	555
<b>TOPLAM</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>98.933</b>	<b>0</b>	<b>66.493</b>	<b>66.493</b>	<b>0</b>	<b>22.330</b>	<b>22.330</b>	<b>0</b>	<b>7.145</b>	<b>7.145</b>	<b>0</b>	<b>22.016</b>	<b>22.016</b>

(\*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.
