

T.C.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ



2016 Yılı Yatırım Programı İzleme
ve Değerlendirme Raporu



Mart 2017

T.C.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ



**2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve
Değerlendirme Raporu**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TOKAT- 2017**

Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

www.gop.edu.tr

strateji@gop.edu.tr

TOKAT



“Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.”

Mustafa Kemal Atatürk

İÇİNDEKİLER

1- Genel Değerlendirme	1
1.1 Kuruluşun Yatırımları Finansman Kaynakları.....	1
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi.....	1
1.3 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	11
1.4 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	11
2- 2015 Yılı Proje Uygulamaları	13
2.1 Devam Eden Projeler.....	13
2.1.1 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	13
2.1.2 Kampüs Altyapısı Projesi.....	20
2.1.3 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	22
2.1.4 Hastane Ek Bina İnşaatı ve Makine Teçhizatı Projesi.....	23
2.2 Tamamlanan Projeler.....	27
2.2.1 Tamamlanan Projeler Listesi.....	27
2.2.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	27
2.2.1.2 Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi	27
2.2.1.3 Yayın Alımları Projesi	36
2.2.1.4 Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi	37
2.2.1.5 Teknolojik Araştırma Sektörü.....	39
2.2.1.5.1 Bilimsel Araştırma Projeleri	39
3- 2015 Yılı Kamu Yatırımları Özeti	48

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Kuruluşun Yatırımları Finansman Kaynakları :

2016 Yılı Finansman Kaynakları:

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Araştırma Projeleri Gelirleri Payı

2) Eğitim Öğretim Gelirleri(Örgün ve İkinci Öğretim, Yaz Okulu, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora, Uzaktan Eğitim, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri)

3) Mevduat Faizleri

4) Öğrenci Sosyal Hizmet Gelirleri

5) Taşınmazlardan Elde Edilen Gelirler (Lojman Kira, Diğer Kira ve Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri.)

c) Döner Sermaye Gelirleri

B) Bütçe Dışı Kaynak

a) Şartlı Bağışlar

b) TÜBİTAK

c) Farabi, Erasmus, Mevlana

Tablo1: Sektörel Bazda Yatırımların Dağılımı


TL

Sektörler	2016 KBÖ	Kullanılabilir Ödenek	Harcama
Eğitim-Yükseköğretim Sektörü	24.000.000,00	34.535.000,00	32.727.616,70
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	1.000.000,00	0,00	0,00
Sağlık Sektörü *	21.000.000,00	21.000.000,00	11.585.553,28
Teknolojik Araştırmalar Sektörü	1.095.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00
TOPLAM	47.095.000,00	58.130.000,00	46.908.169,98

*1.000.000 TL Döner Sermayeden karşılanmaktadır.


1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi


Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık ve Teknolojik Araştırmalar olmak üzere 4 sektör altında toplanmıştır. Eğitim-Yükseköğretim sektöründe 5, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 1, Sağlık Sektöründe 2, Teknolojik Araştırmalar Sektöründe ise 1 adet proje yer almaktadır.

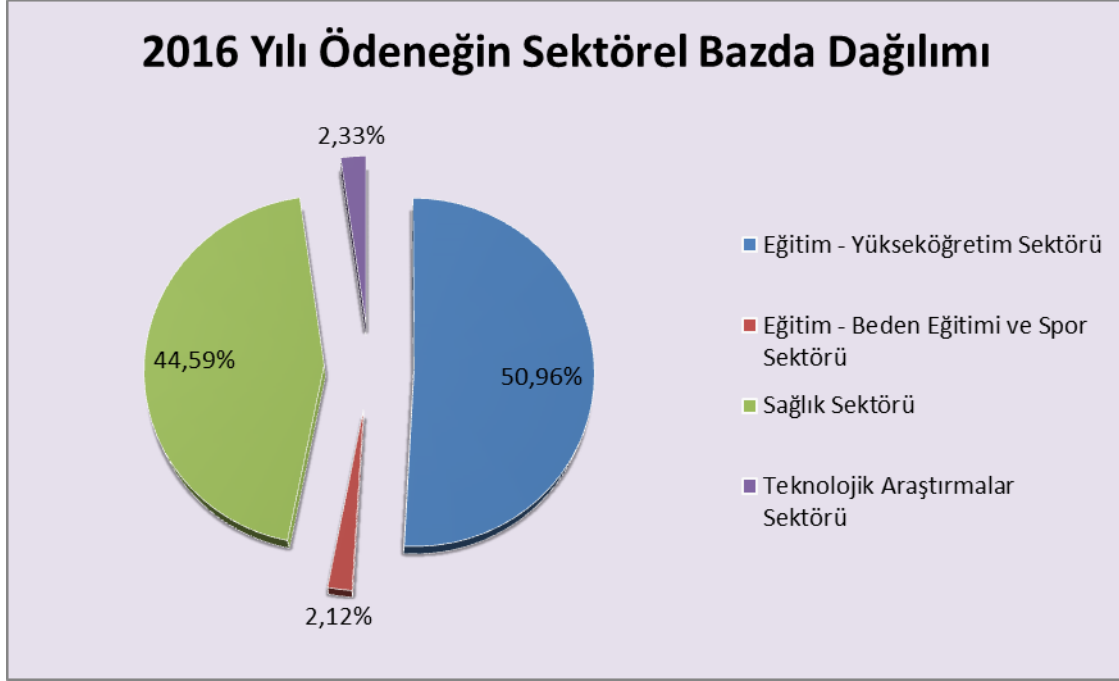

Yıllar İtibariyle Sektör Bazında Başlangıç Ödenek Miktarları



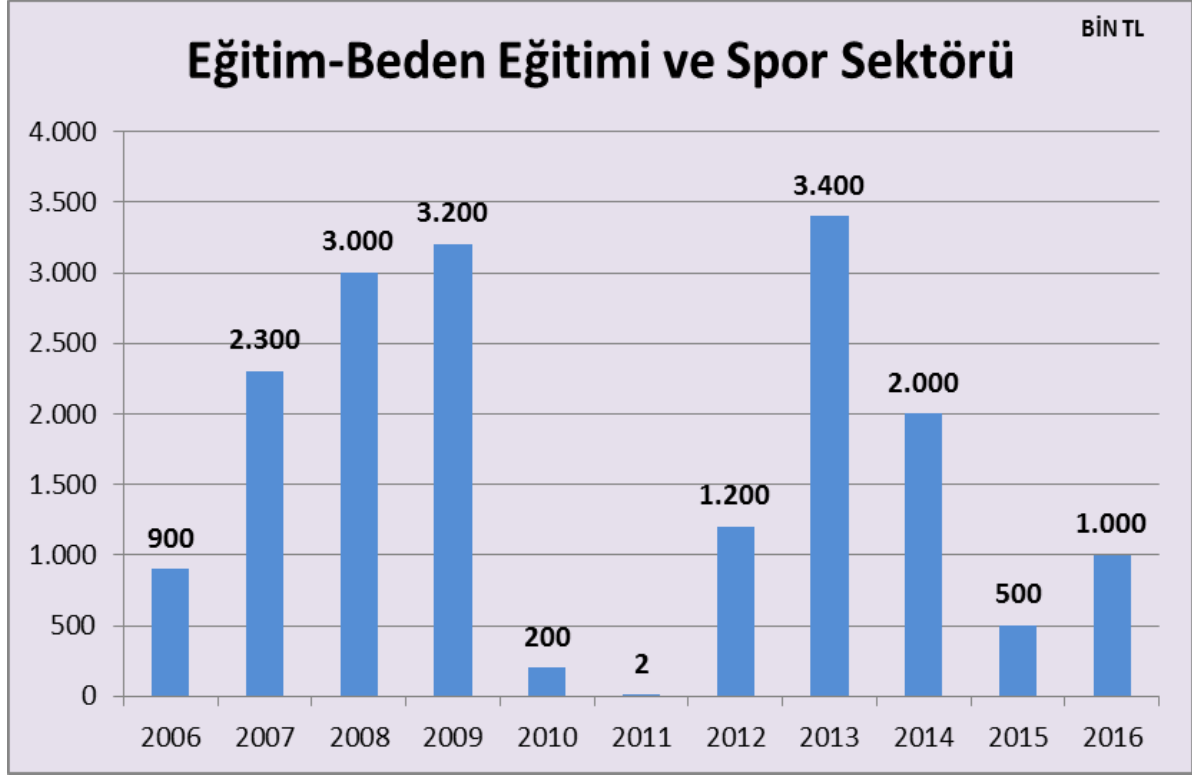

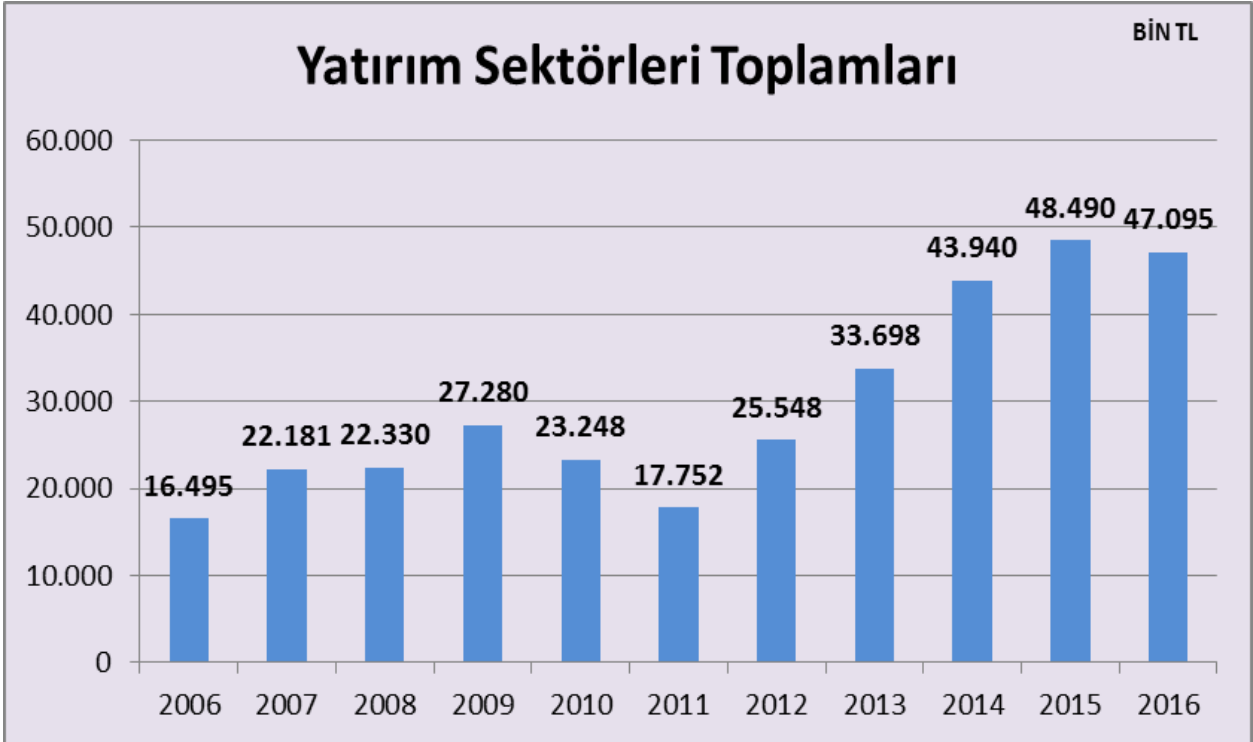


2016 Yılı Yatırım Projelerinin başlangıç ödenekleri, yıl içerisinde yapılan yedekten aktarmaların ve likitten eklemelerin miktarları, toplam ödenek tutarı ve bu projelere yapılan toplam harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Projelere İlişkin Genel Tablo

Bin TL

Sektörler	Proje Adı	2016 KBÖ	Ekleme-Aktarma	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcanan	Toplam Ödenek Harcama Oranı (%)
Eğitim Yükseköğretim Sektörü	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100			100	28	28,2
	Kampüs Altyapısı	4.000			4.000	3.020	75,50
	Derslik ve Merkezi Birimler	13.900	10.500		24.400	24.275	99,49
	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	5.000	35		5.035	4.469	89,38
	Eğitim Yayın Alımları	1.000			1.000	937	93,7
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.000		1.000	0	0,0	0,0
Sağlık Sektörü	Sağlık Ek Bina İnşaatı	3.000			3.000	974	32,47
	Ek Bina Makine Teçhizat	9.000			9.000	9.000	100
	Muhtelif İşler *	9.000			9.000	1.612	17,91
Teknolojik Araştırma	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	1.095	1.500		2.595	2.595	100
TOPLAM		47.095	12.035	1.000	58.130	46.908	80.70

*1.000.000,00-TL Döner Sermayeden karşılanmıştır.

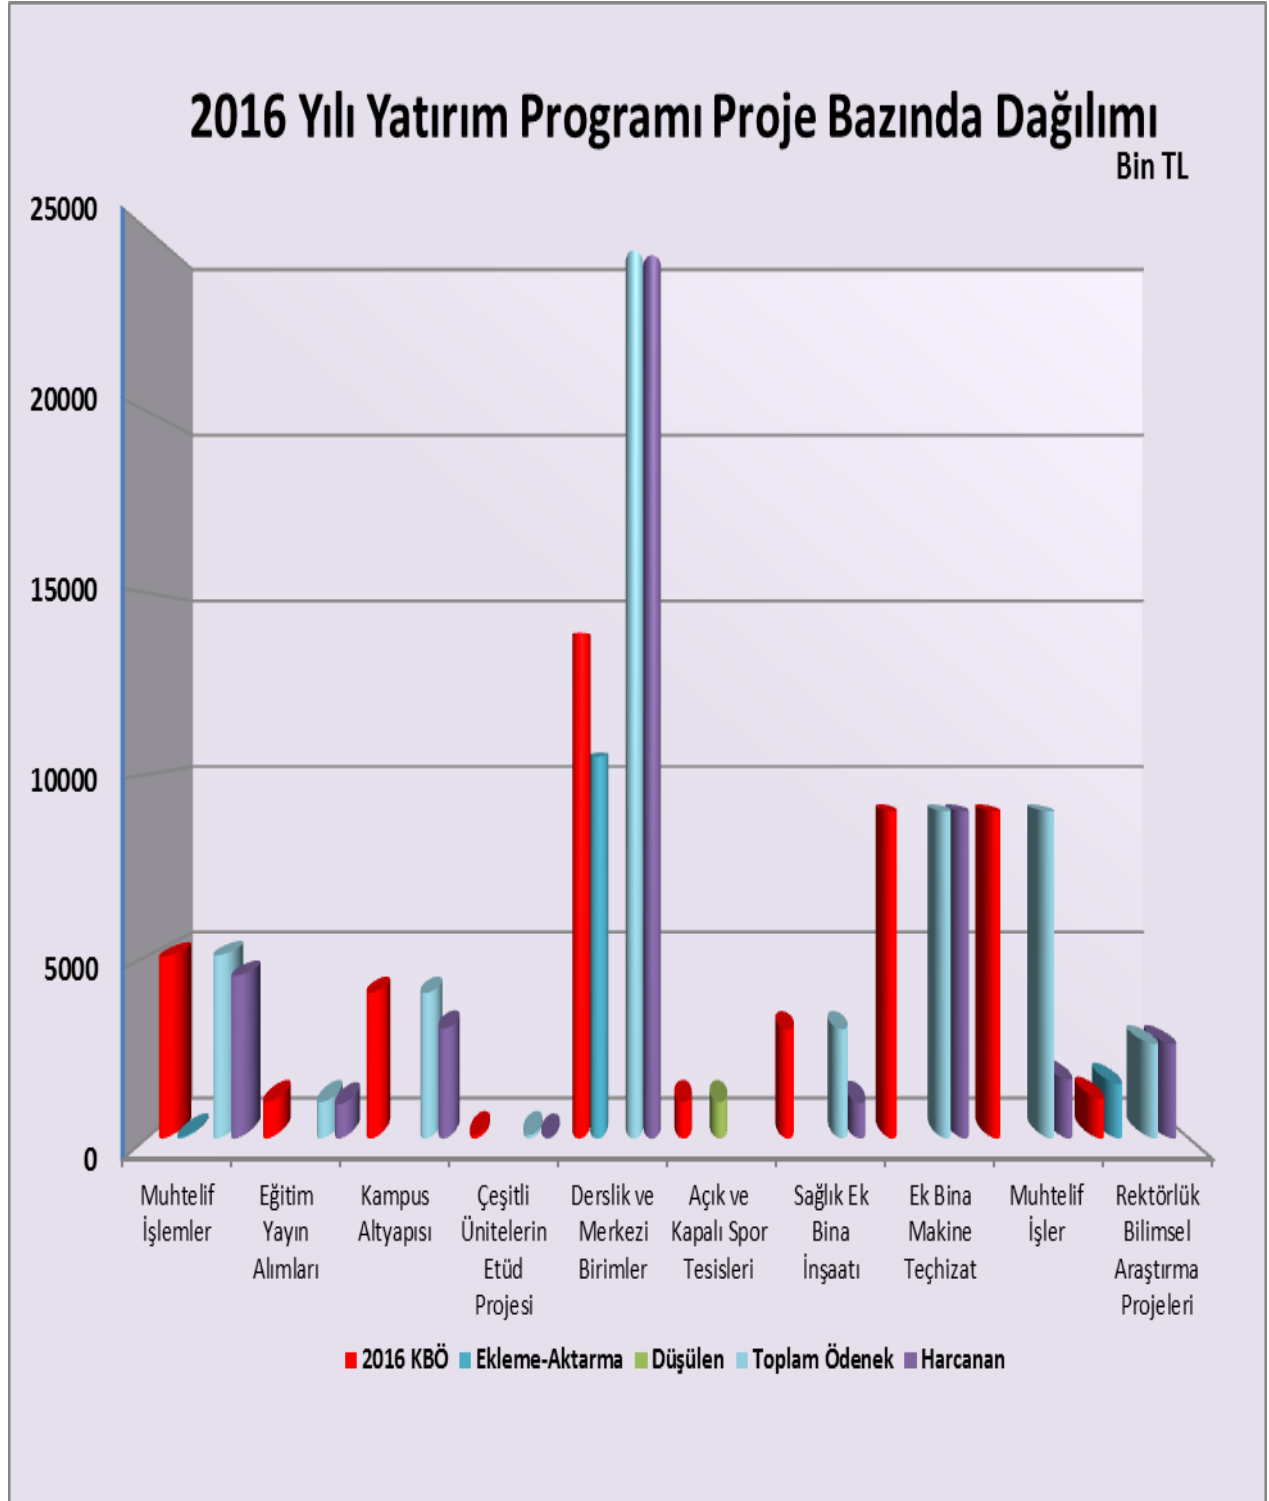

Tablo 3: 2016 Yılı Ödenek Durumu Sektör-Proje Bazında

SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM (Bin TL)				
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2016 Yılı Başlangıç Ödeneği
SEKTÖR TOPLAMI			261.226	24.000
A)Etüd-Proje İşleri Toplamı			100	100
2016H032360	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2016-2016	100	100
B)Devam Eden Projeler Toplamı			255.000	17.900
1994H031270	Kampüs Altyapısı	1994-2017	70.000	4.000
1994H031280	Derslik ve Merkezi Birimler	1994-2018	185.000	13.900
C)Yeni Projeler Toplamı			6.126	6.000
2016H032370	Muhtelif İşler Özel Gelir Taahhüt Hıbesi	2016-2016	5.126	5.000 (1.327) (126)
2016H032380	Yayın Alımı	2016-2016	1.000	1.000
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (Bin TL)				
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2016 Yılı Başlangıç Ödeneği
SEKTÖR TOPLAMI			3.500	1.000
B)Devam Eden Projeler Toplamı			3.500	1.000
1994H050110	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1994-2017	3.500	1.000
SEKTÖRÜ : SAĞLIK (Bin TL)				
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2016 Yılı Başlangıç Ödeneği
SEKTÖR TOPLAMI			74.635	21.000
B)Devam Eden Projeler Toplamı			65.635	12.000
2012I000330	Ek Bina İnşaatı İnşaat Makine ve Teçhizat Alımı	2012-2017	65.635 50.635 15.000	12.000 3.000 9.000
C)Yeni Projeler Toplamı			9.000	9.000
2016I000260	Muhtelif İşler Döner Sermaye	2016-2016	8.000 1.000	8.000 1.000
SEKTÖRÜ : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR (Bin TL)				
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2016 Yılı Başlangıç Ödeneği
SEKTÖR TOPLAMI			1.095	1.095
C)Yeni Projeler Toplamı			1.095	1.095
2016K120350	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ⁽¹⁾	2016-2016	1.095	1.095
ÜNİVERSİTE TOPLAMI			340.456	47.095

1-Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11'inci maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mevcut Taşınmazlar ve Kapalı Mekanlar

Tablo4: Fiziki Alanlar

(m²)

BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m ²)									TOPLAM (m ²)
	İDARİ BİNALAR	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR			SİRKÜLASYON ALANI	SPOR ALANLARI		
		DERSLİK	LAB.	KANTİN KAFETERYA	LOJMAN	YURTLAR		Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	
Mühendislik ve Doğa Bilim.Fak.	3.191	1.140	1.520	90	0	0	6.980	0	0	12.921
Müh. ve Doğa Bilim.Fak. Ek Bina	7.583	0	0	0	0	0	0	0	0	7.583
Ziraat Fakültesi	13.525	938	1.680	197	0	0	0	0	0	16.340
İç su balıkçılık tesisleri	0	0	263	0	0	0	0	0	0	263
Arıcılık Geliştirme	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80
Fırın	0	0	190	0	0	0	0	0	0	190
Koyunculuk Geliştirme	0	0	864	0	0	0	0	0	0	864
Koyunculuk samanlık	0	0	225	0	0	0	0	0	0	225
Hangar(Ziraat Fak.Atelye)	0	0	830	0	0	0	0	0	0	830
Tavukçuluk Geliştirme (Kümes)	0	0	730	0	0	0	0	0	0	730
Doğal Boyalar,Ar-ge	0	0	604	0	0	0	0	0	0	604
Tarla Bitkileri Uygulama Lab.	0	0	88	0	0	0	0	0	0	88
Bahçe Bitkileri Uyg ön Haz.Lab.	0	0	110	0	0	0	0	0	0	110
Tarımsal Ar.ve Uyg.Merk.Ek Bina	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84
Eğitim Fakültesi	2.600	2.948	942	170	0	0	8.882	0	0	15.542
Eğitim Fakültesi Müzik Binası	130	1400	0	0	0	0	0	0	0	1.530
Fen-Edebiyat Fakültesi	10.315	2.375	3.353	405	0	0	0	0	0	16.448
İlahiyat Fakültesi	9.982	390	165	189	0	0	0	0	0	10.726
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	3.203	3.860	360	240	0	0	2.487	0	0	10.150
Tokat Sağlık Yüksekokulu	450	820	135	0	0	0	795	0	0	2.200
Tokat Beden Eğt.Spor Yük.Ok.	670	650	80	62	0	0	738	0	830	3.030
Tokat Teknik Bilimler M.Y.O.	3.203	3.860	360	240	0	0	2.487	0	0	10.150
Tokat Sosyal Bilimler M.Y.O.										
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	250	80	1.350	0	0	0	1.000	0	0	4.200
Ortak Derslik Binası	5.877	3154	0	212	0	0	2.852	0	0	12.095
Konferans Salonu	2.001	0	0	0	0	0	0	0	0	2.001
Merkezi Kütüphane	3.470	0	0	0	0	0	0	0	0	3.470
Kapalı Yüzme Havuzu	153	30	0	104	0	0	2.139	0	1.646	4.072
Kapalı Spor Salonu	0	0	0	0	0	0	0	0	3.275	3.275
Açık Spor Tesisleri	0	0	0	0	0	0	0	23.670,52	1.940	1.940
Merkezi Kafeterya	0	0	0	2.098	0	0	0	0	0	5.050
Merkezi Yemekhane	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	4.500
Rektörlük	4.950	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950
Konukevi	20	0	0	295	745	0	405	0	0	2.390
Isı Mekezi	2.050	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050
Atölye	440	0	0	0	0	0	0	0	0	440
Ayniyat,Şoför Binası	514	0	0	0	0	0	0	0	0	514
Kampüs lojmanları	0	0	0	0	1.656	0	304	0	0	1.960
Teke depoları	5.600									5.600
Sağlık Araş.Uyg.Merkezi Poliklinik	11.842	0	0	970	0	0	0	0	0	12.812
Yatan Hasta Binası	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
500 Yataklı Hastane Ek Binası										31.192
Radyasyon Onkoloji Binası										2.085
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	605,13	899,85	2.071,00	303,08	0	0	4.889,82	0	0	13.900
Dişhekimliği Fakültesi								0	0	2.100
Devlet Konservehanası								0	0	3.050
Sürekli Eğitim Merkezi	177	146	0	34	0	0	21	0	0	378
Ali Şevki Ereğ Yerleşkesi Isı Merkezi	577	0	0	0	0	0	0	0	0	577
Meydan lojmanları	0	0	0	0	1.093	0	248	0	0	1.341
Fidanlık lojmanları	0	0	0	0	2.360	0	840	0	0	3.200
Zile Dinçerler Tur.veOtel.Yük.Ok.	2.351	620	0	606	0	2.400	1.656	0	0	7.633
Zile Meslek Yüksekokulu	1.116	1.200	135	385	0	0	1.314	0	0	4.150
Turhal Meslek Yüksekokulu	2.300	3.000		875	0	0		0	0	6.175
Turhal Sağlık Hizmetleri MYO										
Niksar Teknik Bilimler M.Y.O	1.116	1.200	135	385	0	0	1.314	0	0	4.150
Niksar Sosyal Bilimler M.Y.O										
Erbaa Meslek Yüksekokulu	3.461	3.084	222	1.395	0	0	5.578	0	0	13.740
Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO										
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	485	402	76	151	0	0	418	0	0	1.532
Almus Meslek Yüksekokulu	1.034	1.528	470	430	0	0	1.038	0	0	4.500
Artova Meslek Yüksekokulu	423	1.016	135	94	0	0	1.304			2.972
Pazar Meslek Yüksekokulu	720	458	71	24	0	0	633	0	0	1.906
GENEL TOPLAM										308.588

Tablo 5: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı

(m²)

Yerleşke Adı	Mülkiyet Duruma göre Taşınmaz alanı (m ²)			Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	
Taşlıçiftlik Yerleşkesi	1.148.987,05	300.744,04	0,00	1.449.731,09
Araştırma Uyg.Hast.	0,00	83.583,31	0,00	83.583,31
Lojmanlar	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00
Deveciler Hanı	0,00	0,00	2.188,00	2.188,00
Turhal Yerleşkesi	0,00	112.265,97	0,00	112.265,97
Zile Yerleşkesi	111.525,45	33.358,93	0,00	144.884,38
Erbaa Yerleşkesi	21.609,41	0,00	0,00	21.609,41
Niksar Yerleşkesi	1.437,34	819.064,00	0,00	820.501,34
Reşadiye MYO	3.257,85	2.800,06	1.519,09	7.577,00
Almus MYO	0,00	31.843,00	0,00	31.843,00
Artova MYO	0,00	7.768,71	6.582,29	14.351,00
Pazar MYO	7.410	0,00	0,00	7.410,00
TOPLAM	1.297.565,10	1.391.428,02	10.289,38	2.699.283,50

Tablo 6: Devam Eden Yıllara Yaygın Kapalı Alanlar

(m²)

BİRİMLER	DEVAM EDEN VE YILLARA YAYGIN FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m ²)					
	İDARİ BİNALAR	EĞİTİM ALANLARI	SOSYAL ALANLAR	SİRKÜLASYON ALANI	SPOR ALANLARI	TOPLAM (m ²)
İlahiyat Fakültesi Binası	2.552	4.675	328	9.093		16.648
Tokat Sağlık Yüksekokulu	1.670	3.182	128	6.731		11.711
Eğitim Fakültesi Öğrenci Kantini			485			485
Sağlık Kampüsü Derslik Binası	354	885		1.298		2.537
Sağlık Kampüsü Katlı Kapalı Otopark (92 Araçlık)	3.940					3.940
Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu	842	2.346	190	2.682		6.060
Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	2.425	2.239	140	2.757		7.561
Reşadiye Meslek Yüksekokulu Binası	2.750	1.541	903	1.850		7.044
GENEL TOPLAM						55.986

Tablo 7: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı (m²)

Yerleşke Adı	Kapalı alan miktarı (m ²)		Toplam (m ²)
	Üniversite	Maliye Hazine	
Taşlıçiftlik Yerleşkesi	169.195	0	169.195
Şehir Merkezi	92.635	0	92.635
İlçe Okullar	46.758	0	46.758
TOPLAM	308.588	0	308.588

Tablo 8: Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (m²)

Kapalı mekanların hizmet alanlarına göre dağılımı				
Hizmet alanı	Taşlıçiftlik Yerleşkesi	Şehir Merkezi	İlçeler	Toplam (m ²)
Eğitim	126.983	19.428	46.758	193.169
Sağlık		68.089		68.089
Beslenme	9.550			9.550
Kültür	5.471			5.471
spor	9.287			9.287
Diğer(idari,tesis,depo)	17.904	5.118		23.022
TOPLAM	169.195	92.635	46.758	308.588

Tablo 9: Lojmanların Dağılımı (m²)

Lojmanların Dağılımı		
Birim Adı	Daire Sayısı	Alanı (m ²)
Fidanlık Lojmanları	20	3.200
Meydan Lojmanları	9	1.341
Taşlıçiftlik Yerleşkesi Lojmanları	16	1.960
TOPLAM	45	6.501

1.3 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2016 yılı içinde kurumumuz tarafından “Araştırma ve Uygulama Hastanesi A ve B Blok Ameliyathane Yapımı ile Poliklinik Binası Revize Proje Hizmet Alımı” işi, “Sağlık Kampüsü Kapalı Katlı Otopark Yapımı “ işi, “2016-2018 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı” işi, “Reşadiye Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı” işi, “Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2016 Yılı Büyük Onarım İnşaatı” işi ihaleleri yapılmıştır.

“Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2016 Yılı Büyük Onarım İnşaatı” işi ile yapımına 2013 yılında başlanan “Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası Ek Bina İnşaatı” işi tamamlanmıştır.

“Araştırma ve Uygulama Hastanesi A ve B Blok Ameliyathane Yapımı ile Poliklinik Binası Revize Proje Hizmet Alımı” işi, “Sağlık Kampüsü Kapalı Katlı Otopark Yapımı “ işi, “2016-2018 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı” işi, “İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı” işi, “Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı” işi, “Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İnşaatı” işi, “Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı” işi, “Tokat Sağlık Yüksekokulu Bina İnşaatı” işi, “Reşadiye Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı” işi devam etmektedir.

Yine 2016 yılı içinde; Kapalı Tribün Binası Statik Proje Yapımı işi, Sağlık Kampüsü Isı Merkezi Endüstriyel Tıp Doğalgaz Tesisatı işi, Eğitim Fakültesi Kantin Binası Statik Proje Yapım işi, Taşlıçiftlik Kampüsü Kanalizasyon Hattı Tadilatı işi, Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi çatı tamirâtı işi, Sağlık Kampüsü Altyapı Düzenlenmesi Hafriyat işleri, Ortak Derslik Binası Perde Duvar İmalatları, Taşlıçiftlik Kampüsü Altyapı Rögar bakım ve onarımı, Eğitim Fakültesi Binası pıssu bakım ve onarımı, Taşlıçiftlik Kampüsü ana kanalizasyon hattı bakım ve onarımı, Sağlık Kampüsü Isı Merkezi Endüstriyel Tıp Doğalgaz Tesisatı işi, Ziraat Fakültesi Tavukçuluk Ünitesi Bakım ve onarımı, Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı, Zile Meslek Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı, Zile Meslek Yüksekokulu Binası çatı bakım ve onarımı, Konukevi, Almus Meslek Yüksekokulu, Erbaa Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar Binası elektrik ve jeneratör bakım ve onarımı, Merkezi Laboratuvar Binası Havalandırma ve Klima Santrali Mekanik Tesisat işi, Almus Meslek Yüksekokulu Binası çatı bakım ve onarımı, Taşlıçiftlik Kampüs Binaları çatı bakım ve onarımı, Ortak Derslik Binası Konferans Salonu koltuk montaj tamirâtı, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sistem Odası yapım işi, Sağlık Kampüsü C Blok Giriş Kapısı tadilatı işleri yaptırılmıştır.

2016 yılı içinde kapalı alan toplam 308.588 m²,ye ulaşmıştır.

1.4 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemiz tarafından yürütülen projelere ait 2016 Yılı Yatırım Programı başlangıç ödeneği olarak 47.095.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde de 1.200.000,00-TL birimler arası aktarma, 9.535.000,00-TL likit fazlası ödenek eklemesi, 1.500.000,00-TL gelir fazlası ödenek eklemesi ile toplam 57.130.000,00-TL ödenek sağlanmıştır.

Yıl içinde; eğitim-yükseköğretim sektöründe yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesine 9.500.000,00-TL, Makine Teçhizat projesine de 35.000,00-TL likit fazlası ödenek eklemesi

yapılmıştır. Teknolojik araştırma sektöründe yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırmalar projesine de 1.500.000,00-TL gelir fazlası ödenek eklemesi yapılmıştır.

Yine 2016 yılı içinde; eğitim-beden eğitimi ve spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesislerinden eğitim-yükseköğretim sektöründe yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesine 1.000.000,00-TL ödenek aktarması ve sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler projesi içerisinde tertipler arasında 200.000,00-TL ödenek aktarması yapılmıştır.

Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli yatırım projeleri gerçekleştirmektedir. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun mali ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gerekmektedir.

Üniversitemiz her geçen yıl değişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların artırılması konusunda üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel araştırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkının artırılması anlamına gelecektir. Mevcut binalarda fiziki engellilere ait onarım işleri ile diğer bakım ve onarım işleri kısıtlı olarak yapılabilmektedir. Daha iyi hizmet verebilmek, bakım ve onarım işleri için daha fazla ödeneye ihtiyaç vardır. Üniversite Taşlıçiftlik ve şehir yerleşkeleri alan olarak yetersiz olup, genişletilebilmesi için kamulaştırma ödeneklerinin verilmesi gerekmektedir.

2- 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Üniversitemizde yıllara yaygın olarak yürütülmeye devam edilen projelere ilişkin açıklamalar başlıklar altında aşağıda açıklanmaktadır.

2.1.1.1 1994H031280 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje No	1994H031280
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Derslik (2000 m2), Nıksar UYBYO (7000 m2), Reşadiye Meslek Yüksekokulu (7561 m2), Sağlık Yüksekokulu (11000 m2), Turhal UTİYO (6000 m2)
Proje Yeri	TOKAT
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	1994 – 2018

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
185.000.000	13.900.000	10.500.000	24.400.000	24.274.552	99,48	170.387.173

2016 yılı başlangıç ödeneği 13.900.000,00-TL olup; yıl içinde 9.500.000,00-TL ödenek eklemesi ve Eğitim Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 1994H050110 proje no ile yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinden 1.000.000,00-TL ödenek aktarması ile toplam ödenek 24.400.000,00-TL olmuştur. 24.274.551,90-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında;

- İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı işi için 2016 yılı içinde 12.736.883,24-TL harcama yapılmış olup; Temel ve tüm blokların betonarme imalatları, tüm blokların tuğla duvar imalatları, E-F-J blok kablo tava imalatları, çatı imalatları tamamlanmıştır. Tüm blokların sıva işleri, alçı asma tavan imalatları, dış cephe imalatları, döşeme imalatları, E-F-J blok zayıf akım ve kuvvetli akım kablolama imalatları, asansör imalatları, müşterek ve sıhhi tesisat imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %59 artarak toplam fiziki gerçekleşme %96 olmuştur.



b) Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işi için 2016 yılı içinde 3.120.398,98-TL harcama yapılmış olup; betonarme imalatları, dış cephe kaplama imalatları, çatı yalıtım imalatları, sıva imalatları, temel ve zemin kat topraklama imalatları tamamlanmıştır. Asansör imalatları, alçı sıva imalatları, dış cephe doğrama montaj imalatları, sıhhi tesisat ve müşterek tesisat imalatları, kalorifer tesisat imalatları, seramik imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %67 artarak toplam fiziki gerçekleşme %81 olmuştur.



c) Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İnşaatı işi için 2016 yılı içinde 3.039.478,12-TL harcama yapılmış olup; Dış cephe kaba sıva imalatları, dış Cephe yeni bina tuğla kaplama işleri, iç cephe kaba sıva imalatları, pencere ve kapı kör kasa imalatları, yangın tesisatı, pencere iç denizlik imalatları, taban ve duvar seramik İmalatları, alçısıva imalatları, asma tavan imalatları, elektrik tava ve boru imalatları, müşterek tesisat boru imalatları, havalandırma tesisatı şaft imalatları tamamlanmıştır. Kalorifer tesisatı, otomasyon imalatları, vitrifiye montaj işleri, çevre aydınlatma işleri, topraklama, galeri hattı ve çevre andezit kaplama imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %68 artarak toplam fiziki gerçekleşme %93 olmuştur.



d) Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı işi için 2016 yılı içinde 2.299.813,71-TL harcama yapılmış olup; tüm blokların temel kazı imalatları, temel kalıp ve beton imalatları, bina topraklama levhaları, temel altı grobeton ve yalıtım imalatları, mevcut bina kanalizasyon hattı imalatı, mevcut bina ana hat kablo yenileme imalatları, mevcut bina temiz su ana hattı, inşaat sahası içindeki yapay göl dolgu imalatları, zemin yalıtım ve koruma beton imalatları, A-B-D-E blok 1. kat kolon, kiriş, ve döşeme demir kalıp beton imalatları, C blok kolon demir ve beton imalatları, A-B-C-D-E blok zemin ve 1.kat kolon kiriş döşeme demir kalıp beton imalatları, A blok 2.kat beton kalıp demir imalatları tamamlanmıştır. B blok 2. kat kolon kalıp demir beton imalatları ve döşeme imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %24artarak toplam fiziki gerçekleşme %34 olmuştur.



e) Tokat Sağlık Yüksekokulu Bina İnşaatı işi için 2016 yılı içinde 2.901.934,62-TL harcama yapılmış olup; Temel imalatları temel izolasyon imalatları, altyapı pisu tesisatları tamamlanmıştır. Blokların kalıp, demir, beton imalatları, galeri izolasyon imalatları, yağmur suyu imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %22 artarak toplam fiziki gerçekleşme %32 olmuştur.



f) Reşadiye Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı işi için 2016 yılı içinde 156.806,87-TL harcama yapılmış olup; Kazı alanında bulunan mevcut taş duvarların yıkım işleri, kazı alanında bulunan eski su deposu yıkım işleri tüm blokların serbest kazıları tamamlanmıştır. A blok bodrum kat temel kazıları devam etmektedir. 2016 yılı içindeki fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleşme %2 olmuştur.



g) Ortak Derslik Binası Konferans Salonu koltukları tamir ve montajı işi için 2016 yılı içinde 19.236,36-TL harcama yapılmıştır.

2.1.1.2 1994H031270 Kampüs Altyapısı Projesi

Proje No	1994H031270
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı Ve Özellikleri	Kampüs Altyapısı Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama Ve Bitiş Tarihi	1994 – 2017

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
70.000.000	4.000.000	-	4.000.000	3.019.581	75,49	67.942.282

2016 yılı başlangıç ödeneği 4.000.000,00-TL olup; yıl içinde 3.019.581,46-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında;

- a) Sağlık Kampüsü Kapalı Katlı Otopark İnşaatı işi için 2016 yılı içinde 2.885.262,45-TL harcama yapılmış olup; inşaat kalıp, demir, beton imalatları, perde duvar yalıtım imalatları, kaba sıva imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gelişme %51 olmuştur.





- b) 2016-2018 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.
- c) Taşlıçiftlik Kampüsü Kanalizasyon Hattı Tadilatı işi için 2016 yılı içinde 17.853,77 TL harcama yapılmıştır.

- d) Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi Çatı Tamiri işi için 2016 yılı içinde 19.493,60 TL harcama yapılmıştır.
- e) Sağlık Kampüsü Altyapısı işi için 2016 yılı içinde 19.132,23 TL harcama yapılmıştır.
- f) Ortak Derslik Binası çevre perde duvarı imalatı işi için 2016 yılı içinde 20.532,00 TL harcama yapılmıştır.
- g) Taşlıçiftlik Kampüsü rögar yapımı imalatı için 2016 yılı içinde 9.062,40 TL harcama yapılmıştır.
- h) Eğitim Fakültesi bina dışı kanalizasyon hattı tadilatı işi için 2016 yılı içinde 7.054,04 TL harcama yapılmıştır.
- i) Taşlıçiftlik Kampüsü ana kanalizasyon hattı tadilatı işi için 2016 yılı içinde 20.540,97 TL harcama yapılmıştır.
- j) Sağlık Kampüsü Isı Merkezi Endüstriyel Tıp Ek Doğalgaz Tesisatı işi için 2016 yılı içinde 20.650,00 TL harcama yapılmıştır.

2.1.1.3 2014H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Proje No	2014H050110
Sektörü	Eğitim-Beden Eğitimi Ve Spor
Proje Adı Ve Özellikleri	Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri İnş.(Tribün Kapatma)
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama Ve Bitiş Tarihi	1994 – 2016

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek			
3.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000,00-TL olup; yıl içinde Eğitim – Yükseköğretim sektöründe yer alan Kampüs Altyapısı projesine 1.000.000,00-TL ödenek aktarması yapılmıştır.

2.1.1.4 2012I000330 Hastane Ek Bina İnşaatı ve Makine Teçhizatı Projesi

2016 yılı yatırım programında yer alan sağlık sektörü ek bina inşaatı için 3.000.000,00-TL ve Makine Teçhizat alım projesi için de 9.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.

2.1.1.4.1 Ek Bina İnşaatı Projesi

Proje No	2012I000330
Sektörü	Sağlık
Proje Adı ve Özellikleri	Ek Bina İnşaatı ⁽¹⁾ İnşaat Hastane İnşaatı (, 32.000 m2) (500 yatak)
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2012 – 2017

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
50.635.000 ⁽¹⁾	3.000.000	-	3.000.000	973.766	32,46	50.744.121

(1) Bu proje kapsamında sadece İnşaat harcama bilgileri belirtilmiş olup; Makine – Teçhizat alımı değerlendirilmemiştir.

2016 yılı başlangıç ödeneği 3.000.000,00-TL olup; 2016 yılı içinde 973.765,76-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; 500 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası İnşaatı işinde 2016 yılı içinde; tüm imalatlar tamamlanmış olup işin geçici kabulü yapılarak 500 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Binası hizmete açılmıştır. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %2 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 olmuştur.





2.1.1.4.2 Makine ve Teçhizat Alımları Projesi

Makine ve Teçhizat Alımları Projesi için ayrılan 9.000.000,00-TL ödeneğin tamamı harcanmış olup, alınan makine ve teçhizatın detaylı dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Tablo 10: Makine Teçhizat Projesi Kapsamındaki Alımlar (TL)

Malzeme Cinsi	KDV Hariç Tutar	KDV Dahil Toplam
Dolap	38.584,53	45.529,75
Döşeme Demirbaşı	1.590,00	1.876,20
Hasta Muayene Masası	9.342,92	11.024,64
İlaç Tedavi ve Pansuman Arabası	19.800,00	23.364,00
Paravan	5.820,00	6.867,60
Teşhis ve Tedavi Cihaz ve Aleti	1.247.078,86	1.471.553,06
Dosya Dolabı	20.939,47	24.708,58
Döner Ocağı	1.910,00	2.253,80
EKG Cihazı	90.610,17	106.920,00
Eİ Terminali	55.000,00	64.900,00
Fırın	10.000,00	11.800,00
Gatronu Kapak	1.888,40	2.228,31
Gastronum Küvet	3.870,39	4.567,06
Göz Cerrahi Alet Seti	4.759,32	5.616,00
Göz Hastalıkları Tıbbi Cihazı	209.150,00	246.797,00
Hasta Yemek Masası	46.137,16	54.441,85
Hastabaşı Monitörü	226.507,12	267.278,40
Kalp Monitörü	102.966,10	121.500,00
Kanepe	42.710,68	50.398,60
Kart Okuyucu	6.000,00	7.080,00
Kırıcı ve Delici	440,00	519,20
Klasik Tip Sandelye	20.698,03	24.423,68
Komidin	67.066,44	79.138,40
Laparoskopi	176.882,03	208.720,80
Malzeme Ayırma Raf ve Ranzası	10.093,39	11.910,20
Malzeme Dolabı	6.148,00	7.254,64
Masaüstü Tarayıcı	27.424,78	32.361,24
Matkap	210,00	247,80
Misafir Koltuğu	16.114,12	19.014,66
Nebulizatör	6.740,85	7.954,20
Nevresim Takımı	153.559,32	181.200,00
Nokta Vuruş Yazıcı	1.649,17	1.946,02
Ocak	5.220,00	6.159,60
Otoskop	3.889,83	4.590,00
Para Sayma Makinesi	2.400,00	2.832,00
Projeksiyon Lamba	1.732,00	2.043,76
Sehpa	2.764,62	3.262,25
Serum Askılığı	15.840,00	18.691,20
Seyyar Muayene Lambası	13.860,00	16.354,80
Soyunma Dolabı	78.914,08	93.118,62
Tansiyon Aleti	8.041,02	9.488,40
Hasta Taşıma Sandalyesi	13.983,05	16.500,00
Televizyon	187.454,36	221.196,15
Telsiz	12.150,00	14.337,00
Tezgah	66.486,01	78.453,49
Tomografi Cihazı	1.918.013,00	2.263.255,34
Toplantı Masası	7.759,80	9.156,56
Üçlü Paravan	1.498,98	1.768,80
Yastık	17.796,61	21.000,00
Yemek Isıtma Makinesi	23.113,00	27.273,34
Yemek Masası	14.695,32	17.340,48

Yemek Sandalyesi	2.075,21	2.448,75
Hasta Komidini	92.978,47	109.714,60
Yemek Taşıma Arabası	14.704,00	17.350,72
Yemek Taşıma Kabı	3.195,00	3.770,10
Yetişkin Karyolası	886.766,90	1.046.384,94
Yüz Tanıma Terminali	32.000,00	37.760,00
Zemin Yıkama Makinesi	150.643,52	177.759,35
Mr Sistemi	1.248.130,37	1.472.793,84
Röntgen	169.322,22	199.800,22
TOPLAM		9.000.000,00

2.2 Tamamlanan Projeler

Üniversitemize yatırım programı çerçevesinde yürütülen hizmetlerden 2016 yılı içerisinde bitirilmiş olan projeler aşağıda açıklamalarıyla yer almaktadır.

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

Yatırım programında yer alan tamamlanmış projeler;

2.1.1.1 2016H032360 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje No	2016H032360
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı Ve Özellikleri	Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje İşi Etüd-Proje ve Müş.
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama Ve Bitiş Tarihi	2016-2016

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
100.000	100.000	-	100.000	28.202	28.20	28.202

2016 yılı başlangıç ödeneği 100.000,00-TL olup; yıl içinde 28.202,00-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında;

- a) Kapalı Tribün Binası Statik Projesi işi için 2016 yılında 19.942,00-TL harcama yapılmıştır.
- b) Sağlık Kampüsü Isı Merkezi Endüstriyel Tıp Ek Doğalgaz Tesisatı projesi için 2.360,00-TL harcama yapılmıştır.
- c) Eğitim Fakültesi Öğrenci Kantini Binası statik projesi için 5.900,00-TL harcama yapılmıştır.
- d) Araştırma ve Uygulama Hastanesi A ve B blok Ameliyathane Yapımı ile Poliklinik Binası Proje Revize işi ihalesi yapılmış, 19.12.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış olup; 2016 yılı içinde harcama yapılmamıştır.

2.2.1.1 Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi

Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Makine Teçhizat Alımları ve Bakım Onarım için 1.723.000,00-TL, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına Büyük Onarım için 2.007.000,00-TL ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Bilgi Teknolojileri için 1.270.000,-TL olmak üzere toplamda 5.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, her birinin harcama tutarları ve detaylı harcama tabloları aşağıda yer almaktadır.

Tablo 11: 2016 Yılı Muhtelif İşleri Projesi Kapsamında Birim Harcamaları (TL)	
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	912.009,34
Bilgisayar Alımları	647.816,78
Yazılım Alımları	244.527,86
Yedek Parça Alımları	19.664,70
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.454.330,16
Makine Teçhizat Hazine	644.473,64
Makine Teçhizat Bakım Onarım	103.856,52
Makine Teçhizat (Öz Gelir)	706.000,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	2.006.869,66
Büyük Onarım Giderleri	2.006.869,66
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	95.564,52
Makine Teçhizat Alımları	95.564,52
TOPLAM	4.468.773,68

2.2.1.1.1 Büyük Onarım

Proje No	2016H032370
Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Bakım Onarım
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2016 – 2016

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
2.007.000⁽¹⁾	2.007.000	0,00	2.007.000	2.006.870	99,99	2.006.870

(1) Bu proje kapsamında Büyük Onarım ödeneği ve bilgileri değerlendirilmiştir. Ödeneğin 221.000,00-TL'si özel gelirlerden karşılanmıştır.

2016 yılı başlangıç ödeneği 2.007.000,00-TL (221.000,00-TL'si özel gelirlerden karşılanmak üzere) olup; 2.006.869,61-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında;

- a) Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2016 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işinde 2016 yılı içinde 1.706.044,00-TL harcama yapılmış olup; Tütün depolarında iç cephe alçı işleri, alçı sıva imalatları, 60x60 alüminyum asma tavan imalatları, duvar ve döşeme fayans imalatları, kapı imalatları, asma tavan imalatları, alçıpan asma tavan imalatları, duvar alçı imalatları, mekanik ve elektrik tesisat imalatları, Kütüphane Binasında duvar ve döşemem fayans imalatları,kapı imalatları, asma tavan imalatları, armatür değiştime işleri, ıslak hacim elektrik ve mekanik tesisat imalatları, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda duvar ve tavan fayans imalatları, Merkezi Laboratuvar Binası yangın merdiveni ve çatı imalatları tamamlanmış olup geçici kabul aşamasına gelmiştir.



- b) Ziraat Fakültesi Tavukçuluk Ünitesi bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 20.574,48-TL harcama yapılmıştır.
- c) Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 20.827,00-TL harcama yapılmıştır.
- d) Zile Meslek Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 20.785,70-TL harcama yapılmıştır.
- e) Zile Meslek Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 20.841,75-TL harcama yapılmıştır.
- f) Zile Meslek Yüksekokulu Binası çatı bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 20.817,56-TL harcama yapılmıştır.
- g) Konukevi, Almus Meslek Yüksekokulu Binası, Erbaa Meslek Yüksekokulu Binası ve Konservatuvar Binası elektrik ve jeneratör bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 20.661,80-TL harcama yapılmıştır.
- h) Ziraat Fakültesi Tavukçuluk Ünitesi bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 20.831,72-TL harcama yapılmıştır.
- i) Ziraat Fakültesi Tavukçuluk Ünitesi bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 20.886,00-TL harcama yapılmıştır.
- j) Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 20.886,00-TL harcama yapılmıştır.
- k) Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 20.847,60-TL harcama yapılmıştır.
- l) Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Oteli Binası bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 20.644,10-TL harcama yapılmıştır.
- m) Merkezi Laboratuvar Binası Havalandırma ve Klima Santrali Mekanik tesisat işi için 2016 yılında 20.647,64-TL harcama yapılmıştır.
- n) Almus Meslek Yüksekokulu Binası çatı bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 20.626,40-TL harcama yapılmıştır.
- o) Taşlıçiftlik Kampüs Binaları çatı bakım ve onarımı işi için 2016 yılında 6.962,00-TL harcama yapılmıştır.
- p) Taşlıçiftlik Kampüsü Merkezi Yemekhane Mutfak Ek Doğalgaz Tesisatı tesisat işi için 2016 yılında 20.614,60-TL harcama yapılmıştır.
- q) Taşlıçiftlik Kampüsü kanalizasyon hattı tadilatı işi için 2016 yılında 3.371,26-TL harcama yapılmıştır.

2.2.1.1.2 Muhtelif İşler Makine Teçhizat ve Taşıt Alımları

Muhtelif İşler Projesi Makine-Teçhizat alımları ve Bakım Onarım giderleri kurumumuzda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, bu kapsamda ilgili daire başkanlıklarınca 1.549.894,68TL harcama yapılmıştır.

Tablo 12: İdari ve Mali İşler Makine Teçhizat Bakım Onarım (TL)

Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	KDV Hariç Tutar	Harcanan Tutar
Brülör Bakım Onarımı	2	2.200,00	2.596,00
Fotokopi makinesi yedek parça alımı	6	1.700,00	2.006,00
Güç Kaynağı Bakımı	1	450,00	531,00
Baskı Makinaları Bak. On.	4	3.000,00	3.540,00
Pompa ve Hidrofor Grubu Bakımı	8	5.400,00	6.372,00
Brülör Bakım Onarımı	2	2.250,00	2.655,00
VRF Klimaların İç ve Dış Üniteleri Bakımı	2	17.000,00	20.060,00
Klima Santralleri Bakımı	4	17.000,00	20.060,00
Jeneratör bakımı	1	7.581,00	8.945,58
Baskı Makinaları Bak. On.	4	3.000,00	3.540,00
Güç Kaynağı Bakımı	1	3.500,00	4.130,00
Mitsubishi Kompresör Bakımı	1	7.517,00	8.870,06
Mitsubishi Kompresör Bakımı	1	7.517,00	8.870,06
Klima Gaz Alımı	15	1.215,00	1.433,70
Kumanda Paneli	2	804,00	948,72
Buharlı Nemlendirici Silindir	6	6.690,00	7.894,20
İşyeri Kazanı Elektrik Kart	1	1.190,00	1.404,20
TOPLAM			103.856,52

Tablo 13: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Makine-Teçhizat Alımları (TL)

Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Birim Fiyatı	Harcanan Tutar
Seperatör (metre)	26	215,00	5.590,00
Elektromekanik Turnike (adet)	8	2.475,00	19.800,00
Yemekhane Harcama Terminali (adet)	8	2.360,00	18.880,00
Yemekhane Yükleme Terminali (adet)	11	2.360,00	25.960,00
Dijital Kürsü (adet)	1	10.756,88	10.756,88
TOPLAM			80.986,88
KDV %18			14.577,64
GENEL TOPLAM			95.564,52

Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	KDV Hariç Tutar	Harcanan Tutar
Portmanto	22	2.035,00	2.401,30
Arşiv rafı	31	11.820,00	13.947,60
Ayna	4	1.000,00	1.180,00
Banko	1	1.300,00	1.534,00
Buzdolabı	2	1.610,00	1.899,80
Çalışma koltuğu	192	41.937,90	49.486,72
Çalışma Masası	26	8.998,88	10.618,68
Çim Biçme Makinası	3	6.450,00	7.611,00
Çit Kesici	1	1.500,00	1.770,00
Davlumbaz	1	425,00	501,50
Dijital Kürsü	1	10.756,88	12.693,12
Dilsiz uşak	4	1.000,00	1.180,00
Dosya dolabı	81	23.498,55	27.728,29
Yazı Tahtası	41	14.265,90	16.833,76
Elektrikli Süpürge	1	360,00	424,80
Etejer	16	5.719,20	6.748,66
Evrak İmha Makinası	2	3.684,93	4.348,22
İkili Okul Sırası	100	20.350,00	24.013,00
Keçe tabanlı Halıfileks	67	3.551,00	3.835,08
Klima	7	13.290,00	15.682,20
Kolçaksız Sandalye	81	6.237,00	7.359,66
Koltuk	17	4.918,10	5.803,36
Konferans Koltuğu	33	22.770,00	26.868,60
Konferans sandalyesi	25	2.035,00	2.401,30
Konsol	4	6.000,00	7.080,00
Köşe sehpa	25	1.371,18	1.617,99
L Tipi Memur Masa Takımı	2	869,00	1.025,42
Makam koltuğu	26	7.304,00	8.618,72
Makam masa takımı	27	36.581,02	43.165,60
Masa Takımı	23	10.507,20	12.398,50
Metal Kapı Dedektörü	6	15.870,00	18.726,60
Misafir bekleme koltuğu	223	59.164,08	69.813,61
Motorlu Tırpan	1	1.780,00	2.100,40
Pano	2	630,00	743,40
Portreli Müzik Yazı Tahtası	3	2.032,35	2.398,17
Sehpa	52	3.344,44	3.946,44
Set Üstü Ocak	1	150,00	177,00
Tekli bekleme koltuğu	80	15.286,60	18.038,19
Tekli okul sırası	30	4.155,00	4.902,90
Televizyon	1	1.270,00	1.498,60
Toplantı koltuğu	10	3.800,00	4.484,00
Toplantı masası	11	3.568,84	4.211,23
Toprak Direnci Ölçüm Cihazı	1	1.125,00	1.327,50
Turnike Geçiş Sistemi	1	117.381,00	138.509,58
Ups-Kesintisiz Güç Kaynağı	6	15.240,00	17.983,20
Yemek masası	20	7.000,00	8.260,00
Zebra ve Jaluzi Perde	1198,5	24.607,35	26.575,94
Konferans Koltuğu (ikinci Öğretim)	867	598.230,00	705.911,40
TOPLAM			1.350.385,04

2.2.1.1.3 Bilgi Teknolojileri

2016 Yılı Muhtelif Projeler kapsamında Bilgi Teknolojileri Projesi için 970.000,00-TL hazine yardımı ve 300.000,00-TL ikinci öğretim gelirleri olmak üzere 1.270.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje dahilinde yapılan toplam harcama 912.009,34-TL olmuştur.

Tablo 15: Bilgi Teknolojileri Kapsamında Yapılan Alım Listesi (TL)

Malzeme Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam
Samsung SM-T810 Tablet	1	1.311,86	1.311,86
3 TB SATA HDD (Harddisk) Alımı	2	290,00	580,00
HDMI Kablosu 60 m Çipli	3	800,00	2.400,00
VGA HDMI Dönüştürücü	2	150,00	300,00
HDMI Switch	2	225,00	450,00
HDMI Çevirici Switch	2	150,00	300,00
Evrak İmha Makinası DMO I	1	1.284,63	1.284,63
Temizlik Kat Arabası DMO I	1	225,50	225,50
500 GB Sata HDD	30	163,00	4.890,00
Kablosuz Optic Mouse	22	38,00	836,00
1 TB Sata HDD	5	185,00	925,00
1155 Socket Ana Kart	5	185,00	925,00
USB Kablolü Optic Mouse	50	17,00	850,00
USB F Klavye	30	20,00	600,00
USB Bellek	5	80,00	400,00
HDMI Kablo	17	55,00	935,00
240 GB SSD (Solid State Disk)	2	400,00	800,00
Kablo Kanalı	1020	3,00	3.060,00
Standart Tip Kablo Bağı	600	0,35	210,00
Cat6A/7 Shielded Modular Plug	10	84,00	840,00
5 Port 10/100/1000 MBPS	5	110,00	550,00
Tübitak Mini Kart Okuyucu Alımı	193	16,94	3.271,18
Tübitak Mini Kart Okuyucu Alımı	5	15,00	75,00
Telsiz Telefon	4	100,00	400,00
HDMI Uzatma Cihazı	1	1.450,00	1.450,00
HDMI Switch	2	520,00	1.040,00
Led Monitör	2	700,00	1.400,00
Canon LBP 6230DW Siyah-Beyaz Yazıcı	5	414,04	2.070,20
Casio XJ-M146 Projeksiyon Cihazı	2	3.110,32	6.220,64
Casio XJ-V1 Projeksiyon Cihazı	5	2.062,63	10.313,15
Barkod Etiket Yazıcı	1	572,95	572,95
Canon LBP 6670DNSiyah-Beyaz Yazıcı	2	511,02	1.022,04
Fujitsu SP-1125 Tarayıcı	6	1.193,63	7.161,78
48 Port Ağ Anahtarı	12	4.450,27	53.403,24
Toshiba I3 İşlemci Dizüstü Bilgisayar	40	1.588,22	63.528,80
Arçelik Duvar Tipi Split Klima	2	1.270,50	2.541,00
21,5 İnç Monitör	50	349,81	17.490,50
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	1	1.029,04	1.029,04

Lenovo Mini Tower Masaüstü Bilgisayar	30	1.765,16	52.954,80
Casio XJ-V1 Projeksiyon Cihazı	10	2.074,74	20.747,40
Casper Dizüstü Bilgisayar	5	1.547,82	7.739,10
22 İnç Monitör	56	339,20	18.995,20
Lexmark MX310DN Siyah Beyaz Yazıcı	1	599,37	599,37
Lenovo Mini Tower Masaüstü Bilgisayar	41	1.711,66	70.178,06
Canon LBP 6230DW Siyah-Beyaz Yazıcı	10	408,12	4.081,20
Disk Ünitesi Kapasite Artırımı	1	41.425,00	41.425,00
Server Kabinet	5	3.106,23	15.531,15
Parmak İzi Kart Okuyucu	1	1.475,00	1.475,00
Gbic Modül	10	199,00	1.990,00
İnteraktif Algılama ve Söndürme Sistemi	1	7.900,00	7.900,00
Cat6A Kablo	1500	2,48	3.720,00
IBM 146 GB 100000 RPM SAS 6Gbps	2	374,00	748,00
3 TB 7200 RPM SATA 6Gb/s	2	354,00	708,00
Casio XJ-V2 Projeksiyon Cihazı	7	2.577,40	18.041,80
Fujitsu SP-1125 Tarayıcı	5	1.321,89	6.609,45
24 Port Anahtarlama Cihazı	5	6.976,43	34.882,15
Patch Panel	13	85,56	1.112,28
Tübitak Mini Kart Okuyucu Alımı	24	16,95	406,80
İkisi Bir Arada Laptop	1	5.900,00	5.900,00
15,6 İnç Notebook	1	4.300,00	4.300,00
Profesyonel Video Kamera	1	6.000,00	6.000,00
Objektif Lens	1	8.400,00	8.400,00
Fiber Optik Kablo	1000	5,00	5.000,00
Yangın Algılama ve Söndürme Sistemi	1	13.890,00	13.890,00
700 Kullanıcı ESET Güvenlik Yazılımı	700	6,00	4.200,00
SSL Sertifikası Alımı	1	434,79	434,79
EBYS Yazılımı Bakım ve Destek Hizmeti Alımı	1	6.750,00	6.750,00
EBYS Yazılımı Bakım ve Destek Hizmeti Alımı	1	6.750,00	6.750,00
DeepFreeze Standart Version Upgrade	2	42,45	84,89
DeepFreeze Standart Maintenance IN	2	14,21	28,41
DeepFreeze Standart Maintenance IN	1	14,20	14,20
İcra Takip Yazılımı (Ana Makine)	1	830,32	830,32
İcra Takip Yazılımı (Terminal)	3	148,92	446,75
Hukuk Yazılımı (Ana Makine)	1	752,40	752,40
Hukuk Yazılımı (Terminal)	3	148,92	446,75
Özel Yetenek Sınav Programı	1	4.500,00	4.500,00
Firmware Güncelleme Hizmeti Alımı	1	70.225,00	70.225,00
Tübitak 3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika Alımı	194	101,69	19.728,81
Tübitak 3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika Alımı	6	99,00	594,00
e-Hakediş için 2015 Yılı Güncel Sürüm Bedeli	9	900,00	8.100,00
SharePointStdCAL 2016	10	79,00	790,00
SharePointSvr 2016	1	5.400,00	5.400,00
SQLSvrStd 2016 2016 OLP NL Acdmc	1	715,00	715,00
VSTeamFndtnSvr SNGL LicSAPk OLP	1	465,00	465,00
WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL Acdmc	100	209,00	20.900,00
WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NLAcdmc	10	26,00	260,00
WinSvrDC Core 2016 SNGL OLP 2Lic	1	4.900,00	4.900,00

WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP	20	83,00	1.660,00
SQLCAL 2016 SNGL OLP NL	2	270,00	540,00
WinSrvSTDCore 2016 SNGL OLP	80	118,00	9.440,00
Dew Express Asp.Net Subscription	1	3.710,00	3.710,00
Tübitak 3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika Alımı	24	101,69	2.440,68
Öğrenci İşleri Otomasyonu	1	32.120,00	32.120,00
İklimlendirme Cihazı Malzemeli Bakımı	1	1.300,00	1.300,00
Cat 6 Kablo	4	465,00	1.860,00
Raspberry Pi	20	150,00	3.000,00
Mikro USB Kablolü Adaptör	20	30,00	600,00
MicroSDHC Hafıza Kartı	20	30,00	600,00
HDMI to VGA Dönüştürücü	20	60,00	1.200,00
Raspberry Pi Vesa Çerçeve Kutusu	20	50,00	1.000,00
HDMI Sinyal Uzatma Cihazı	1	1.450,00	1.450,00
Sunum Kalemi	16	185,00	2.960,00
Tornavida Seti	1	85,00	85,00
Klavye	1	250,00	250,00
Adaptör Kablosu Tamiri	1	75,00	75,00
Touch Pad Tamiri	1	50,00	50,00
Mikrofon Tamiri	1	75,00	75,00
Patch Kablo	120	18,00	2.160,00
Toplam			772.889,27
KDV			139.120,07
KDV Dahil Toplam			912.009,34

2.2.1.2 Yayın Alımları

2016 Yılında Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına yayın alımları için hazine yardımından 1.000.000,00-TL, ödenek tahsis edilmiştir. Mevcut ödenekler dahilinde bu projeden 936.507,66-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo 16: Yayın Alımları

(TL)

Alınan Yayınlar ve Veri Tabanları	Harcanan Tutar
SOBİAD Veritabanı	8.585,00
Hukuktürk Veritabanı	1.449,00
İdealtürk Dergi	12.554,30
TechknowledgeAAAS Veritabanı	13.092,42
Willey Veritabanı Ödemesi	106.156,57
Proquest Ebrary	19.159,00
Proquest AGRI	12.391,01
JSTOR	14.688,98
Ebsco5 Veritabanı	111.834,20
Ebsco Elektronik Jurnal Dergi	58.342,65
Elsevier Clinical Key Veritabanı	38.284,33
Update Veritabanı	40.813,03
Oxford Universty Press	16.167,11
Cambridge Üniversty veritabanı	16.133,63
Techknowledge Deepknow Veritabanı	18.265,97
Micro ASTM	31.289,08
Sage Veritabanı	32.775,23
Proquest Full Text Veritabanı	66.485,01
Micro Information APS	7.837,25
Elsevier Reaxy Veritabanı	42.292,13
ACST (American chemical society)	34.093,58
Techknowledge AccessSurgery	19.156,15
Techknowledge Turnitin	18.751,37
LexisNexis	16.965,62
Proquest Central	76.019,06
Muhtelif Kitaplar	102.925,98
GENEL TOPLAM	936.507,66

2.2.1.3 Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi

Bu Proje Büyük Onarım Projesi ile Makine Teçhizat Alımları ve Bakım Onarım Projesinden oluşmaktadır.

2.2.1.3.1 Büyük Onarım

Proje No	2016I0000220
Sektörü	Sağlık
Proje Adı ve Özellikleri	Muhtelif İşler (Hastane Büyük Onarım) Büyük Onarım
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2016 – 2016

Proje Bedeli	2016 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
3.846.000	3.846.000	0,00	3.846.000	39.307	1,02	39.307

2016 yılı başlangıç ödeneği 3.846.000,00-TL olup; 2016 yılı içinde 39.306,63-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında;

- Araştırma ve Uygulama Hastanesi sistem odası yapımı işinde 2016 yılı içinde 20.542,27-TL harcama yapılmıştır.
- Araştırma ve Uygulama Hastanesi C blok giriş kapısı tadilatı işinde 2016 yılı içinde 18.764,36-TL harcama yapılmıştır.

2.2.1.3.2 Makine Teçhizat Alımları ve Bakım Onarım

2016 yılı Yatırım Programı ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü harcamaları için 1.000.000,00-TL döner sermayeden karşılanmak üzere toplamda 9.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten hem bakım onarım işi hem de makine teçhizat alım işi yürütülmüştür. Yıl içerisinde bu projeden 1.572.480,52-TL harcama yapılmıştır.

Tablo 17: Sağlık Sektörü Makine Teçhizat Alımı

(TL)

Makine Teçhizat Bakım Onarım	KDV Hariç Tutar	KDV Dahil Toplam
Göz Yıkama Ünitesi	1.288	1.519,84
Anestezi Cihazı	16.500	19.470,00
Yoğun Bakım Ventilator	16.500	19.470,00
Amal.Tavan Lam.	16.450	19.411,00
Lazer Cihazı	21.936	25.883,93
Cr Ve Dr Sistemi	48.000	56.640,00
Ultrason Cihazı	6.000	7.080,00
3 Jenaratör Bakım	29.000	34.220,00
Pnomatik Tüp Sis	13.000	15.340,00
Ventilatör Bakım Ona12.05.2016	15.500	18.290,00
Maquet 21 Kalem	112.566,30	132.828,23
Merkezi Kılma	16.000,00	18.880,00
Patoloji Cihazları	7.800,00	9.204,00
Eeg Cihazı Nihon Kokte	13.000,00	15.340,00
Sisteskop Cihazı Bak	17.700,00	20.886,00
Cerrahi Motor Bey Cer	17.700,00	20.886,00
El Telsizi	12.150,00	14.337,00
Otom Enj Bak Onarım	10.800,00	12.744,00
Hsk Tıbbi Cihazlar	6250	7.375,00
Hsk Tıbbi Cihazlar	1685	1.988,30
Hsk Tıbbi Cihazlar	5445	6.425,10
Hsk Tıbbi Cihazlar	3750	4.425,00
Butik Medikal	2500	2.950,00
70 Derece Optik	6785	8.006,30
Odyo Cihaz Kalibrasyo	3000	3.540,00
Fiber Üreteskopi Bak On	24500	28.910,00
Natuş Oae	1360	1.604,80
Ultrason Cihazı	5000	5.900,00
Göz Tomografi Cihazı	14500	17.110,00
Ultrason Cih.B Prop	1500	1.770,00
Su Arıtma Sistemi	17000	20.060,00
Radyoloji Cih.Dijitalize	185000	199.800,00
TOPLAM		772.294,50

Tablo 18: Sağlık Sektörü Makine Teçhizat Alımı (TL)

Malzeme Cinsi	KDV Hariç Tutar	KDV Dahil Toplam
Acil Müdahale ve Tedavi Arabası	8.580,00	10.124,40
Ambu Yenidoğan	1.206,74	1.423,95
Barkod Yazıcı ve Okuyucu	8.272,16	9.761,15
Batarya Takımı	528,00	623,04
Battaniye	30.898,31	36.460,00
Bekleme Koltuğu	295.753,14	348.988,71
Benmari	20.523,00	24.217,14
Bilgisayar Kasası	43.753,35	51.628,95
Bulaşık Makinesi	20.724,00	24.454,32
Buzdolabı	84.423,32	99.619,52
Cerrahi Aspiratör	13.088,14	15.444,00
Çalışma Koltuğu	30.743,05	36.276,80
Çalışma Masası	3.889,83	4.590,00
Çamaşır Arabası	19.166,34	22.616,28
Çekyat	13.250,64	15.635,76
Çelik Raf	68.476,32	80.802,06
Davlumbaz	12.502,00	14.752,36
Dolap	2.345,72	2.767,95
TOPLAM		800.186,39

2.2.1.4 Teknolojik Araştırmalar Sektörü

Teknolojik Araştırmalar Sektörü için 990.000,00-TL başlangıç ödeneği verilmiş olup yıl içerisinde 1.400.000,00-TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

2.2.1.4.1 Bilimsel Araştırma Projeleri

Teknolojik Araştırmalar Sektöründe yer alan tek proje olmasından ötürü tahsis edilen 990.000,00-TL'nin tamamı bu projede kullanılmış ve mevzuat gereği Üniversitemiz Döner Sermayesinin elde ettiği gelirlerden ayrılan paylar da yıl içerisinde gelir olarak kaydedilerek Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir. Yapılan bu ekleme neticesinde sahip olunana toplam gelir 2.390.000,00-TL olmuş ve tamamı bilimsel araştırma projeleri hesabına aktarılmıştır. Bu proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin detaylı tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 19: 2016 Yılında Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

(TL)

Proje No	Proje Yöneticisi	Proje Adı	Süresi Ay	Proje Bütçesi	2016 Yılı Harcaması
2016/01	Yrd.Doç.Dr. Cem EMEKSİZ	Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu	2	10.875,00 ₺	10.875,00 ₺
2016/02	Prof.Dr.Reşit Doğan KÖSEOĞLU	Servikal sitolojilerde tanısal doğruluk açısından sıvı bazlı sitoloji ve konvansiyonel Pap smear testinin karşılaştırılması	30	199.102,00 ₺	0,00 ₺
2016/03	Prof.Dr.Ramazan ERENLER	NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) Cihazının Optimizasyonu ve Programının yenilenmesi	12	200.000,00 ₺	42.303,00 ₺
2016/04	Yrd.Doç.Dr.İbrahim ARPACI	Uzaktan Eğitim Ödeme Sistemi	8	9.750,00 ₺	7.198,00 ₺
2016/05	Yrd.Doç.Dr.Ümran ÇİÇEK	MÜDEK Başvurusu İçin Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrenci Uygulama Laboratuvarı Alt Yapısının İyileştirilmesi	12	80.000,00 ₺	58.634,20 ₺
2016/06	Yrd.Doç.Dr.Hilal İŞLEROĞLU	MÜDEK Kapsamında Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler Laboratuvarı Alt Yapısının Oluşturulması	9	34.720,60 ₺	25.673,28 ₺
2016/07	Yrd.Doç.Dr.Turgut ATAY	Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Bünyesinde Bulunan Öğrenci Laboratuvarının Alt Yapısının İyileştirilmesi	10	49.680,00 ₺	32.173,20 ₺
2016/08	Doç.Dr. Yakup BUDAK	Antikanserojen etkinliğe sahip olan (E)-1-(4-sinamoilfenil)-1H-pirol-2,5-dion türevlerinin Patent ile koruma altına alınması	6	12.000,00 ₺	12.000,00 ₺
2016/09	Doç.Dr. Yakup BUDAK	Antikanserojenik etkili (3aS,4S,4aR,7aS,8S,8aS)-6-(4-asetilfenil)-3-metil-4,4a,8,8a-tetrahidro-3aH-4,8-metanoisoxazolo [4,5-f]isoindol-5,7(6H,7aH)-dion bileşiğinin Patent ile koruma altına alınması	6	12.000,00 ₺	11.977,00 ₺
2016/10	Yrd.Doç.Dr.Eda ALBAYRAK	'Metastatik Karaciğer Lezyonlarının Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Difüzyon Ağırlıklı MRG ile Değerlendirilmesi ve Karakterizasyonu	12	5.004,72 ₺	0,00 ₺
2016/11	Yrd.Doç.Dr.Fitnet SÖNMEZGÖZ	Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) tanılı Çocuklarında batın içi solid organların MRG ile değerlendirilmesi	11	6.434,64 ₺	5.958,00 ₺
2016/12	Prof.Dr.Fikret ERDEMİR	Finasteridin Rat Modelinde Testis Morfolojisi ve Spermatogenez Üzerine Etkisi	12	17.367,10 ₺	0,00 ₺
2016/13	Yrd.Doç.Dr.Orhan SÜMBÜL	Merkezi Sinir Sistemi Hastalıklarında beyin omurilik sıvısında eser element seviyeleri ve bu hastalıkların patofizyolojileri üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi	6	8.200,00 ₺	0,00 ₺
2016/14	Yrd.Doç.Dr.İlhan Bahri DELİBAŞ	Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Serum Endocan Seviyelerinin Değerlendirilmesi	12	8.370,00 ₺	1.706,40 ₺
2016/15	Doç.Dr.Şahin TAKCI	Ratlarda geliştirilen nekrotizan enterokolit tedavisinde ursodeoksikolik asitin etkinliği	4	9.085,40 ₺	6.435,76 ₺

2016/16	Yrd.Doç.Dr.Yeliz HAYRAN	Dental Ozonun Protez Kaide Rezini Üzerinde Tutunmuş Candida Albicans Biyofilmlerinin Uzaklaştırılmasındaki Etkinliğinin Değerlendirilmesi	24	3.917,60 ₺	0,00 ₺
2016/17	Yrd.Doç.Dr.Fatma AYTAÇ	İndosiyanın yeşili ile yapılan fotoaktif dezenfeksiyonun Streptococcus mutans biyofilmi üzerine etkisinin incelenmesi	6	7.800,98 ₺	7.800,98 ₺
2016/18	Yrd.Doç.Dr.Emre BAYRAM	Kanal içi medikamanların kanal patlarının bağlantısı üzerine etkisi	12	8.645,00 ₺	2.441,44 ₺
2016/19	Doç.Dr.Nihat AKBULUT	Parafonksiyonun Sağlıklı ve Periodontitisli Bireylerde Dişeti Oluğu Sıvısı, Serum Sitokin Seviyeleri ve Dental Plak İçeriğine Etkisinin Araştırılması	24	18.837,40 ₺	0,00 ₺
2016/20	Yrd.Doç.Dr.Özkan SAPSAĞLAM	Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Bilim	12	8.815,00 ₺	0,00 ₺
2016/21	Yrd.Doç.Dr.Yasin GÖKBULUT	Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerileri	7	1.035,00 ₺	1.035,00 ₺
2016/22	Yrd.Doç.Dr.Sabriye BELGÜZAR	Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı'nın Bitki Büyüme Düzenleyici Rizobakteriler İle Biyolojik Mücadele Olanaklarının Araştırılması	24	20.160,18 ₺	10.185,62 ₺
2016/23	Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman ONARAN	In vitro ve In vivo Koşullarda Çileklerde Sorun Olan Toprak Kaynaklı Fungal Patojenlere Karşı Bazı Bitki Ekstraktlarının Antifungal Aktivitelerinin Araştırılması	12	7.000,00 ₺	6.448,79 ₺
2016/24	Doç.Dr.Esen ORUÇ	Salamuralık Yaprak Konusunda Tüketici Tercihleri: Tokat İli Örneği	12	812,00 ₺	0,00 ₺
2016/25	Yrd.Doç.Dr.Şerife TOPKAYA	Tokat İlinde Biber Alanlarında Görülen Viral Etmenlerin Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu	24	29.520,27 ₺	16.744,67 ₺
2016/26	Doç.Dr.Dürdane YANAR	Tokat Yöresi Sebze Ekim Alanlarından Entomopatojen Fungus İzolatlarını Tetranychus urticae 'ye (İki Noktalı Kırmızı Örümcek) Akarisidal Ve Ovisidal Etkisinin Belirlenmesi	24	23.335,86 ₺	17.131,82 ₺
2016/27	Prof.Dr.Mehmet Ali SAKİN	Bazı Çeltik Çeşitlerinin Farklı Lokasyonlarda (Pazar-Niksar-Erbaa) Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi	19	27.953,15 ₺	18.643,95 ₺
2016/28	Doç.Dr.Mahmut HEKİM	Elma türlerinin görüntü işleme destekli otomatik tasniflenmesi	12	16.826,01 ₺	15.124,00 ₺
2016/29	Yrd.Doç.Dr.Seda TOPGÜL	Engelli İstihdamına İlişkin İşverenlerin Tutum Ve Algıları: Tokat Örneği	6	790,00 ₺	0,00 ₺
2016/30	Yrd.Doç.Dr.Mihriban COŞKUN ARSLAN	Hibrid Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Bir Üretim İşletmesinde Simülasyonu ve Yatırım Maliyetlerinin Ürün Maliyetine Etkisinin Analizi ile TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) Açısından Değerlendirilmesi	8	1.500,00 ₺	0,00 ₺

2016/31	Prof.Dr.Mustafa ÇOLAK	Halkın Tarihi Ve Kültürel Bilinç Durumu: "Tokat Örneği"	6	2.606,79 ₺	2.522,35 ₺
2016/32	Prof.Dr.Mahfuz ELMASTAŞ	Rhododendron ungerii Bitkisinin Biyoaktif Bileşiklerinin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi	12	20.127,60 ₺	13.255,95 ₺
2016/33	Yrd.Doç.Dr.Sibel ÖLMEZ CANGİ	Tokat'ta Yer Alan Salamuralık Yaprak Üreticilerinin Tarım Sigortasına Yaklaşımları	12	661,00 ₺	0,00 ₺
2016/34	Doç.Dr.Mehmet AKAR	Şebeke Kalkışlı Eksenel Akıllı Sürekli Mıknatıslı Disk Tipi Senkron Motor Tasarımı ve Prototip Üretimi	24	51.645,00 ₺	14.160,00 ₺
2016/35	Yrd.Doç.Dr.Ergün SÖNMEZGÖZ	Ailevi Akdeniz Ateşli çocuk hastalarda tiroid fonksiyonları ve tiroid oto antikorlarının araştırılması	11	6.562,60 ₺	6.562,60 ₺
2016/36	Yrd.Doç.Dr.Murat AŞCI	Dolaşım Bozukluğunun Eşlik Ettiği Kırıklarda Edaravone'nun Kırık İyileşmesi Üzerine Etkisi	12	7.859,10 ₺	4.587,78 ₺
2016/37	Prof.Dr.Hüseyin ÖZYURT	MK-801 ile oluşturulan psikoz modelinde krill yağının öğrenme ve oksidatif stres üzerine etkisi.	12	5.404,60 ₺	0,00 ₺
2016/38	Doç.Dr.Bekir KARAARSLAN	Otopside biyogüvenlik: Hepatit B, Hepatit C ve HIV bulaş riski analizi	5	8.800,00 ₺	0,00 ₺
2016/39	Doç.Dr.Mustafa SÜREN	Perfüzyon indeksi ve kapiller dolum zamanı kullanılarak brakial pleksus bloğunda mikrosirkülasyonun değerlendirilmesi	18	12.000,00 ₺	0,00 ₺
2016/40	Yrd.Doç.Dr.Hatice BALCI YÜCE	Farklı esansiyel yağ asitlerinin periodontopatojenler üzerindeki antimikrobiyal etkisinin değerlendirilmesi	15	11.997,52 ₺	11.009,80 ₺
2016/41	Yrd.Doç.Dr.Hüda Melike BAYRAM	Farklı Ni-Ti Eğe Sistemlerinin Eğri Kanallardaki Preparasyon Etkinlikleri	18	10.978,00 ₺	2.210,64 ₺
2016/42	Doç.Dr.Emine ŞİRİN KARAARSLAN	Fiberle desteklenmiş bir kompozit rezinin farklı dentin nitelikleri ve preparasyon yöntemlerindeki bağlanma dayanımının geleneksel ve bulk-fill kompozitlerle karşılaştırılması	24	10.181,43 ₺	6.300,88 ₺
2016/43	Doç.Dr.Emine ŞİRİN KARAARSLAN	Floroapatit İçerikli Cam Karbomer Dolgu Materyalinin Farklı Kalınlık Ve Isılarda Sertleştirilmesi Ve Termalsiklusla Yaşlandırma Sonrası Mikrosertliğinin Değerlendirilmesi	12	11.832,00 ₺	9.947,84 ₺
2016/44	Doç.Dr.Halil ERDEM	Sıvı Hayvan Gübresi İle Zenginleştirilmiş Biocharların Ekmeklik Buğdayın Gelişimi, Besin Elementi Alımı Ve Toprak Kalitesine Etkileri	12	10.037,00 ₺	0,00 ₺

2016/45	Prof.Dr.Kenan KARA	Tokat ili domates ekiliş alanlarında zararlı olan beyazsinek [<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadicus) (Hemiptera: Aleyrodidae)]'in neonikotinoid grubu insektisitlere karşı direnç düzeyleri ve bu pestisitlerin domateste kalıntı düzeylerinin belirlenmesi	24	12.000,00 ₺	0,00 ₺
2016/46	Yrd.Doç.Dr.Aslhan DEMİRDÖVEN	Stevia İçeren Yenilebilir Film Formülasyonlarının Geliştirilmesi Ve Yenilebilir Film Kaplama İle Modifiye Atmosferde Ambalajlama Kombinasyonun Az İşlem Görmüş Elmaların Raf Ömrüne Etkileri	24	12.000,00 ₺	7.300,02 ₺
2016/47	Prof.Dr.Mustafa ÇOLAK	Birinci Dünya Savaşı'nda Cihad-ı Ekber İlanı ve Etkileri	15	8.249,61 ₺	5.702,58 ₺
2016/48	Prof.Dr.Mustafa ÇOLAK	Demokrat Parti Döneminde Tokat (1950-1960)	24	5.643,97 ₺	1.836,12 ₺
2016/50	Yrd.Doç.Dr.İlknur BÜTÜN	Böbrek İskemi-Reperfüzyon Yaralanması Üzerine Krill Yağının Koruyucu Etkisi	12	2.989,00 ₺	0,00 ₺
2016/51	Prof.Dr.Hüseyin ASLAN	Erişkin Rat Testis Torsiyonuna Hesperidin'in Etkisi	12	4.887,60 ₺	0,00 ₺
2016/52	Prof.Dr.Birsen ÖZYURT	Sıçan Ovaryum Dokusunda İskemi/Reperfüzyon Hasarının Aquaporin 1,3 Ve 5 Ekspresyonu Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması	12	3.950,00 ₺	0,00 ₺
2016/53	Yrd.Doç.Dr.Hilal IRMAK SAPMAZ	Sıçanlarda Diz Eklemi İçine Uygulanan Diklofenak Ve Metilprednizolonun Menisküs Dokusundaki Aquaporin 1 Ve 3 Ekspresyonu Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması	12	6.000,00 ₺	0,00 ₺
2016/54	Prof.Dr.Mehmet GÜNEŞ	Bazı Ahududu Çeşitlerinin Çorum Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu	24	1.649,00 ₺	0,00 ₺
2016/55	Doç.Dr.Çetin ÇEKİÇ	Çelik Alma Zamanı Ve Köklendirme Sürelerinin Karadut Odun Çeliklerinin Köklenme Ve Fidan Gelişim Performansı Üzerine Etkisi	24	6.000,00 ₺	5.790,50 ₺
2016/56	Prof.Dr.Mehmet GÜNEŞ	Tokat Ekolojik Koşullarında <i>Lilium candidum</i> ve <i>Lilium akkusianum</i> zambak türlerinin Fenolojik ve Morfolojik Karakterizasyonu	12	1.155,96 ₺	0,00 ₺
2016/57	Yrd.Doç.Dr.Yemliha EDİZER	Tokat İlinde Yetiştirilen Bazı Yerel Erik (<i>Prunus</i> sp.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi	12	4.251,00 ₺	2.613,70 ₺
2016/58	Doç.Dr.İsa KARAMAN	Buğday Bitkisinin Rizosfer Bölgesinden Bakteriyel İzolatların Eldesi, İmmobilizasyonu ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi	12	5.995,36 ₺	4.116,43 ₺
2016/59	Yrd.Doç.Dr.Hilal İŞLEROĞLU	Farklı İnkübasyon Koşulları ve Stres Faktörlerinin Mikrobiyal Transglutaminaz Üretimine Etkisi, Enzimin Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu	12	6.000,00 ₺	2.446,28 ₺

2016/60	Yrd.Doç.Dr.Seçil Erden TAYHAN	Hematopoetik Hücrelerin Üretilmesi, Çoğaltılması ve Farklılaştırılmasında Görevli EPO ve TPO'nun Medikal Biyoteknolojik Ürün Olarak Üretilmesi, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu	15	6.000,00 ₺	5.127,12 ₺
2016/61	Yrd.Doç.Dr.Seçil Erden TAYHAN	Kan Kanseri Tedavisinde Sıklıkla Kullanılan İnsan Hematopoetik Büyüme Faktörlerinden G-CSF ve GM-CSF'ün Rekombinant Olarak Üretilmesi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu	15	6.000,00 ₺	4.371,76 ₺
2016/62	Yrd.Doç.Dr.Hilal İŞLEROĞLU	Transglutaminaz Enziminin Farklı Kaplama Materyalleri ile Mikroenkapsülasyonu	12	6.000,00 ₺	3.197,21 ₺
2016/63	Yrd.Doç.Dr.Ramazan DİLER	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Savaş ve Barışa İlişkin Tutumları ve Derslerinde Barış Eğitiminin Yeri Hakkındaki Görüşleri	12	1.427,00 ₺	0,00 ₺
2016/64	Doç.Dr.Yakup BUDAK	Alloplast Greft (Hidroksiapatit, Sentetik Kemik Tozu) Sentezi	6	1.000,00 ₺	371,70 ₺
2016/65	Yrd.Doç.Dr.Yasemin ÇETİN KAYA	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı İçin Temel Bilgisayar Laboratuvarının Kurulması	9	162.000,00 ₺	119.765,28 ₺
2016/66	Prof.Dr.Ramazan ERENLER	Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bünyesinde, Çağrı Merkezi Uygulama Laboratuvarı Kurularak Derslerin Daha Verimli Hâle Getirilmesi	12	173.128,27 ₺	136.985,22 ₺
2016/67	Doç.Dr.Ömer YILDIRIM	GOP Üniversitesi Harita Mühendisliği GNSS Laboratuvarı Kurulumu Projesi	6	76.700,00 ₺	65.962,00 ₺
2016/68	Yrd.Doç.Dr.Servet YAPRAK	Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Laboratuvarı Makina Techizat Alım Projesi	6	65.490,00 ₺	64.109,40 ₺
2016/69	Yrd.Doç.Dr.Mithat ŞİMŞEK	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Lisans Programı İçin Konstrüksiyon ve İmalat Laboratuvarının Kurulması	9	98.057,76 ₺	8.968,00 ₺
2016/70	Doç.Dr.Fikri SOYSAL	Çalgı Projesi	6	60.312,16 ₺	39.955,98 ₺
2016/71	Yrd.Doç.Dr.Tolga KARACA	15. Yüzyılda Kullanılmış Olan 50 Makamın Analizi ve Bu makamlardan Oluşturulan Saz Semailerin Eğitime Katkısının Araştırılması	12	9.638,20 ₺	8.224,55 ₺
2016/72	Yrd.Doç.Dr.Mustafa BAYRAM	Zeytin Yaprağından Elde Edilen Ham Fenolik Ekstraktından Oleuropeinin Saflaştırılması, Oleuropeinin İnsanlarda Zehirlenme Ve Enfeksiyonlara, Bitkilerde Hastalıklara Neden Olan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Araştırılması	12	24.530,55 ₺	14.567,11 ₺
2016/73	Prof.Dr.Semiha Gülsüm KURT	Pentilentetrazol ile oluşturulan deneysel status epileptikus modelinde, parasetamolün beyin elektriksel aktivitesine olan etkisinde hipoterminin yeri	6	27.833,24 ₺	0,00 ₺

2016/74	Yrd.Doç.Dr.Hatice BALCI YÜCE	Diabetik ve Sağlıklı Dişeti Örneklerinin Doku Apoptoz Marker Seviyeleri Karşılaştırması ve Stereolojik Analizi	24	21.476,00 ₺	21.121,29 ₺
2016/75	Uzm. Dr.Alper BİÇER	Gözenekli Yapı Malzemesi / Faz Değişim Maddesi Formundaki Kompozitlerin Üretimi, Karakterizasyonu Ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi	16	15.000,00 ₺	9.070,66 ₺
2016/76	Doç.Dr.Murat SADIKOĞLU	Tenoksikam'ın Poli(P-Aminobenzen Sülfonik Asit)-Modifiye Camsı Karbon Elektrotta Hassas Tayini	8	17.394,58 ₺	8.451,87 ₺
2016/77	Prof.Dr.Yusuf YANAR	Tokat İlinde Biber Üretim Alanlarında Bakteriyel Yaprak Lekesi Hastalığı Etmeni (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria)'nin Tanınması, Epidemiyolojisi ve Bitki Büyüme Düzenleyici Rizobakteriler İle Biyolojik Mücadelesi	24	11.654,51 ₺	0,00 ₺
2016/78	Prof.Dr.Tekin ÖZTEKİN	Kestane Kabağında (Cucurbita Maxima Duch.) Kısmi Kök Kuruluğu Ve Su Stresine Bağlı Verim Ve Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi	24	10.762,26 ₺	0,00 ₺
2016/79	Yrd.Doç.Dr.Aydın TURAN	Otojen Kemik Greft Uygulamasında Yağ Greftinin Kemik İyileşmesi Üzerine Olan Etkisi: Deneysel Çalışma	5	12.000,00 ₺	1.520,00 ₺
2016/80	Yrd.Doç.Dr.Battal Tahsin SOMUK	Rekürren tonsilit ve Tonsil hipertrofisin'de doku ve serum matris mettaloproteinaz ve metalloproteinaz inhibitör düzeylerinin karşılaştırılması	12	12.000,00 ₺	11.129,40 ₺
2016/81	Doç.Dr.Ahmet FENERCİOĞLU	Buzdolabı Kompresöründe Kullanılan Bir Fazlı Asenkron Motorun Rotor Geometrisi Optimizasyonu	12	11.325,64 ₺	6.605,64 ₺
2016/82	Doç.Dr.İsa KARAMAN	Echinophora Tenifolia ve Chenopodium Botrys'un Esansiyel Yağlarının Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi	12	5.975,52 ₺	0,00 ₺
2016/83	Doç.Dr.İsa KARAMAN	Anadolu'da Yetişen Salep Orkidesi Tohumlarının İmmobilize Edilerek Çimlenebilir Hale Getirilmesi	12	5.996,76 ₺	0,00 ₺
2016/84	Doç.Dr.Bilge Hilal ÇADIRCI	Optogenetik Araç Olarak Lov Domain Proteininin Klonlanması	24	5.999,36 ₺	226,80 ₺
2016/85	Yrd.Doç.Dr.Ümran ÇİÇEK	Tokat İlinde Satışa Sunulan Köfte ve Dönerlerin Kimyasal ve Elisa Testi ile Serolojik Kalite Kriterlerinin Tespiti	12	0,00 ₺	0,00 ₺
2016/86	Yrd.Doç.Dr.Özlem EĞRİ	Lomber Disk Herniasyonlu Hastalarda TENS (Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu) ve Ultrason Uygulamalarının İdrar Kollajen Yıkım Ürünleri ve Serum Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi	6	5.520,84 ₺	4.548,17 ₺

2016/87	Yrd.Doç.Dr.Hakan POLATCI	Farklı Basınçlarda R404 Gaz Kullanan Bir Soğutucuda Maydanoz Ve Muz Muhafaza Performansının Belirlenmesi	18	4.733,90 ₺	0,00 ₺
2016/88	Doç.Dr.Şenay SARICA	Etlik Piliç Karma Yemlerinde Balık Unu Yerine Yağı Alınmış Un Kurdu Larva Ununun Kullanım Olanakları	12	5.451,41 ₺	0,00 ₺
2016/89	Yrd.Doç.Dr.Ali GÜL	Obez ve Fazla Kilolu Çocuklarda Böbrek Fonksiyon Bozukluğunun NGAL ve KIM-1 Molekülleriyle Araştırılması	11	8.864,64 ₺	4.121,28 ₺
2016/90	Prof.Dr.Köksal DEVECİ	Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubuyla Beslenen Sıçanlarda L-Karnitin Ve Trans-Şalkon'un Endoplazmik Retikulum Stres ,Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin Araştırılması	12	10.458,57 ₺	4.561,24 ₺
2016/91	Doç.Dr.Ahmet İNANIR	Yaşlı Bakım Programı Mesleki Beceri Laboratuvarı Kurulması	12	36.653,20 ₺	24.393,44 ₺
2016/92	Doç.Dr.Zekiye Ruken YÜKSEKKAYAÇELİKAYAY	PACS (Picture Archiving and Communication System) Yazılımı ve Sistem Odası Donanımlarının Kapasite Arttırımı	36	708.000,00 ₺	0,00 ₺
TOPLAM				2.718.386,42 ₺	978.208,70 ₺

Tablo 20: 2016 Yılı DPT Destekli Projeler Gerçekleşme Tablosu

(TL)

Proje Yöneticisi	Proje Adı	Başlanma ve Bitiş Süresi	Proje Bütçesi	2016 Yılı Harcaması
Prof.Dr. Yusuf YANAR	Gaziosmanpaşa Üniversitesi Temel ve Uygulamalı Bilimler Araştırma ve Geliştirme Merkez Laboratuvarı	2009-	9.407.000,00	92.170,83₺
TOPLAM			9.407.000,00	92.170,83 ₺

Tablo 21: TUBİTAK Destekli Projeler**(TL)**

Proje No	Proje Yöneticisi	Proje Adı	Başlanma ve Bitiş Süresi	Proje Bütçesi	2016 Yılı Harcaması
115Z880	Yrd. Doç. Dr. KIYMET BERKİL AKAR	Gözenekli Yüzeylerdeki Gizli Parmak İzlerinin Tespiti için Potansiyel Parmakizi Reaktifleri Olarak Yeni Sübstitüe-1,4-Naftakinonlar ve Sübstitüe-1,4-Antrakininonlar: Sentezi, Karakterizasyonu ve Optimizasyonu	15.01.2016 / 15.07.2017	90.238,00 ₺	43.753,02 ₺
215E141	Dr. YASEMİN ÇETİN KAYA	Bulut Bilişim Ve Yerel Sunucu Tabanlı Mobil Hesaplama Çerçeve Yazılımının Geliştirilmesi	1.05.2016 / 1.05.2018	93.808,00 ₺	27.324,00 ₺
215S692	Doç. Dr. HACI ÖMER ATEŞ	Pterijumlu Hastalarda Retinoik Asit Sinyal Yolağı İle İlişkili Genlerin Araştırılması	1.05.2016 / 1.11.2018	376.700,00 ₺	58.489,00 ₺
5150044	Yrd. Doç. Dr. ABDULLAH HAKAN YAVUZ	Gıda Sektörü İçin Güneş Enerjili Otomatik Ürün Yerleştirme Ve Boşaltma Sistemlerinin Tasarımı	1.01.2016 / 31.01.2017	565.390,00 ₺	429.032,07 ₺
TOPLAM					558.598,09 ₺

Kuruluş Adı : GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ		2016 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)																
Sektör Adı : Eğitim																		
Bim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2015 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Likit	Aktarma Mik.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
36479	439	2016H032360	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2016-2016	Tokat	0	100	0	0	0	100		0	0	0	28	
36480	439	1994H031280	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	1994-2018	Tokat	0	185.000	145.605	0	0	13.900	9.500	1.000	0	0	24.275	
36481	439	1994H031270	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	1994-2017	Tokat	0	70.000	64.923	0	0	4.000		0	0	0	3.020	
36482	439	2016H032370	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2016-2016	Tokat	0	5.000	0	0	0	5.000	35	0	0	0	4.469	
		2016H032380	Yayın Alımları	ÖZEL BÜTÇE	2016-2016	Tokat	0	1.000	0	0	0	1.000		0	0	0	937	
38206	439	1994H050110	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	1994-2017	Tokat	0	3.500	0	0	0	1.000		-1.000	0	0	0	
TOPLAM							0	264.600	210.528	0	0	25.000	9.535	0	0	0	32.728	
Sektör Adı : Sağlık																		
Bim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2015 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek << Özkaynak	Ödenek Toplam	+/-	Aktarma Mik.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
38460	439	2012I000330	Ek Bina İnşaatı	ÖZEL BÜTÇE	2012-2016	Tokat	0	50.635	47.635	0	0	3.000			0	0	974	
		2012I000330	Ek Bina Makine Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2015-2017	Tokat	0	15.000	3.738	0	0	9.000					9.000	
38460	439	2016I000220	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2016-2016	Tokat	0	8.000	0	0	0	8.000			0	0	1.612	
			Muhtelif İşler	DÖNER. SER.	2016-2016	Tokat	0	1.000	0	0	0	1.000			0	0	0	
TOPLAM							0	73.635	51.373	0	0	20.000	0	0	0	0	0	11.586
Sektör Adı : DKH																		
Bim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut. Toplam	2015 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	+/-	Aktarma Mik.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
37743	439	2016K120350	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2016-2016	Tokat	0	1.095	0	0	0	1.095	1.500	0	0	0	2.595	
TOPLAM							0	1.095	0	0	0	1.095	1.500	0	0	0	0	2.595

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE (KURUM GENEL YATIRIM TOPLAMI)													2016 Yılı Fiyatlarıyla, (Bin TL)			
Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme			
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		
Tarım	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Madencilik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
İmalat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enerji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ulaştırma.-Hab.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Turizm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Konut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eğitim	5	0	264.600	0	210.528	210.528	0	25.000	25.000	0	9.500	9.500	0	32.728	32.728	
Sağlık	2	0	73.635	0	51.373	51.373	0	20.000	20.000	0	0	0	0	11.586	11.586	
D.Kamu Hizm.	2	0	1.095	0	0	0	0	1.095	1.095	0	1.500	1.500	0	2.595	2.595	
<i>-İktisadi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>-Sosyal Rek.Bil.Arş.Proj.</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>1.095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.095</i>	<i>1.095</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>2.595</i>	<i>2.595</i>	
TOPLAM	9	0	339.330	0	261.901	261.901	0	46.095	46.095	0	11.000	11.000	0	46.908	46.908	
