



TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

2019 Yılı Yatırım Programı
İzleme ve Değerlendirme Raporu




**2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve
Değerlendirme Raporu**

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

www.gop.edu.tr

strateji@gop.edu.tr

TOKAT

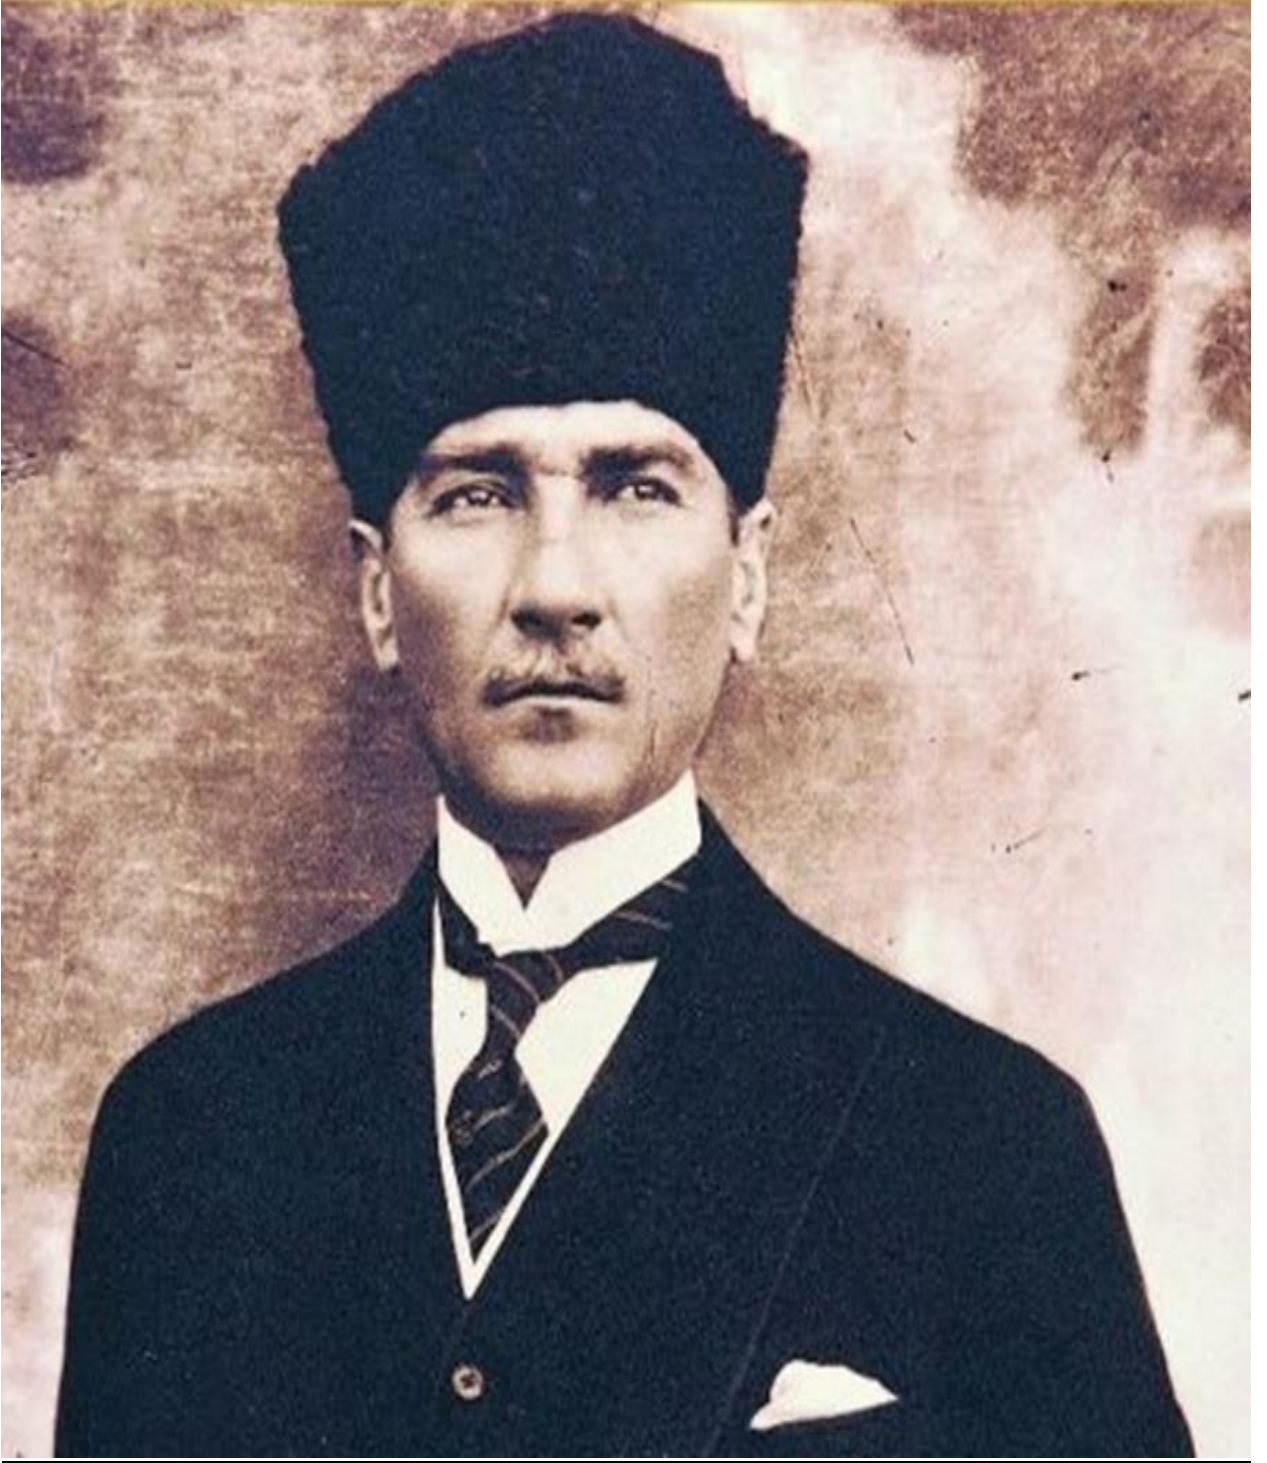

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, iktisadi zaferler ile taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.

K. Atatürk



Kamu mali yönetiminde değişiklik yapan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin ve mali yönetimde görevli yöneticilerin kamu kaynaklarının elde edilmesi, yönetimi ve kullanılmasında yürüttükleri faaliyetler ile iş ve işlemleri nedeniyle hiyerarşik üstlerine, denetim ve değerlendirme yapmakla görevli kuruluşlar ile kamuoyuna hesap ve bilgi verme sorumluluğu getirmiştir.

Üniversitemiz, 1992 yılında 3837 sayılı kanunla kurulmuş olup, Taşlıçiftlik, Ali Şevki Erek ve ilçe yerleşkelerinde kurulduğu günden itibaren çağdaş, dinamik, paylaşımcı, bilgi ve teknoloji üreten, bölgenin, sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayan ve öncülük eden bir yapıya sahip olmakla birlikte fiziki altyapı yatırımlarını da arttırarak eğitim öğretim kalitesini günden güne yükseltmiş, adının ülkemizin saygın eğitim kurumlarının arasında yer almasını sağlamıştır.

Kamu yatırımları içinde üniversitelere ayrılan payda eğitim, sağlık ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli bir yer edinen Üniversitemize 2019 yılı yatırımları için 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 34.649.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 1.945.000,00 TL ekleme işlemi ile toplam 36.594.000,00 TL'ye çıkmıştır.

Başlangıç ödeneğinin % 57,72 sini Eğitim-Yükseköğretim Sektörü, % 39,83 ünü Sağlık Sektörü ve % 2,45 ini de Teknolojik Araştırma Sektöründe makine-teçhizat, mal ve malzeme alımları oluşturmaktadır.

2019 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, geniş bir alanda faaliyet gösteren ve etkinlikleri büyük bir çeşitlilik arz eden Üniversitemizin kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN
Rektör

İÇİNDEKİLER

1- Genel Değerlendirme	1
1.1 Kuruluşun Yatırımları Finansman Kaynakları.....	1
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi.....	1
1.3 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	10
1.4 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları	11
2- 2019 Yılı Proje Uygulamaları	12
2.1 Devam Eden Projeler.....	12
2.1.1. Kampüs Altyapısı Projesi.....	12
2.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	18
2.2 Tamamlanan Projeler.....	21
2.2.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	21
2.2.2. Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi	21
2.2.3. Yayın Alımları Projesi	36
2.2.4. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi	37
2.2.5. Teknolojik Araştırma Sektörü	42
2.2.5.1 Bilimsel Araştırma Projeleri	42
3- 2019 Yılı Kamu Yatırımları Özeti	47

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Kuruluşun Yatırımları Finansman Kaynakları :

2019 Yılı Finansman Kaynakları:

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Araştırma Projeleri Gelirleri Payı

2) Eğitim Öğretim Gelirleri(Örgün ve İkinci Öğretim, Yaz Okulu, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora, Uzaktan Eğitim, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri)

3) Mevduat Faizleri

4) Öğrenci Sosyal Hizmet Gelirleri

5) Taşınmazlardan Elde Edilen Gelirler (Lojman Kira, Diğer Kira ve Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri.)

c) Döner Sermaye Gelirleri

B) Bütçe Dışı Kaynak

a) Şartlı Bağışlar

b) TÜBİTAK

c) Farabi, Erasmus, Mevlana


Tablo1: Sektörel Bazda Yatırımların Dağılımı

TL

Sektörler	2019 KBÖ	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama
Eğitim-Yükseköğretim Sektörü	20.000.000,00	21.945.000,00	21.556.048,22
Sağlık Sektörü	13.800.000,00	13.800.000,00	12.158.634,77
Teknolojik Araştırmalar Sektörü	849.000,00	849.000,00	849.000,00
TOPLAM	34.649.000,00	36.594.000,00	34.563.682,99



1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi


Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Sağlık ve Teknolojik Araştırmalar olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır. Eğitim-Yükseköğretim sektöründe 5, Sağlık Sektöründe 1, Teknolojik Araştırmalar Sektöründe ise 1 adet proje yer almaktadır.

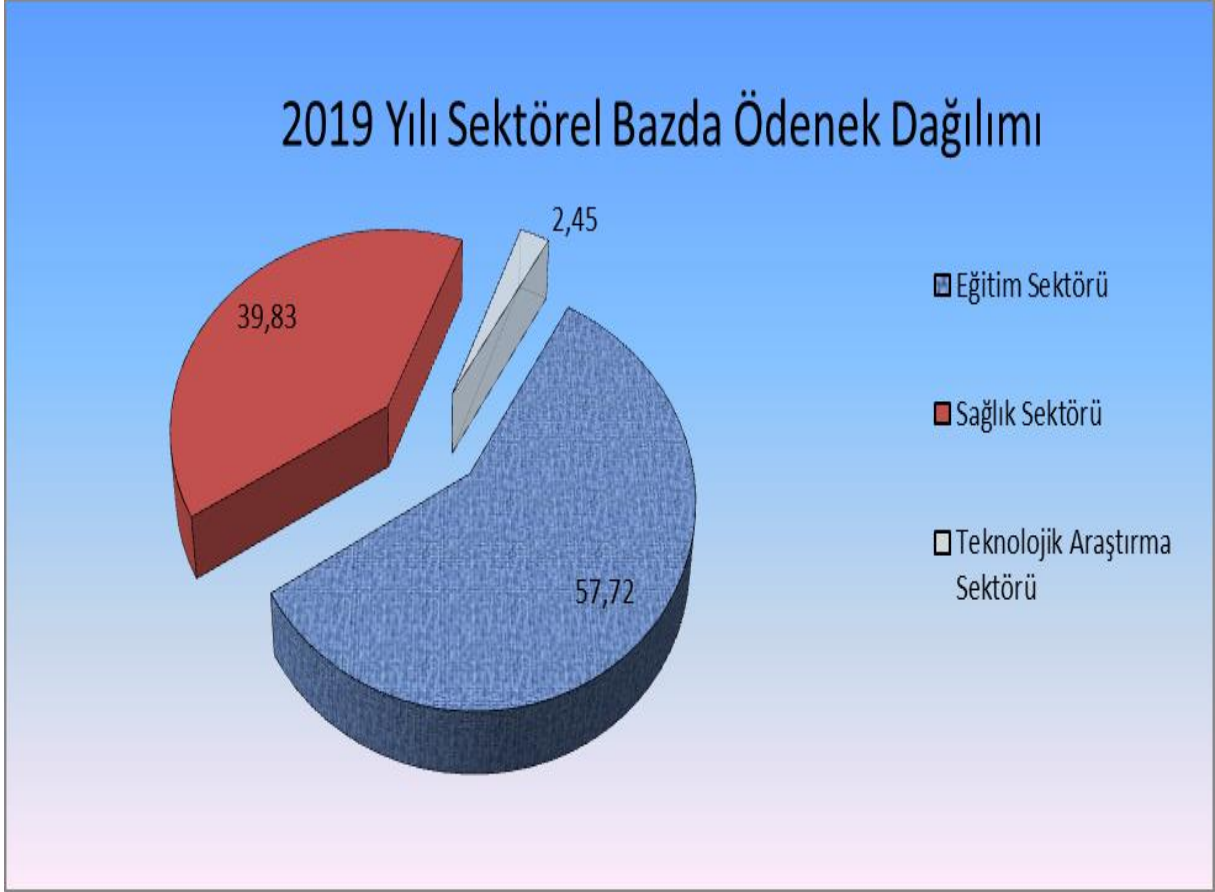

Yıllar İtibariyle Sektör Bazında Başlangıç Ödenek Miktarları



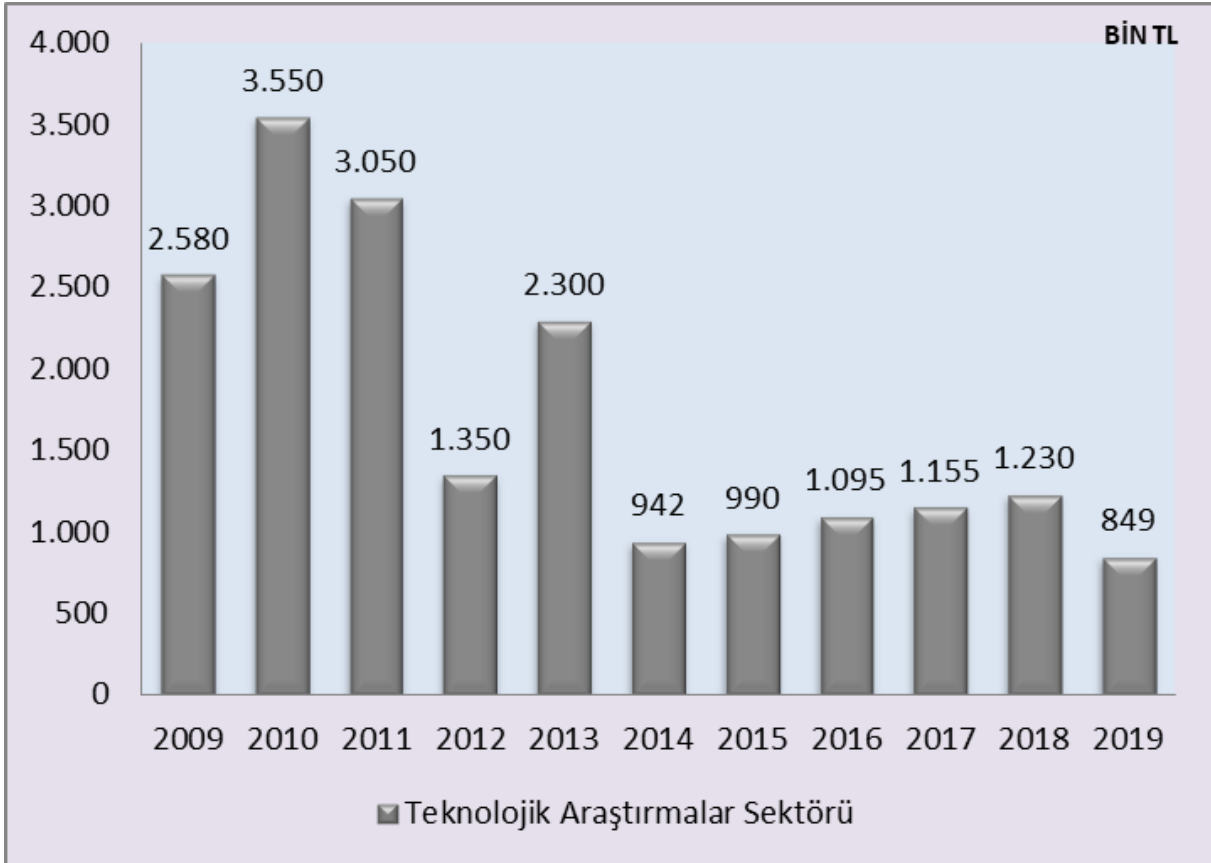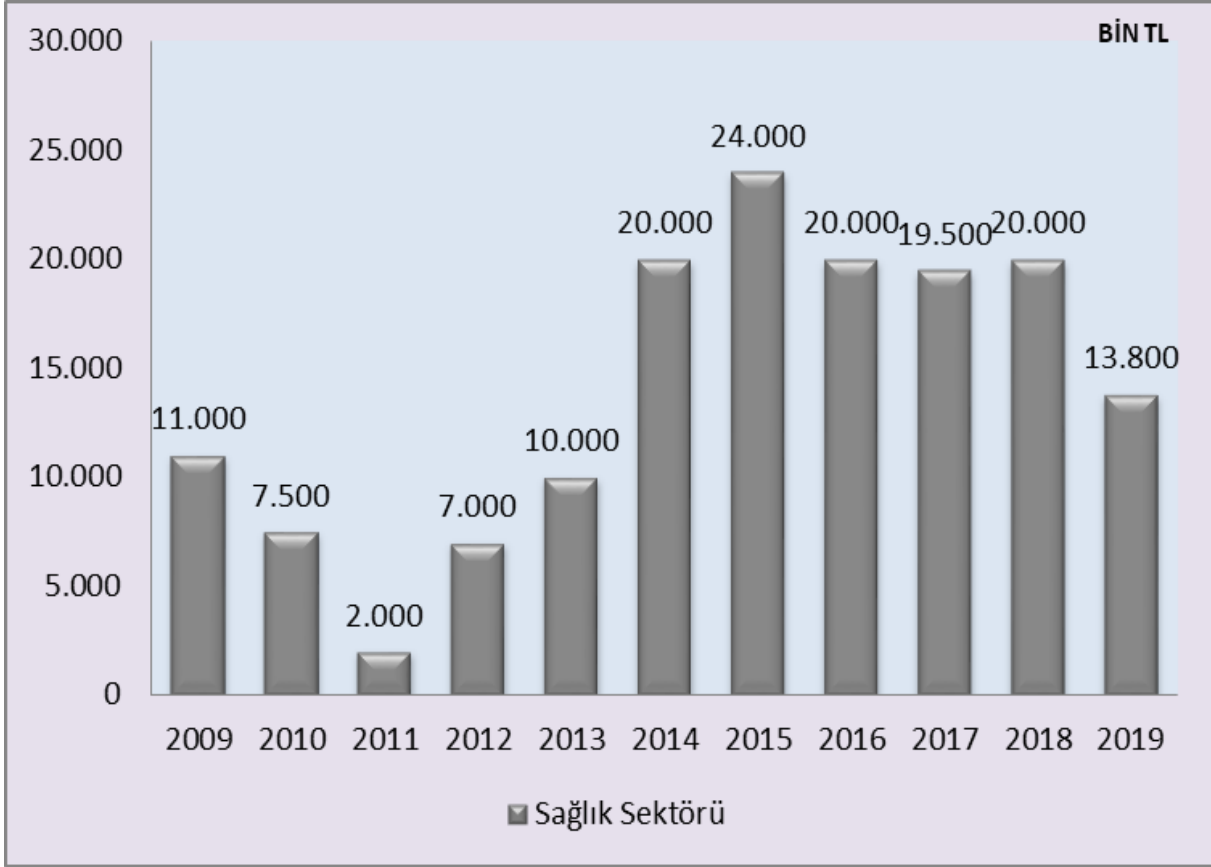

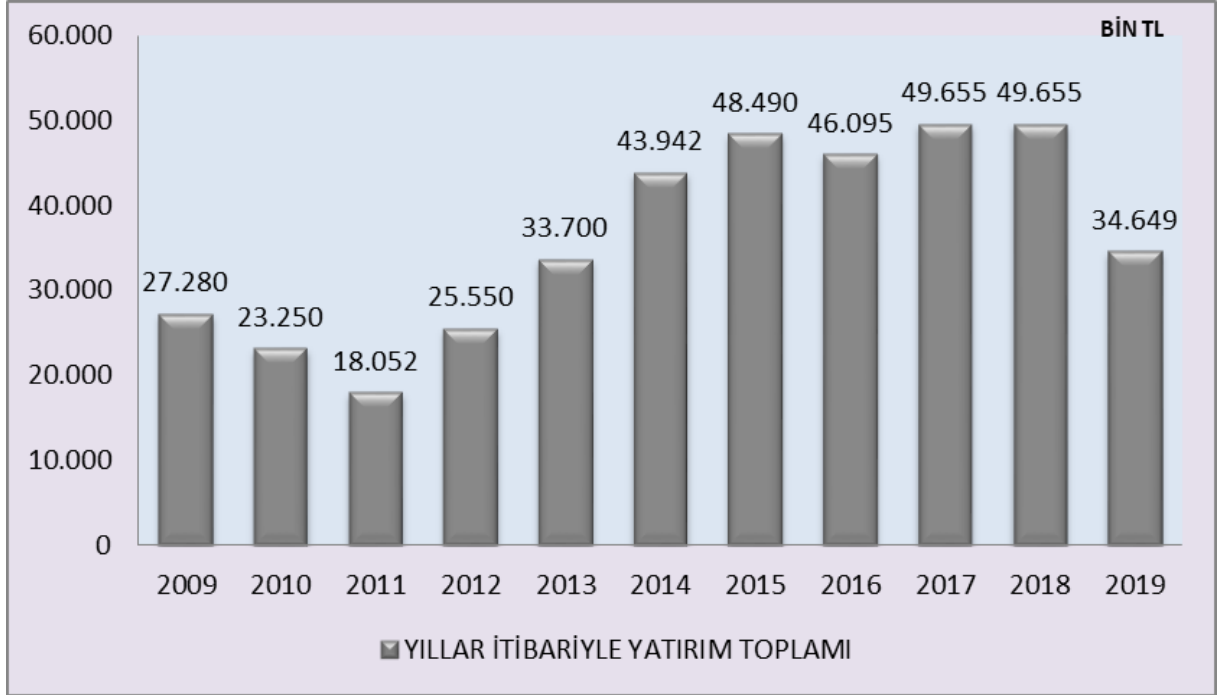


2019 Yılı Yatırım Projelerinin başlangıç ödenekleri, yıl içerisinde yapılan yedekten aktarmaların ve likitten eklemelerin miktarları, toplam ödenek tutarı ve bu projelere yapılan toplam harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Projelere İlişkin Genel Tablo

TL

Sektörler	Proje Adı	2019 KBÖ	Ekleme-Aktarma	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcanan	Toplam Ödenek Harcama Oranı (%)
Eğitim Yükseköğretim Sektörü	Muhtelif İşler	7.900.000*	1.740.000	70.000	9.570.000	9.304.711,60	97,23
	Eğitim Yayın Alımları	1.100.000	200.000		1.300.000	1.193.146,07	91,78
	Kampüs Altyapısı	3.600.000			3.600.000	3.057.804,81	84,94
	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000			100.000	0,00	0,00
	Derslik ve Merkezi Birimler	7.300.000			7.300.000	7.925.482,39	108,57
	Kamulaştırma	0,0	75.000		75.000	74.903,35	99,87
Sağlık Sektörü	Muhtelif İşler	13.800.000	190.000	190.000	13.800.000	12.158.634,77	88,11
Teknolojik Araştırma	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	849.000			849.000	849.000,0	100,0
T O P L A M		34.649.000	2.205.000	260.000	36.524.000	34.563.682,99	94,63

*Ödeneğin 470.000,00-TL'si öz gelirden karşılanmıştır.

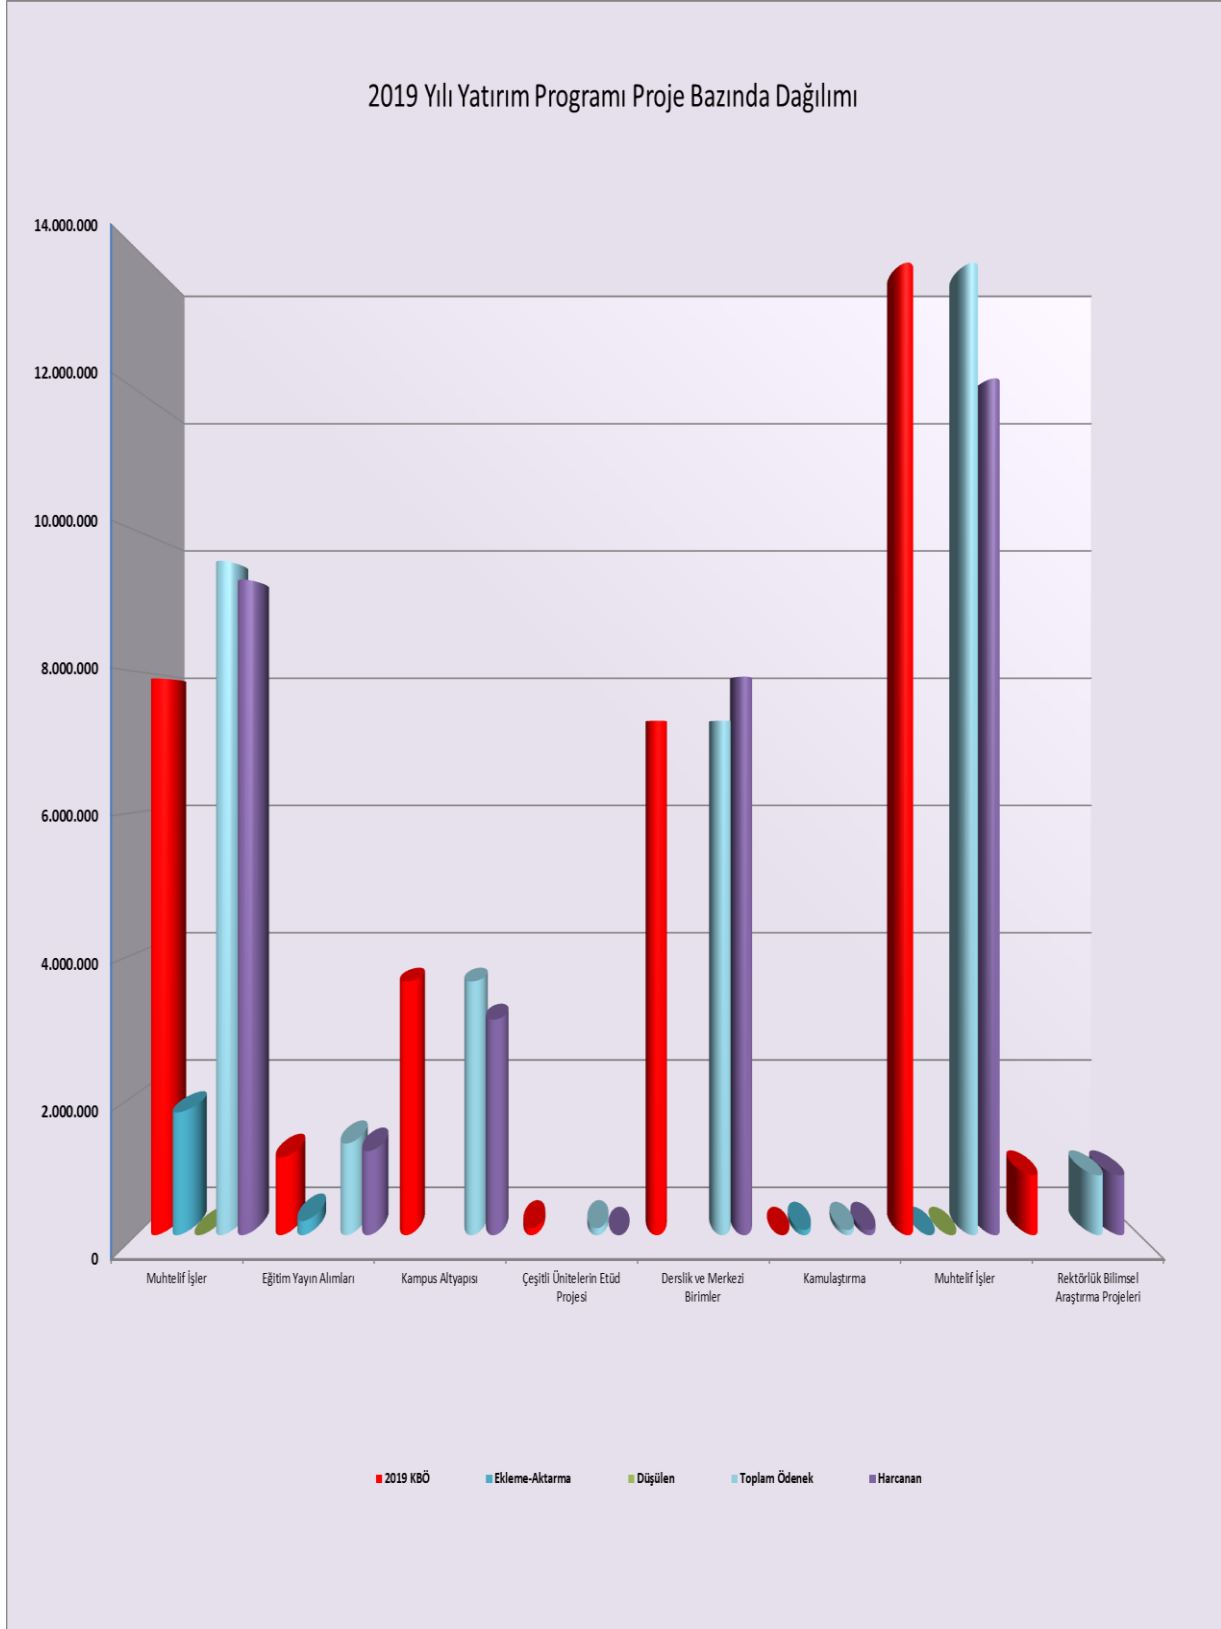

Tablo 3: 2019 Yılı Ödenek Durumu Sektör-Proje Bazında

Sektörü : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM (Bin TL)				
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2019 Yılı Başlangıç Ödenegi
SEKTÖR TOPLAMI			124.404	20.000
A)Etüd-Proje İşleri Toplamı			100	100
2019H031710	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2019-2019	100	100
B)Devam Eden Projeler Toplamı			115.304	10.900
1994H031270	Kampüs Altyapısı	1994-2021	98.040	3.600
1994H031280	Derslik ve Merkezi Birimler	1994-2020	17.264	7.300
	Pazar Meslek Yüksekokulu Binası	2017-2020	17.264	7.300
C)Yeni Projeler Toplamı			9.000	9.000
2019H030840	Yayın Alımı	2019-2019	1.100	1.100
2019H031730	Muhtelif İşler	2019-2019	7.900	7.900
Sektörü : SAĞLIK (Bin TL)				
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2019 Yılı Başlangıç Ödenegi
SEKTÖR TOPLAMI			14.100	14.100
C)Yeni Projeler Toplamı			14.100	14.100
2019I000700	Muhtelif İşler	2019-2019	13.800	13.800
	Döner Sermaye		300	300
Sektörü : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR (Bin TL)				
Proje No	Proje Adı	Başl. Bit. Yılı	Proje Maliyeti	2019 Yılı Başlangıç Ödenegi
SEKTÖR TOPLAMI			849	849
C)Yeni Projeler Toplamı			849	849
2019K120610	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2019-2019	849	849
ÜNİVERSİTE TOPLAMI			139.353	34.949

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mevcut Taşınmazlar ve Kapalı Mekanlar

Tablo 4: Fiziki Alanlar

m²

BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m ²)									
	İDARİ BİRİMLER	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR			SİRKÜLASYON ALANI	SPOR ALANLARI		TOPLAM (m ²)
		DERSLİK	LABORATUVAR	KANTİN KAFETERYA	LOJMAN	YURTLAR		Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	
Mühendislik ve Doğa Bilim.Fak.	10.774	1.140	1.520	90	0	0	6.980	0	0	20.504
Ziraat Fakültesi	13.525	938	1.680	197	0	0	0	0	0	16.340
İç su balıkçılık tesisleri	0	0	263	0	0	0	0	0	0	263
Arıcılık Geliştirme	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80
Fırın	0	0	190	0	0	0	0	0	0	190
Koyunculuk Geliştirme	0	0	864	0	0	0	0	0	0	864
Koyunculuk samanlık	0	0	225	0	0	0	0	0	0	225
Tavukçuluk Geliştirme (Kümes)	0	0	730	0	0	0	0	0	0	730
Doğal Boyalar,Ar-ge	0	0	604	0	0	0	0	0	0	604

Bahçe Bitkileri Uyg ön Haz.Lab.	0	0	110	0	0	0	0	0	0	110
Tarımsal Ar.veUyg.Merk.Ek Bina	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84
Eğitim Fakültesi	2.600	2.948	942	170	0	0	8.882	493	0	15.542
Eğitim Fakültesi Müzik Binası	130	1400	0	0	0	0	0	0	0	1.530
İlahiyat Fakültesi (yeni bina)	2552	4347	328	328	0	0	9093	0	0	16.648
Fen-Edebiyat Fakültesi	10.315	2.375	3.353	405	0	0	0	0	0	16.448
Hukuk Fakültesi	9.982	390	165	189	0	0	0	0	0	10.726
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	3.203	3.860	360	240	0	0	2.487	0	0	10.150
Tokat Sağlık Bilimleri Fakültesi	450	820	135		0	0	795	0	0	2.200
Tokat Beden Eğt.Spor Yük.Ok.	670	650	80	62	0	0	738	0	830	3.030
Tokat Teknik Bilimler M.Y.O.	3.203	3.860	360	240	0	0	2.487	0	0	10.150
Tokat Sosyal Bilimler M.Y.O.										
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	250	80	1.350	0	0	0	1.000	0	0	4.200
Tokat Sağlık Bilimleri Fakültesi	1.670	1.884	1298	128	0	0	6.731	0	0	11.711
Şehit Ömer HalisdemirKonferans Sal.	2.001	0	0	0	0	0	0	0	0	2.001
15Temmuz Kongre ve Kültür Merk.	5.877	3.154	0	212			2.852			12.095
Merkezi Kütüphane	3.470	0	0	0	0	0	0	0	0	3.470
Kapalı Yüzme Havuzu	153	30	0	104	0	0	2.139	0	1.646	4.072
Kapalı Spor Salonu	0	0	0	0	0	0	0	0	3.275	3.275
Açık Spor Tesisleri	0	0	0	0	0	0	0	23.670,52	1.940	1.940
Merkezi Kafeterya	2952	0	0	2.098	0	0	0	0	0	5.050
Merkezi Yemekhane	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
Eğitim Fakültesi Öğrenci Kantini	0	0	0	485	0	0	0	0	0	485
Rektörlük	4.950	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950
Konukevi	1.350	0	0	295	0	0	405	0	0	2.390
Isı Mekezi	2.050	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050
Eski Atölye	440		0	0	0	0	0	0	0	440
Ayniyat,Şoför Binası	514	0	0	0	0	0	0	0	0	514
Kampüs lojmanları	0	0	0	0	1.656	0	304	0	0	1.960
Depo	1.000									1.000
Atölye	1.000									1.000
Ziraat Fak.Tarımsal Uygulama binası-1	1.000									1.000
Ziraat Fak.Tarımsal Uygulama binası-2	1.000									1.000
Isı Mekezi+ambar+ayniyat	1.000									1.000
Çevre Düzenleme birimi+nizamiye	623									623
Sağlık Araş.Uyg.Merkezi depo	11.842	0	0	970	0	0	0	0	0	12.812
Sağlık Araş.Uyg.Merkezi Poliklinik Binası+yoğun bakım+acil	22.146	0	0	0	0	0	0	0	0	22.146
600 Yataklı Hastane C Blok	32.000									32.000
Radyasyon Onkoloji	2.085									2.085

Binası+Palyatif Bakım Merkezi											
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	605,13	899,85	2.071,00	303,08	0	0	4.889,8 2	0	0	14.144	
Dişhekimliği Fakültesi								0	0	2.100	
Sağlık Kampüsü Derslik Binası	354,00	681,00	204,00	0,00	0,00	0,00	1.298,0 0	0	0	2.537	
Ali Şevki Erek Yerleşkesi Isı Merkezi	577	0	0	0	0	0	0	0	0	577	
Sağlık Kampüsü Katlı kapalı otopark	4.475									4.475	
Sürekli Eğitim Merkezi	485									485	
Meydan lojmanları	0	0	0	0	1.093	0	626	0	0	1.719	
Fidanlık lojmanları	0	0	0	0	2.360	0	840	0	0	3.200	
Zile Dinçerler Tur.veOtel.Yük.Ok.	2.351	620	0	606	0	2.400	1.656	510	0	7.607	
Zile Meslek Yüksekokulu	1.116	1.200	135	385	0	0	1.314		0	4.150	
Turhal Meslek Yüksekokulu	2.300	3.000		875	0	0	0	0	0	6.175	
Turhal Sağlık Hizmetleri MYO											
Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu	842	2.130	216	190	0	0	2.682	0	0	6.060	
Niksar Uygulamalı Bilimler Y.O.	2425	2039	200	140	0	0	2.757	2.010	0	7.561	
Niksar Teknik Bilimler M.Y.O	1.116	1.200	135	385	0	0	1.314		0	4.150	
Niksar Sosyal Bilimler M.Y.O											
Erbaa Meslek Yüksekokulu	3.461	3.084	222	1.395	0	0	5.578	0	0	13.740	
Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO											
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	485	402	76	151	0	0	418	0	0	1.532	
Reşadiye Meslek Yüksekokulu Yeni Bina	2750	1541	200	703	0	0	2.158	0	0	7.352	
Almus Meslek Yüksekokulu	1.034	1.528	470	430	0	0	1.038	510	0	4.500	
Artova Meslek Yüksekokulu	423	1.016	135	94	0	0	1.304	510		2.972	
Pazar Meslek Yüksekokulu	720	458	71	24	0	0	633	0	0	1.906	
GENEL TOPLAM	182.380	47.675	18.772	16.394	5.109	2.400	73.398	27.703	7.691	363.129	

Tablo 5: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (m²)

Yerleşke Adı	Mülkiyet Duruma göre Taşınmaz alanı(m2)			Toplam (m2)
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	
Taşlıçiftlik Yerleşkesi	1.147.815,05	300.744,04	0,00	1.448.559,09
Ali Şevki Erekerleşkesi	0,00	83.583,31	0,00	83.583,31
Lojmanlar	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00
Turhal Yerleşkesi	0,00	112.265,97	0,00	112.265,97
Zile Yerleşkesi	111.524,45	33.358,93	0,00	144.883,38
Erbaa Yerleşkesi	21.609,41	0,00	0,00	21.609,41
Niksar Yerleşkesi	1.437,34	819.064,00	0,00	820.501,34
Reşadiye MYO	3.257,85	0,00	4.319,15	7.577,00
Almus MYO	0,00	31.843,00	0,00	31.843,00
Artova MYO	0,00	0,00	14.351,64	14.351,64
Pazar MYO	0,00	0,00	7.410,31	7.410,31
TOPLAM	1.288.983,10	1.380.859,25	26.081,10	2.695.923,45

Tablo 6: Devam Eden Yıllara Yaygın Kapalı Alanlar (m²)

BİRİMLER	DEVAM EDEN VE YILLARA YAYGIN FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m2)									
	İDARİ BİRİMLER	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR			SİRKÜLASYON ALANI	SPOR ALANLARI		TOPLAM (m2)
		DERSLİK	LABORATUVAR	KANTİN KAFETERYA	LOJMAN	YURTLAR		Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	
Pazar Meslek Yüksekokulu	1943	1454	353	293	0	0	2.752			6.795

Tablo 7: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı (m²)

Yerleşke Adı	Mülkiyet Duruma göre Taşınmaz alanı(m2)			Toplam (m2)
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	
Taşlıçiftlik Yerleşkesi	1.147.815,05	300.744,04	0,00	1.448.559,09
Ali Şevki Erekerleşkesi	0,00	83.583,31	0,00	83.583,31
Lojmanlar	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00
Turhal Yerleşkesi	0,00	112.265,97	0,00	112.265,97
Zile Yerleşkesi	111.524,45	33.358,93	0,00	144.883,38
Erbaa Yerleşkesi	21.609,41	0,00	0,00	21.609,41
Niksar Yerleşkesi	1.437,34	819.064,00	0,00	820.501,34
Reşadiye MYO	3.257,85	0,00	4.319,15	7.577,00
Almus MYO	0,00	31.843,00	0,00	31.843,00
Artova MYO	0,00	0,00	14.351,64	14.351,64
Pazar MYO	0,00	0,00	7.410,31	7.410,31
TOPLAM	1.288.983,10	1.380.859,25	26.081,10	2.695.923,45

Tablo 8: Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

(m²)

Hizmet alanı	Taşlıçiftlik Yerleşkesi	Şehir Merkezi	İlçeler	Toplam(m2)
Eğitim	142.329	19.266	67.705	229.300
Sağlık		69.043		69.043
Beslenme	10.035			10.035
Kültür	17.566			17.566
Spor	9.287			9.287
Diğer(idari,tesis,depo)	17.927	9.971		27.898
TOPLAM	197.144	98.280	67.705	363.129

Tablo 9: Lojmanların Dağılımı

(m²)

Birim Adı	Daire Sayısı (Adet)	Alan (m ²)	Boş Daire (Adet)
Fidanlık Lojmanları	20	3.200	0
Meydan lojmanları	9	1.719	1
Taşlıçiftlik Yerleşkesi Lojmanları	16	1.960	4
Toplam	45	6.879	5

1.3 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2019 yılı içinde Üniversitemiz tarafından “Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası ve İlahiyat Fakültesi Uygulama Binası Etüd – Proje işi”, “Kampüs Mekanik Tesisat İşİ”, “Taşlıçiftlik Kampüsü İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşİ”, “Kampüs Ahşap Kamelya, Durak, Ahşap Bank ve Çevre Düzenleme İşİ”, “Otopark ve Otobüs Durağı Cep Yapılması İşİ”, “Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2019 Yılı Büyük Onarım İnşaatı”, “Rektörlük Binası ve Merkezi Kütüphane Asansör Yapımı İşİ”, “Araştırma ve Uygulama Hastanesi VRF Tesisatı İşİ” ihaleleri yapılmıştır.

“Kampüs Mekanik Tesisat İşİ”, “Taşlıçiftlik Kampüsü İçme ve Kullanma Suyu Sondaj İşİ”, “Kampüs Ahşap Kamelya, Durak, Ahşap Bank ve Çevre Düzenleme İşİ”, “Otopark ve Otobüs Durağı Cep Yapılması İşİ”, “Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2019 Yılı Büyük Onarım İnşaatı”, “Rektörlük Binası ve Merkezi Kütüphane Asansör Yapımı İşİ”, “Araştırma ve Uygulama Hastanesi VRF Tesisatı İşİ” işleri tamamlanmıştır.

“Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası ve İlahiyat Fakültesi Uygulama Binası Etüd – Proje işi” ile yapımına 2018 yılında başlanan “Pazar Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı” devam etmektedir.

2019 yılı içinde kapalı alan toplam 363.129 m²'ye, düzenlenmiş açık alan (açık spor sahaları, yol, yaya yolu, otopark, yürüyüş yolu vb.) 126.921 m²'ye, bakım onarım ve yenileme yapılan iş sayısı 119'a, Taşlıçiftlik Kampüsü için temiz su sağlayan kuyu sayımız 3'e ulaşmıştır.

1.4 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemiz tarafından yapılan projelere ait 2019 Yılı Yatırım Programı başlangıç ödeneği olarak 34.649.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. 1.945.000,00-TL likit karşılığı ödenek eklemesi, 260.000,00-TL birimler arası ödenek aktarması yapılarak toplam ödenek 36.594.000,00-TL olmuştur.

Yıl içinde; Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesine 1.670.000,00- TL, Yayın Alımı Projesi için 200.000,00-TL ve kamulaştırma işi için 75.000,00-TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

2019 yılı içinde; 34.563.682,99-TL harcama yapılmıştır.

Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik araştırmalar sektörlerinde önemli yatırım projeleri gerçekleştirmektedir. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun mali ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gerekmektedir.

Üniversitemiz her geçen yıl değişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların arttırılması konusunda üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel araştırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkının arttırılması anlamına gelecektir. Mevcut binalarda fiziki engellilere ait onarım işleri ile diğer bakım ve onarım işleri kısıtlı olarak yapılabilmektedir. Daha iyi

hizmet verebilmek, bakım ve onarım işleri için daha fazla ödeneye ihtiyaç vardır. Üniversite Taşlıçiftlik ve şehir yerleşkeleri alan olarak yetersiz olup, genişletilebilmesi için kamulaştırma ödeneklerinin verilmesi gerekmektedir.

2- 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1. 1994H031270 Kampüs Altyapısı (DOKAP)

Proje No:	1994H031270
Sektör	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Kampüs Altyapısı (DOKAP) Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	1994-2021

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
98.040.000,00	3.600.000,00	-526.000	3.074.000	3.057.805	84,94	90.297.805,00

Açıklama: 2019 yılı başlangıç ödeneği 3.600.000,00-TL olup; 3.057.805,00-TL harcama yapılmıştır.


Bu proje kapsamında;

a) Kampüs Mekanik Tesisat işi için 2019 yılı içinde 1.423.510,79-TL harcama yapılmış olup, Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezinde kızgın su pompa montaj imalatları, kollektör imalatları, brülör montaj imalatları, galeri hattı kompensatör ve vana değişimi işleri, eşanjör daireleri mekanik tesisat işleri ile Sağlık Kampüsü Araştırma ve Uygulama Hastanesi C blok eşanjör dairesinde boyler hattı eşanjör imalatı, kullanım sıcak su kollektör ve pompa grubu imalatları, Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi genişleme tankı platform imalatı tamamlanmıştır. Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi genişleme tankı imalatı devam etmektedir. 2019 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleşme %63 olmuştur.



b) Taşlıçiftlik Kampüsü İçme ve Kullanma Suyu Sondaj işi için 2019 yılı içinde 203.450,67-TL harcama yapılmış olup, Su kuyusu sondaj işi, kuyu binası, mekanik ve elektrik tesisat işleri tamamlanmış ve geçici kabul işlemi yapılmıştır.



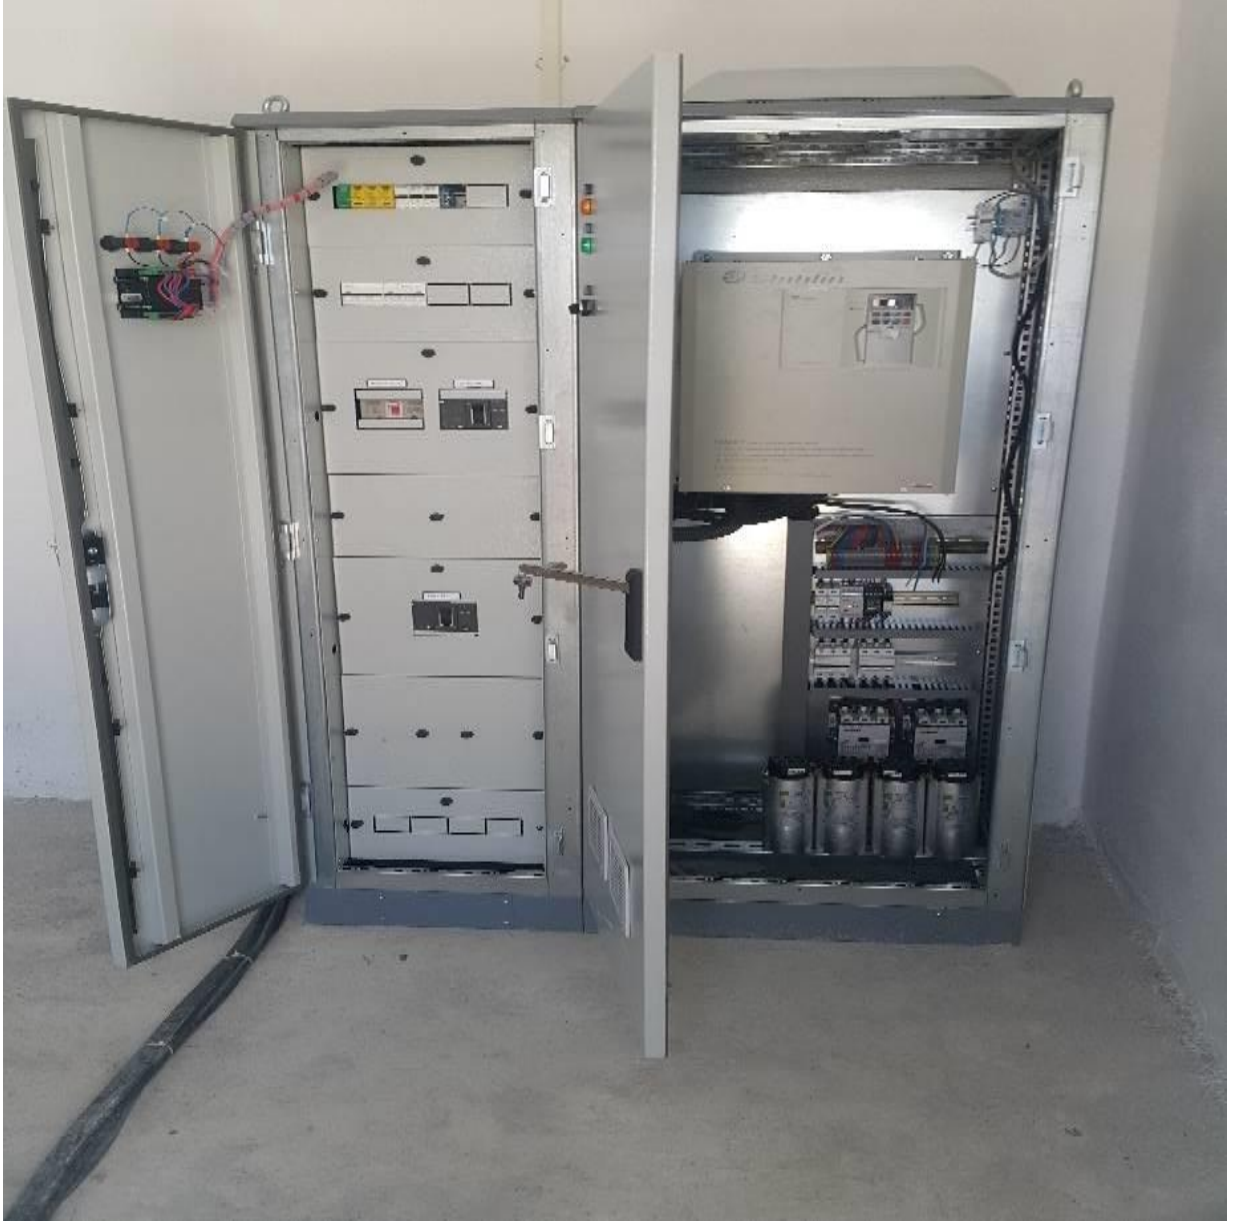

c) Kampüs Ahşap, Kamelya, Durak, Ahşap Bank ve Çevre Düzenleme işi için 2019 yılı içinde 841.824,81-TL harcama yapılmış olup; Taşlıçiftlik Kampüsü, Sağlık Kampüsü ve ilçelerdeki yerleşkelerde kullanılmak üzere toplam 160 adet bank, 75 adet kamelya, 24 adet durak ve bunlara ait yürüyüş yolları ve çevre düzenleme imalatları yaptırılmıştır. İş tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır. 2019 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleştirme %100 olmuştur.





d) Otopark ve Otobüs Durağı Cep Yapılması işi için 2019 yılı içinde 589.018,52-TL harcama yapılmış olup; Merkezi Kütüphane üstü otopark imalatı ve Taşlıçiftlik Kampüsü nizamiye önü otobüs durağı ve cep imalatı işleri tamamlamış olup, iş geçici kabul aşamasındadır. 2019 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleşme %100 olmuştur.



2.1.2 1994H031280 Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)

Proje No:	1994H031280
Sektör	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) (6.795 m ²) Pazar Meslek Yüksekokulu Binası (DOKAP) (6.795 m ²)
Proje Yeri	Tokat Merkez, Pazar
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	1994-2020

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
17.264.000,00	7.300.000,00	626.000,00	7.926.000,00	7.925.482,39	108,57	11.764.000,00

Açıklama: 2019 yılı başlangıç ödeneği 7.300.000,00-TL olup; yıl içinde Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinden 100.00,00-TL, Kampüs Altyapısı projesinden 525.000,00-TL olmak üzere toplam 625.000,00-TL ödenek aktarması yapılmış olup; 7.925.482,39-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamındaki alt projeler:

a) Pazar Meslek Yüksekokulu

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
17.264.000,00	7.300.000,00	626.000,00	7.926.000,00	7.925.482,00	108,57	11.764.000,00

Açıklama: 2019 yılı başlangıç ödeneği 7.300.000,00-TL olup; yıl içinde Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinden 100.00,00-TL, Kampüs Altyapısı projesinden 525.000,00-TL olmak üzere toplam 625.000,00-TL ödenek aktarması yapılmış olup; 7.925.482,39-TL harcama yapılmıştır. Kaba inşaat döşeme kolon, giriş, kalıp demir imalatları, 1., 2. ve 3. kat tuğla duvar imalatları, çatı imalatı, bodrum, zemin, 1., 2. ve 3.kat kaba sıva ve alçı sıva imalatları, dış cephe sıva ve mantolama işleri, kapı ve pencere kör kasa işleri, alüminyum doğrama işleri

tamamlanmıştır. Mekanik tesisat ve elektrik tesisat işleri, dış cephe mekanik montaj imalatları devam etmektedir. 2019 yılı içinde fiziki gelişme % 47 artarak toplam fiziki gerçekleşme % 77 olmuştur.





2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. 2019H031710 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Proje No:	2019H031710
Sektör	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje İşi
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2019-2019

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0

Açıklama: 2019 yılı başlangıç ödeneği 100.000,00-TL olup; harcama yapılmamış, yıl içinde Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında yaptırılan Pazar Meslek Yüksekokulu Bina İnşaatı için ihtiyaç duyulması sebebi ile 100.000,00-TL aktarılmıştır.

Bu proje kapsamında; Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası ile İlahiyat Fakültesi Uygulama Binası etüd Proje Hizmet Alımı ihale edilmiş, bu iş kapsamında avan projeler, zemin etütleri tamamlanmış, mimari proje çalışmaları devam etmektedir.

2.2.2. 2019H031730 Eğitim Sektörü Muhtelif İşler (DOKAP)

Muhtelif İşler projesi makine-teçhizat alımları ve bakım onarım giderleri kurumumuzda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, bu kapsamda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 3.059.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca 70.000-TL likit karşılığı ödenek eklenmesi yapılmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına büyük onarım giderleri için 4.000.000,00-TL ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Bilgi Teknoloji için 400.000,00-TL, makine-teçhizat alımları için 365.000,00-TL, bakım onarım giderleri için 76.000,00-TL, toplamda 841.000,00-TL olmak üzere Muhtelif İşler işi için 4.841.000,00-TL ödenek verilmiştir. Her birinin detaylı harcama tutarları aşağıda yer almaktadır.

Tablo 10: 2019 Yılı Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Birim Harcamaları

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.119.684,19
Makine Teçhizat Alımları	2.699.759,05
Makine Teçhizat Bakım Onarım	284.925,29
Makine Teçhizat Alımları (Öz Gelir)	134.999,85
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2.225.085,41
Bilgisayar Alımları	1.699.591,30
Yazılım Alımları	389.165,16
Yedek Parça Alımları	76.000,00
Bilgisayar Alımları (Öz Gelir)	60.328,95
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	3.959.942,00
Büyük Onarım Giderleri	3.770.454,06
Makine Teçhizat Bakım Onarım	189.487,94

Büyük Onarım

Proje No:	2019H031730
Sektör	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Bakım Onarım
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2019-2019

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
4.000.000 *	4.000.000,00			3.770.454,06	94,26	3.770.454,06

* Bu proje kapsamında Büyük Onarım ödeneği ve bilgileri değerlendirilmiştir. Ödeneğin 270.000,00-TL'si öz gelirlere karşılanmıştır.

Açıklama: 2019 yılı başlangıç ödeneği 4.000.000,00-TL (270.000,00-TL'si özel gelirlere karşılanmak üzere) olup; 3.770.454,06-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında;

- a) Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2019 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi içinde 1.842.746,21-TL harcama yapılmış olup; Konservatuvar binası akustik oda yapımı, Müzik Binası bay ve bayan tuvalet tadilat işleri, Zile Meslek Yüksekokulu ve Zile Dinçerler Turizm Yüksekokulu bay ve bayan tuvalet tadilat işleri ve Üniversitemiz çeşitli birimleri tadilat ve onarım işleri yaptırılmıştır. İş tamamlanmış olup; geçici kabul aşamasındadır.





- b) Rektörlük Binası ve Merkezi Kütüphane Binası Asansör Yapımı işi içinde 308.585,74-TL harcama yapılmış olup; Asansör temel imalatları, çelik imalatı, çelik boya imalatı, yıkım söküm imalatları, asansör tesisat imalatları tamamlanmıştır. Asansör inşaat imalatları, elektrik imalatları, asansör çevre düzenleme işleri devam etmektedir. 2019 yılı içinde fiziki gelişme ve toplam fiziki gerçekleşme % 62 olmuştur.



- c) 2019 yılı içinde toplamda 1.619.122,11-TL harcama yapılarak; Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi otomasyon tadilat işi, Mühendislik Fakültesi Binası bakım onarımı, Ziraat Fakültesi Binası, Eğitim Fakültesi Binası bakım onarımı, İlahiyat Fakültesi zemin onarım işleri, Binaların çatı bakım onarım işleri, Trafo ve Paratonerlerin topraklama ölçümü ve güçlendirilmesi, Almus Meslek Yüksekokulu mutfak bakım ve onarımı, VRF klima bakım onarımı, Merkezi Mutfak bakım onarımı, Trafo Merkezi bakım onarımı, Nizamiye giriş tak bakım onarımı, Taşlıçiftlik Kampüsü mekanik tesisat bakım onarımı, Kampüs binaları elektrik bakım onarımı, Jeneratör bakım onarımı, Kapalı Yüzme Havuzu bakım onarımı, Rektörlük Binası Senato Odası bakım onarımı, Artova Meslek

Yüksekokulu Kazan Dairesi bakım onarımı, Açık Spor Tesisleri bakım onarımı, Orta Gerilim Elektrik Hattı bakım onarımı, Üniversite elektrik ana giriş havai hattın yer altına alınması. Merkezi Laboratuvar Binası bakım onarımı, Merkezi Trafo bakım onarımı, Rektörlük Binası zemin kat bakım onarımı, Doğal Boyalar Binası bakım onarımı, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Binası bakım onarımı, Fen Edebiyat Fakültesi Binası dış cephe bakım onarımı, Tokat Meslek Yüksekokulu Binası dış cephe ve çatı bakım onarımı, Turhal Meslek Yüksekokulu tel örgü ve çevre düzenleme işleri, Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası bakım onarımı işleri yaptırılmıştır.

Muhtelif İşler Makine ve Teçhizat Alımları

Tablo 11: İdari ve Mali İşler Makine ve Teçhizat Alımı (06.1)

Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Birim Fiyatı	Harcanan Tutar
NTN4851/PMNN4251 CP NI-MH Batarya 1400 Mah	60	170,00	10.200,00
Yer Temizleme Makinası	1	18.700,00	18.700,00
Mini Büro Tipi Buzdolabı	1	1.500,00	1.500,00
Kahve Makinası	1	750,00	750,00
3KVA Güç Kaynağı	4	1.950,00	7.800,00
1 KVA Kesintisiz Online Güç Kaynağı	1	1.445,00	1.445,00
Yönetici Masa Takımı	2	6.300,00	12.600,00
Drone	1	12.900,00	12.900,00
Gimbal	1	3.700,00	3.700,00
Yaka Tipi Profesyonel Kablosuz Mikrofon	1	3.400,00	3.400,00
8 Kanal Ses Mikseri	1	1.800,00	1.800,00
Bulaşık Makinası	1	1.102,00	1.102,00
530 lt İki Kademeli Hava	1	8.000,00	8.000,00
İki Kademeli Kompresör Kumanda	1	1.000,00	1.000,00
12 V 7 AH Kuru Tip Bakımsız Akü Alımı	20	95,00	1.900,00
1 KVA Kesintisiz Online Güç Kaynağı	1	1.245,00	1.245,00
Blackout Karartma Stor Perde	25	130,00	3.250,00
Plise Zebra Perde	140	110,00	15.400,00
Zebra Perde	35	110,00	3.850,00
Zebra Perde	60	110,00	6.600,00
Mobil Uydu Sistemi	1	3.000,00	3.000,00
Görüntü Sistemi	1	2.500,00	2.500,00
Seslendirme Sistemi	1	2.500,00	2.500,00

Işıklandırma Sistemi	1	2.000,00	2.000,00
200x200 Storlu Projeksiyon Perdesi	30	416,00	12.480,00
Taktik Poztalif El Feneri	6	125,00	750,00
Taktik Eldiven	6	40,00	240,00
Kelepçe	6	27,00	162,00
Techizat Kemer Takımı	6	82,00	492,00
Kısa Cop	3	12,00	36,00
Uzun Cop	3	30,00	90,00
Cyma Akms Airsoft Tüfek	2	1.720,00	3.440,00
VR16 M145 Airsoft Tüfek	1	1.720,00	1.720,00
Gen3 Block GBB Airsoft Tabanca	3	570,00	1.710,00
Taktik Askı Kayış	3	30,00	90,00
Taktik Tabanca Kılıf	3	30,00	90,00
Aselsan Cabra MT975 Telsiz	6	185,00	1.110,00
Telsiz Kulaklıklığı	6	50,00	300,00
Masa Takımı	6	2.000,00	12.000,00
Dosya Dolabı	6	1.000,00	6.000,00
Etajer	6	500,00	3.000,00
Orta Sehpa 900*600*450	6	250,00	1.500,00
Orta Sehpa 600*600*450	6	250,00	1.500,00
Riso Sf 5230 Baskı Makinası	1	19.400,00	19.400,00
Toplantı Masası	1	1.716,00	1.716,00
Toplantı Koltuğu	8	550,00	4.400,00
Misafir Koltuğu	10	340,00	3.400,00
Stor Perde	180	150,00	27.000,00
Zebra Perde	12	210,00	2.520,00
Öğrenci Mikroskobu	25	6.350,00	158.750,00
Masaüstü Telefon	300	58,50	17.550,00
Salon Tipi Klima	1	14.770,00	14.770,00
Duvar Tipi Split Klima	1	7.520,00	7.520,00
Çim Biçme Makinası	2	1.865,00	3.730,00
Motorlu Tırpan	2	3.275,00	6.550,00
Faks Cihazı	1	1.450,00	1.450,00
Sharp Mx-M266 N Fotokopi Makinası	1	17.260,00	17.260,00
2MP IP Sabit Bullet Kamera	4	3.000,00	12.000,00
2MP IP Hareket Speede Dome Kamera	1	1.750,00	1.750,00
Kenar Anahtar	2	2.900,00	5.800,00
Direk Tipi Kabinet	2	1.800,00	3.600,00
DörtlüÖn Modül Amfi	46	635,00	29.210,00
IV Kol Enjeksiyon Eğitim Maketi	2	3.150,00	6.300,00
Intramasküler Kalça Maketi	1	11.200,00	11.200,00

Canon MF416DW Çok Fonksiyonlu Yazıcı	1	5.150,00	5.150,00
Makam Masa Takımı	3	4.500,00	13.500,00
Metal Kollu Yönetici Misafir Koltuğu	8	505,00	4.040,00
Metal Kollu Yönetici Koltuğu	3	605,00	1.815,00
Ahşap Kollu Yönetici Koltuğu	1	655,00	655,00
Ahşap Kollu Yönetici Misafir Koltuğu	4	555,00	2.220,00
Tekli Misafir Koltuğu	2	855,00	1.710,00
İkili Misafir Koltuğu	1	1.335,00	1.335,00
Üçlü Misafir Koltuğu	1	1.270,00	1.270,00
Tek Kişilik Elbise Dolabı	5	415,00	2.075,00
Ahşap Ayaklı Sehpa	1	190,00	190,00
Yuvarlak Yemek Masası	1	330,00	330,00
Kolçaklı Koltuk	61	1.020,00	62.220,00
Meclis Masası	14	1.100,00	15.400,00
Meclis Başkanı Masası	1	4.600,00	4.600,00
Mekatronik Muhafaza Sistemi	33	2.160,00	71.280,00
Monitör	33	440,00	14.520,00
İş İstasyonu	1	11.600,00	11.600,00
24 Kanal Dijital Mikser	1	9.800,00	9.800,00
Hoparlör	8	190,00	1.520,00
Power Anfi	1	1.850,00	1.850,00
Tablet Bilgisayar	1	700,00	700,00
Masa Mikrofonu	33	400,00	13.200,00
Brother ADS 2400N Tarayıcı	2	4.100,00	8.200,00
OKİ B432DM Lazer Yazıcı	4	1.450,00	5.800,00
Mühlen Evrak İmha Makinası	1	1.675,00	1.675,00
Kumandalı Motorlu Projeksiyon	1	1.400,00	1.400,00
Duvar Tipi 12000 BTU Split Klima	1	6.450,00	6.450,00
Metal Kollu Misafir Koltuğu	16	705,00	11.280,00
Metal Kollu Yönetici Koltuğu	8	755,00	6.040,00
Makam Masa Takımı	3	2.390,00	7.170,00
Ahşap Ayaklı Sehpa	6	205,00	1.230,00
Ahşap Dosya Dolabı	5	710,00	3.550,00
Canon MF734CDW Lazer Yazıcı	1	2.683,51	2.683,51
Çalışma Koltuğu (2 Adet Sağlık Bilimleri Fak.4 Adet Pazar MYO)	6	572,53	3.435,18
Masa Takımı	3	1.629,85	4.889,55
Toplantı Masası	24	535,98	12.863,52
Tekli Koltuk/Kanepe(Sabit)	1	853,58	853,58
Köşe Sehpa	2	114,92	229,84

Dosya Dolabı(20Adet Sağlık Bilimleri Fak.4 Adet Pazar MYO)	24	382,39	9.177,36
Toplantı Masası	1	864,03	864,03
Üçlü Bank Tipi Sandalye	32	547,47	17.519,04
Dörtlü Arka Modül Amfi Sırası	6	960,59	5.763,54
Masa Takımı	9	739,70	6.657,30
Misafir Koltuğu	24	355,22	8.525,28
Çalışma Koltuğu (22 Adet Sağlık Bilimleri Fak.8 Adet Pazar MYO)	30	538,07	16.142,10
Masa Takımı	1	4.431,91	4.431,91
Köşe Sehpa	10	159,85	1.598,50
Toplantı Masası(Baş Modül)	1	670,74	670,74
Çalışma Koltuğu	10	615,36	6.153,60
Üçlü Arka Modül Amfi Sırası	3	715,53	2.146,59
Üçlü Koltuk Kanepe(Sabit)	1	1.454,32	1.454,32
Kürsü	2	185,98	371,96
İkili Orta Modül Amfi Sırası	38	609,03	23.143,14
Dörtlü Ön Modül Amfi Sırası	6	629,71	3.778,26
Dosya Dolabı	96	557,91	53.559,36
Dosya Dolabı	22	465,96	10.251,12
İkili Arka Modül Amfi Sırası	4	536,65	2.146,60
Üçlü Ön Modül Amfi Sırası	3	459,10	1.377,30
Konferans Sandalyesi	150	137,91	20.686,50
Üçlü Ön Modül Amfi Sırası	24	824,10	19.778,40
Dörtlü Orta Modül Amfi Sırası	54	1.104,31	59.632,74
Çalışma Koltuğu	22	422,09	9.285,98
Masa Takımı	3	708,37	2.125,11
Toplantı Masası(Yan Modül)	4	647,76	2.591,04
Sandalye	40	124,32	4.972,80
Orta Sehpa	50	176,57	8.828,50
İkili Ön Modül Amfi Sırası	4	372,24	1.488,96
Sinema/Tiyatro/Konferans Koltuğu	80	289,40	23.152,00
Kitaplık	19	289,40	5.498,60
Misafir Koltuğu	16	548,51	8.776,16
Amfi Sırası	14	640,08	8.961,12
Amfi Sırası	94	1.122,81	105.544,14
Amfi Sırası	8	977,15	7.817,20
Okul Sırası(150Fen Edebiyat+135Zile MYO+88 Ayniyat)	373	329,61	122.944,53
Amfi Sırası	7	378,53	2.649,71
Amfi Sırası	47	618,82	29.084,54
Amfi Sırası	7	545,45	3.818,15
Amfi Sırası	3	466,77	1.400,31

Amfi Sırası	24	837,85	20.108,40
Amfi Sırası	3	727,28	2.181,84
Yetişkin Maketi	1	11.793,00	11.793,00
Çocuk Maketi	1	11.500,00	11.500,00
Bebek Maketi	1	450,00	450,00
CPR Metronom	1	4.725,00	4.725,00
2 MP IP Sabit Bullet Kamera (Tip1)	2	1.427,00	2.854,00
2 MP IP Sabit Bullet Kamera (Tip2)	30	1.316,25	39.487,50
2 MP IP Sabit Dome Kamera	107	1.230,00	131.610,00
2 MP Hareketli Dome Kamera	2	1.500,00	3.000,00
Kamera Kayıt Cihazı(32 Kanal)	2	2.300,00	4.600,00
Çalışma Koltuğu	1	679,11	679,11
Masa Takımı	1	4.714,80	4.714,80
Dosya Dolabı	4	573,51	2.294,04
Çalışma Koltuğu	23	572,41	13.165,43
Çalışma Koltuğu	18	449,03	8.082,54
Misafir Koltuğu	8	499,05	3.992,40
Sandalye	84	127,82	10.736,88
Sinema/Tiyatro/Konferans Koltuğu	196	307,87	60.342,52
Bilgisayar Masası	84	210,06	17.645,04
Köşe Banko	2	463,49	926,98
Banko	1	347,89	347,89
İkili Orta Modül Amfi Sırası	48	647,90	31.099,20
Üçlü Orta Modül Amfi Sırası	222	876,70	194.627,40
Dörtlü Arka Modül Amfi Sırası	42	1.021,90	42.919,80
Misafir Koltuğu	4	566,84	2.267,36
Misafir Koltuğu	4	607,97	2.431,88
Masa Takımı	1	3.740,06	3.740,06
Çalışma Koltuğu	2	609,07	1.218,14
Çalışma Koltuğu	23	413,47	9.509,81
Misafir Koltuğu	8	502,38	4.019,04
Misafir Koltuğu	36	377,89	13.604,04
İkili Koltuk/Kanepe(Sabit)	1	1.360,43	1.360,43
Konferans Sandalyesi	140	146,71	20.539,40
Dosya Dolabı	4	491,26	1.965,04
İkili Ön Modül Amfi Sırası	6	396,00	2.376,00
İkili Arka Modül Amfi Sırası	6	570,90	3.425,40
Üçlü Orta Modül Amfi Sırası	33	488,40	16.117,20
Üçlü Arka Modül Amfi Sırası	33	761,20	25.119,60
Çalışma Koltuğu	1	663,53	663,53
Markbass Marcus Miller Cmd 103	1	9.400,00	9.400,00
160 Lık Çalışma Masası	2	677,00	1.354,00

Misafir Sandalyesi	40	110,17	4.406,80
Memur Koltuğu	5	466,00	2.330,00
Xerox D95 100S13179 Baskı Makinası	1	102.300,00	102.300,00
	KDV	HARİÇ	1.884.801,71
	KDV	HARİÇ	440.456,51
	KDV	%18.	339.264,31
	KDV	0,08	35.236,52
	GENEL	TOPLAM	2.699.759,05

Tablo 12: İdari ve Mali İşler Makine ve Teçhizat Alımı (06.1-Öz Gelir)

Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Birim Fiyatı	Harcanan Tutar
Tahnitli Erkek Kadın Kadavra	2	28.988,56	57.977,12
İzleme Bilgisayarı+Monitör	4	1.830,00	7.320,00
Kabinet 9U	5	195,00	975,00
2 MP IP Sabit Bullet Kamera (Tip2)	35	1.375,27	48.134,53
	KDV	HARİÇ	114.406,65
	KDV	%18	20.593,20
	GENEL	TOPLAM	134.999,85

Tablo 13: İdari ve Mali İşler Makine ve Teçhizat Bakım Onarım (06.6)

Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Birim Fiyatı	Harcanan Tutar
Fotosel	2	1.150,00	2.300,00
Fotosel Reflektörü	2	460,00	920,00
Zaman Rolesi	1	380,00	380,00
220-24 DC Power	1	400,00	400,00
60 AP 522 Koltuk Döşeme	3	7.660,00	22.980,00
Toshiba Fotokopi Makinası Tamiri	1	2.052,00	2.052,00
Cami Ses Sistemi 6" 50 W Beyaz Sütun Hoparlör	2	350,00	700,00
Cami Ses Sistemi 5" 30 W Sütun Hoparlör	1	250,00	250,00
PE HPLC Degasser Tamir Bedeli	1	1.200,00	1.200,00
Xerox 560 Drum Black	1	4.480,00	4.480,00
Xerox 560 Drum Color	2	2.520,00	5.040,00
Xerox C75 Drum Clor	1	2.520,00	2.520,00
Xerox 4595 Drum	1	2.800,00	2.800,00
Xerox 4595 Shaaft Assy İnv	1	1.340,00	1.340,00
Xerox 4595 D Fın Decur Kıt	1	625,00	625,00
Xerox 4595 Sensör	1	140,00	140,00
Xerox 4595 Duplex Motor	1	1.008,00	1.008,00

Xerox 4595 Fuser Web	2	845,00	1.690,00
Klima Montajı Demontaj	3	450,00	1.350,00
Kklima Sogutucu Gaz	10	160,00	1.600,00
Klima Montaj Seti 5/8 3/8	25	90,00	2.250,00
Klima 48 Bth Kompresör	1	2.767,20	2.767,20
Klima Kartı	3	876,00	2.628,00
Rektörlük Binası Bayrak Direklerinin Bakımı	6	497,00	2.982,00
Control 1Thermıs Xerox C75	1	352,00	352,00
Control 2Therm Xerox C75	1	352,00	352,00
Overheat Thermı Xerox C75	1	352,00	352,00
Heat Roll Finger Xerox C75	1	470,00	470,00
Fuser Xerox C75	1	4.990,00	4.990,00
Drum Black Xerox C75	2	4.700,00	9.400,00
Drum Color Xerox C75	3	2.645,00	7.935,00
Drum	1	2.564,00	2.564,00
Fuser	1	2.800,00	2.800,00
SD Kart	1	420,00	420,00
Kablosuz Aktarıcı	2	1.750,00	3.500,00
Elektrik Kablosu	450	4,00	1.800,00
Kangal Boru	450	3,00	1.350,00
İlan Panosu	12	1.600,00	19.200,00
Plesit Black Out Kumaş Perde	200	88,25	17.650,00
Mercura Adaptör	1	125,00	125,00
Alfnl 100/200 İç Takımı	2	480,00	960,00
Alfnl 85/200 İç Takımı	4	450,00	1.800,00
Alfnl 50/180 İç Takımı	2	420,00	840,00
Alfnl 40/125 İç Takımı	2	425,00	850,00
Alfd 21005 Y.Yangın Hiz.İç Bakım	2	515,00	1.030,00
Alfd Joker Y.Hidrofor İç Takım	1	490,00	490,00
Alfd 21004 Kullanım Suyu Hidrofor İç Takımı	2	495,00	990,00
Sim Kartları Haberleşme Gideri	16	182,00	2.912,00
Raftop Klima Cihazının Isı Bataryası	1	17.850,00	17.850,00
ARTRONİK Güç Kaynağı Bakım Onarım	1	2.250,00	2.250,00
Gassero Walcon 150 kw Duvar Tipi Kazanların Yıllık Bakımı	6	330,00	1.980,00
Fotokopi Makinası Bakım Onarım	1	8.400,00	8.400,00
VRF Sistemleri Dış Ünite (2 Bakımx14 Cihaz)	28	100,00	2.800,00
VRF Sistemleri iÇ Ünite (2 Bakımx229 Cihaz)	458	40,00	18.320,00
Klima Santrali (2 bakımx5 cihaz)	10	300,00	3.000,00
Rooflop Klima (2 bakımx4 cihaz)	8	400,00	3.200,00
Taze Hava Ünitesi (2 bakımx11 cihaz)	22	350,00	7.700,00

Otomasyon Sistemi (2 bakımx1 cihaz)	2	3.500	7.000,00
Blorür Bakım ve Onarımı	1	4.250	4.250,00
UPS Yıllık Periyodik Bakım	1	5.000	5.000,00
Morfoloji Binası 8 Kalem Pompa ve Hidrofor Bakım Onarım	1	7.540	7.540,00
Pal Ana Kart	1	9.000	9.000,00
WRS Modül Arka Parl Tamiri	1	639,1	639,10
	KDV	HARİÇ	205.833,30
	KDV	HARİÇ	17.650,00
	KDV	HARİÇ	22.980,00
	KDV	%18.	37.049,99
	KDV	0,08	1.412,00
	GENEL	TOPLAM	284.925,29

Tablo 14: Bilgi Teknolojileri Kapsamında Yapılan Alım Listesi (06.1)

Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
Dizüstü Bilgisayar	1	9.100,00	9.100,00
HP Tümleşik Masaüstü Bilgisayar	3	4.800,00	14.400,00
Usb Kablolü Optik Mouse	30	38,00	1.140,00
1 Tb Sata Hdd	15	240,00	3.600,00
2 GB DDR 2 Ram	10	122,00	1.220,00
4 GB DDR 3 Ram	20	188,00	3.760,00
4 GB DDR 3 Ram	5	163,00	815,00
CD-R 700 mb 50 li Paket	2	43,00	86,00
DVD-R 4,7 GB 50 li Paket	2	45,00	90,00
4 Hücreli Şarjlı Pil	2	50,00	100,00
Isı Ayarlı Kalem Havya Lehim Makinası	1	144,00	144,00
Lehim Pompası	2	55,00	110,00
500 Gb M.2 SSD	1	769,00	769,00
8 GB DDR3 Notebook Ram	8	316,50	2.532,00
240 GB SSD	5	284,00	1.420,00
HDMI TO VGA Dönüştürücü	3	134,00	402,00
Ağır Görev Tipi Lisanssız El Telsizi	4	1.110,00	4.440,00
5 Metre Patch Kablo	100	51,00	5.100,00
Network ve Kablo Test Cihazı ve Ton İzleyici	1	3.330,00	3.330,00
Şarj Adaptörü	1	135,00	135,00
ESET ENPOINT PROTECTION 300 Kullanıcılı	1	30.000,00	30.000,00
EBYS Bakım ve Destek Hizmeti	1	8.838,92	8.838,92
Epson V11H855040 Projeksiyon Cihazı	27	2.331,54	62.951,58
Taşınabilir Bilgisayar Alımı	284	4.292,11	1.218.959,24

Pantum P2500 Lazer Yazıcı	12	233,51	2.802,10
OKI OKI B432DN 45762012 Lazer Yazıcı	5	684,15	3.420,75
Zebra GC420-100520-0AC Barkod Etiket Yazıcı	5	1.088,41	5.442,05
AVISION AD230U Tarayıcı	9	1.913,28	17.219,52
CASIO XJ-V2 Projeksiyon Cihazı	9	3.949,39	35.544,51
EPSON B11B226401 Tarayıcı	1	2.459,94	2.459,94
	KDV	HARİÇ	1.440.331,61
	KDV	%18.	259.259,69
	GENEL	TOPLAM	1.699.591,30

Tablo 15: Bilgi Teknolojileri Kapsamında Yapılan Alım Listesi (06.1-Öz Gelir)

Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
Taşınabilir Bilgisayar Alımı	5	3.852,20	19.261,00
Hp AIO Tümleşik Bilgisayar	1	3.820,00	3.820,00
2 GB DDR2 Ram	17	120,00	2.040,00
8 GB DDR3 Notebook Ram	10	230,00	2.300,00
Pantum Lazer Yazıcı	4	220,41	881,62
Casio XJ-V2 Projeksiyon Cihazı	3	3.949,39	11.848,17
Avision AD230U Tarayıcı	3	1.913,28	5.739,84
Kart Okuyucu	2	2.617,79	5.235,60
	KDV	HARİÇ	51.126,23
	KDV	%18	9.202,72
	GENEL	TOPLAM	60.328,95

Tablo 16: Bilgi Teknolojileri Kapsamında Yapılan Alımlar (06.3)

Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika (Tübitak)	27	85,00	2.295,00
3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika (Tübitak)	31	95,00	2.945,00
Betonarme Yapıların Analiz ve Tasarım Yazılım modülü	1	10.000,00	10.000,00
3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika (Tübitak)	24	95,00	2.280,00
DsktpEdu Alng Licsapk Olv E1Y Acdmc Ent (Microsoft Eğitim Çözümleri Kapsamında Yıllık Lisans)	225	318,00	71.550,00
Mslmgnacdmy Alng Subsvl Olv E 1Mth Acdmc (Microsoft Eğitim Çözümleri Kapsamında Yıllık Lisans)	1	5.980,00	5.980,00
3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika (Tübitak)	35	95,00	3.325,00
1 Yıllık Video Paylaşım Sitesi Hizmeti	1	2.600,00	2.600,00
İcrapro Bireysel Yıllık Güncelleme	1	175,15	175,15

İcrapro Bireysel Yıllık Güncelleme	1	262,64	262,64
3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika (Tübitak)	25	95,00	2.375,00
EBYS Bakım ve Destek Hizmeti Alımı	1	32.110,00	29.661,30
3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika (Tübitak)	18	95,00	1.710,00
Zaafiyet Yazılımı	1	14.240,00	14.240,00
3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika (Tübitak)	4	95,00	380,00
IPAD Tablet Bilgisayar	1	14.480,00	14.480,00
Proliz Osb Web Servis Geliştirme Ücreti	1	3.750,00	3.750,00
E-Hakediş Güncel Sürüm Bedeli	9	1.380,00	12.420,00
Kontrat Yenileme Yazılım Lisanslarının 1 Yıl Süreyle Uzatılması	1	30.000,00	30.000,00
Online Sertifika	1	160,00	160,00
Harita Yazılımı	1	18.500,00	18.500,00
3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika (Tübitak)	17	95,00	1.615,00
Zaman Damgası 1.000.000 Adet Kontör	1	3.750,00	3.750,00
3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika (Tübitak)	9	95,00	855,00
Online Sertifika	1	250,00	250,00
Yös Sınav Sistemi Sınırsız Yerleştirme ve Sanal Pos Modülü	1	15.000,00	15.000,00
Dahili Abone Lisansı	4	1.823,00	7.292,00
EBYS Ek 250000 Sayfa OCR Lisansı	1	5.900,00	5.900,00
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Eğitim Bedeli	1	3.900,00	3.900,00
3 Yıllık Nitelikli Elektronik Sertifika (Tübitak)	22	95,00	2.090,00
Academic Vnware vCenter Server 6 Standart for vSphere 6 için 1 Yıllık Support Yenileme Paketi	1	14.500,00	14.500,00
Öğrenci Bilgi Sistemi Dosya Paylaşım Modülü	1	6.000,00	6.000,00
Öğrenci Bilgi Sistemi Lisansı Yıllık Bakım ve Destek Hizmeti	1	44.950,00	44.950,00
	KDV	HARİÇ	299.855,94
	KDV	HARİÇ	35.335,15
	KDV	%18	53.974,07
	GENEL	TOPLAM	389.165,16

Tablo 17: Bilgi Teknolojileri Kapsamında Yapılan Bakım Onarım Giderleri (06.6)

Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Sınav Programı	1	8.500,00	8.500,00
Kablosuz Klavye Mouse Seti	10	220,00	2.200,00
8 GB DDR3 Notebook Ram	1	550,00	550,00
Ekran Kartı	1	700,00	700,00
Alpha Wilcard SSL	1	830,00	830,00
IBMX3690X5 Marka Sunucunun 1 Yıllık Bakım Onarım ve Garantisinin Yapılması	1	24.000,00	24.000,00
Sunucu Odası Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Bakım Onarım	1	2.399,00	2.399,00

Monitör Bakım ve Tamiri	7	300,00	2.100,00
Yazıcı Bakım ve Tamiri	13	250,00	3.250,00
Notebook Bakım ve Tamiri	5	250,00	1.250,00
Projeksiyon Bakım ve Tamiri	5	250,00	1.250,00
Tarayıcı Bakım ve Tamiri	1	412,78	412,78
Abonelerin Kroneye(Çatıya)İşlenmesi	1	1.750,00	1.750,00
Tesisattan Gelen Abonelerin Çatıya İşlenmesi ve Priz Numaralandırma	1	2.250,00	2.250,00
RJ45 Ethernetkablo Sıkma Pensesi	2	330,00	660,00
3 MT HDM Kablo	30	14,00	420,00
5 MT HDM Kablo	30	25,00	750,00
10 MT HDM Kablo	10	60,00	600,00
15 MT HDM Kablo	10	210,00	2.100,00
2 MT KHM Kablo	10	15,00	150,00
Ekran Kartı	1	3.450,00	3.450,00
64 gb USB 3.0 Flash Bellek	5	75,00	375,00
32 gb USB 2.0 Flash Bellek	3	45,00	135,00
Şarj Adaptörü	1	200,00	200,00
Batarya	1	165,00	165,00
4 GB DDR3 Ram	30	120,00	3.600,00
2 GB DDR2 Ram	3	120,00	360,00
	KDV	HARİÇ	64.406,78
	KDV	%18	11.593,22
	GENEL	TOPLAM	76.000,00

2.2.3. 2019H030840 Yayın Alımı (DOKAP)

2019 yılında Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına yayın alımları için 1.100.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan eklemelerle birlikte ödenek toplam 1.300.000,00-TL olmuştur. Mevcut ödenekler dahilinde bu projeden 1.193146,07-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Alımlar Yayınlar ve Veri Tabanı	Harcanan Tutar
ProQest LLC	32.820,52
Clinical Key	57.036,35
Hukuk Türk	1.705,84
İnformascope	5.195,00
ASOS	9.261,36
İdeal Kültür	23.036,70
EBSCO İnternational inc	306.945,07
Hukuk Türk	1.705,84
CUP	31.523,19

TechKnowledge	221.609,27
ProQest Central	70.359,36
APS	26.688,46
UpToDate	80.590,40
Ovid	48.132,52
OUP	23.749,59
ASTM	42.987,30
Reaxys	61.846,56
ACS	47.534,72
SAGE	51.714,14
EBSCO	48.703,89
Toplam	1.193.146,07

2.2.4. 2019I000700 Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (DOKAP)

Proje No:	2019I000700
Sektör	Sağlık
Proje Adı ve Özellikleri	Muhtelif İşler (DOKAP) Büyük Onarım
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2019-2019

Proje Bedeli	2019 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı(%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
1.800.000	1.800.000,00			915.353,19	50,85	915.353,00

Açıklama: 2019 yılı başlangıç ödeneği 1.800.000,00-TL olup; 915.353,19-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında;

- Araştırma ve Uygulama Hastanesi VRF Tesisatı için 523.517,01-TL harcama yapılmış olup; C blok zemin kat VRF tesisatı iç ünite ve dış ünite imalatları tamamlanmış olup, geçici kabul işlemleri bitmiştir.



- b) 2019 yılı içinde toplamda 391.836,18-TL harcama yapılarak; Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnme Ünitesi yapımı işi, ofis bölme işi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi bakım onarım işleri, Araştırma ve Uygulama Hastanesi mutfak bakım onarımı, Su deposu, Acil, Atık Deposu bakım onarımı, Asansör bakım onarımı, hidrofor bakım onarımı, Sağlık Kampüsü Isı Merkezi mekanik tesisat bakım onarımı, çatı bakım onarımı işleri yaptırılmıştır.

Tablo:18 Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Makine ve Teçhizat Alımları

Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Birim Fiyatı	Harcanan Tutar
Anestezi Cihazı	6	107.604,2	645.625,2
Transport Ventilatör	4	70.200,00	280.800,00
Jinekolog Cerrahi Masa	1	5.184,00	5.184,00
Spiral Kesme Motoru	2	591,77	1.183,54
Traktör arkası Kar Temizleme	1	2.185,36	2.185,36
Kiosk Sıramatik	2	12.390,00	24.780,00
Kanal ve Gider açma makinası	1	6.136,00	6.136,00
Bipolar Rezektoskop Seti	1	32.065,20	32.065,20
Kırık Vida Çıkarma Seti	1	32.398,92	32.398,92
Sıramatik	1	5.529,60	5.529,60
Kir.Taş.Ara.Plat.Yük Taş.Kir.(Kırmızı)	17	1.908,82	32.450,00
Fotoğraf Makinası	1	20.520,00	20.520,00
Koltuk Kanep Portmanto	65	348,42	22.647,60
Ayaklı Işıklı Büyüteç	4	829,25	3.317,00
Dermeskop sistemi	1	5.524,20	5.524,20
Kan Alma Koltuğu	2	4.926,96	9.853,92
Malzeme Taşıma Arabası	2	1.468,80	2.937,60
Nokta Vuruşlu yazıcı	2	3.445,20	6.890,40
X Ray tüp	1	460.200,00	460.200,00
Ameliyat Tavan Lambası (DMO)	2	86.370,50	172.741,00
Bulaşık Makinası	1	2.596,00	2.596,00
Çamaşır Kuutma Makinası	1	5.664,00	5.664,00
Çamaşır Yıkama Makinası	1	3.068,00	3.068,00
Bilgisayar Kasası	5	214,92	1.074,60
Mezoterapi Tabancası	1	29.495,17	29.495,17
Komprasör	1	171,72	171,72
Tarayıcı Masa Üstü	2	2.106,30	7.241,00
Projeksiyon Cihazı	1	3.699,30	3.699,30
Patates Soyma Kıyma Mak.	3	4.284,00	12.852,00
Elektrikli Kesici ve Delici Motor	2	66.366,00	132.732,00
Lazer Yazıcı ve Barkot	10	2.899,80	28.998,00
Duvar Tipi Klima	1	6.195,00	6.195,00
Havalı Yatak	40	403,92	16.156,80
Termal Yazıcı	1	1.044,30	1.044,30
hidrolikli bar sandalyesi	3	649,00	1.947,00
Acil röntgen Tüp	1	126.360,00	126.360,00
Alet Masası (Büyük)	16	1.188,00	19.008,00
Kirli ve Temiz Çamaşır Arabası	2	3.947,40	7.894,80
Leğen Paslanmaz 30 cm	13	178,20	2.316,60
Ameliyathane Maske Dolabı	1	1.890,00	1.890,00
Ameliyathane Terlik Dolapları Tip 1	4	1.242,00	4.968,00
Ameliyathane Mayo Masası Hidrolikli	13	1.890,00	24.570,00

Ameliyathane Basamak	4	183,60	734,40
Ameliyathane Steril Depo Dolabı	10	1.836,00	18.360,00
Tekli Port Küvet (Ameliyathane)	5	475,20	2.376,00
Alet İlaç Dolabı (Ameliyathane)	13	2.862,00	37.206,00
Metal Sepetli Raf(Ameliyathane)	13	2.268,00	29.484,00
Hasta Isıtma Blanketi	5	18.727,20	93.636,00
İşitme Cihazı Test ve Uygulama Sistemi	1	70.092,00	70.092,00
Flexible Rino Faringoskop	1	63.061,20	63.061,20
Hasta Başı Monitörü	20	25.488,00	509.760,00
Kayıt Cihazı (Holter Cihazı İçin)	3	9.331,20	27.993,60
Hasta Sıcaklık Yönetim Sistemi Ünitesi	1	128.520,00	128.520,00
Kardiyoloji tüp	1	367.200,00	367.200,00
Telefon	20	106,20	2.124,00
Telsiz telefon	5	300,00	1.500,00
Otoklav Cihazı	1	32.508,00	32.508,00
Anestezi Cihazı	2	269.693,28	539.386,56
C kollu Röntgen Cihazı	2	257.040,00	514.080,00
Yeni Doğan AEEG cihazı	1	193.752,00	193.752,00
Hibrit küvöz	5	97.632,00	488.160,00
Yeni Doğan Ventilatör	2	156.330,00	312.660,00
İkili Eğ.Baş.Bin.Rutin Mikroskop	1	47.941,00	47.941,00
Karbonmonksit Difüzyon Sis.	1	155.185,20	155.185,20
Mikro PCNL Perkutan Nefreskop	1	106.650,00	106.650,00
Minimal İnvaziv PCNL seti	1	77.058,00	77.058,00
Göz Cerrahi Alet Seti	1	141.480,00	141.480,00
KVC Priferik Vasküler Cer.Seti	1	113.088,96	113.088,96
KVC Koroner Cerrahi Alet Seti	1	107.865,00	107.865,00
Üroloji cerrahi Alet seti	1	18.630,00	18.630,00
Klima Eczane	1	4.102,92	4.102,92
MAQUET Ameliyathane Lambası	2	74.455,77	148.911,54
SW SS Hasta Sandalyesi	30	1.362,72	40.881,60
RAUSMANN UT-18 Sedye	14	7.208,88	100.924,32
DECOTREND DT 5012 Yatak (döşek) Koruyucu	500	39,41	19.705,00
DECOTREND DT 5070 Yastık Kılıfı	2000	5,96	11.920,00
DECOTREND DT 5009 Çarşaf	3000	26,03	78.090,00
DECOTREND DT 5025 Pike	1000	78,63	78.630,00
BOWA ARC 400 Elektrokoter Cihazı	1	68.315,38	68.315,38
ICON D008 Dosya Dolabı	20	713,36	14.267,20
ICON D001 Dosya Dolabı	10	655,28	6.552,80
PYRAWORK MEDICAL SYSTEMS HB08- JL Motorlu Hasta Bakım Yatakları	2	4.688,71	9.377,42
MUKA MKF-4350 Motorlu Hasta Bakım Yatakları	101	4.731,92	477.923,92
TOPLAM	7.044	3.757.069,25	7.473.005,85

Tablo:19 Diş Hekimliği Fakültesi Makine ve Teçhizat Alımları

Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Birim Fiyatı	Harcanan Tutar
BİSTRÜ UCU NO 15 ALIMI	20,00	50,00	1.000,00
FURKASYON KÜRETİ	1,00	1.250,00	1.250,00
FURKASYON KÜRETİ	1,00	1.250,00	1.250,00
TÜNEL BAĞ DOKU PERİOST ELEVATÖRÜ SETİ	1,00	1.000,00	1.000,00
FOTOKOPİ MAKİNESİ	1,00	16.000,00	16.000,00
PORTEGÜ	10,00	1.000,00	10.000,00
BİLEYLEME CİHAZI	1,00	29.850,00	29.850,00
ARKANSAS BİLEYLEME TAŞI	2,00	180,00	360,00
KRETUAR	30,00	90,00	2.700,00
PAPİL ELAVATÖRÜ	4,00	260,00	1.040,00
ÜNİTE MONTE IŞINLI DOLGU CİHAZI	4,00	686,00	2.744,00
POLİMERİZASYON CİHAZI	1,00	15.600,00	15.600,00
DIŞ ÜNİTİ	4,00	54.400,00	217.600,00
DIŞ TAŞI TEMİZLEME (KAVİTRON) CİHAZI ÜNİTE MONTE	4,00	1.445,00	5.780,00
HARİCİ ULTRASONİK KAVİTRON CİHAZI	3,00	3.745,00	11.325,00
DİZDEN KONTROLLÜ LABORATUVAR MOTORU	1,00	5.660,00	5.660,00
KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI	1,00	800.680,00	800.680,00
ALJİNAT KARIŞTIRICI	1,00	3.000,00	3.000,00
SERAMİK RULMANLI TÜRBİN (AERATÖR)	4,00	5.900,00	23.600,00
HAVALI MİKROMOTOR	4,00	936,00	3.744,00
650-850mW/cm2 Güç Yoğunluğuna Sahip Işık Cihazı	4,00	650,00	2.600,00
ANGLDURVA	4,00	2.350,00	9.400,00
KABLOLU ENDOMOTOR	2,00	6.000,00	12.000,00
KABLOSUZ ENDOMOTOR	2,00	9.000,00	18.000,00
RESİPROC HAREKETİ YAPAN ENDOMOTOR	1,00	14.300,00	14.300,00
Guta Cihazı	1,00	17.800,00	17.800,00
DİJİTAL PANORAMİK VE SEFALOMETRİK RÖNTGEN CİHAZI	1,00	167.700,00	167.700,00
TOPLAM	113,00	1.160.782,00	1.580.623,00

2.2.5. 2019K120610 DHK-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü

2.2.5.1 Bilimsel Araştırma Projeleri

Tablo 20: 2019 Yılında Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje No	Proje Yöneticisi	Proje Adı	Süre	Proje Bütçesi	2019 Yılı Harcaması
2019/57	Dr.Öğr.Üyesi Yaşar GÜLMEZ	TOKAT İL'İNDE BAL ARISI KOLONİLERİNE ZARAR VEREN YABAN ARISI (INSECTA: HYMENOPTERA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ	12	8.094,00	6.301,20
2019/42	Doç.Dr. Fikret GEVREK	İnfertil ve Fertil Bireylerin Sperm Hücrelerinde Ubiquitin Protezom İlişkili Proteinlerin Ekspresyonlarının İncelenmesi	12	29.830,40	27.679,34
2019/37	Dr.Öğr.Üyesi Şenol ÇİTLİ	İdiopatik azospermili erkeklerde kromozomal microarray analizi ile sub-kromozomal değişikliklerin araştırılması	12	29.500,00	29.497,50
2019/38	Dr.Öğr.Üyesi İlhami KARATAŞ	Rosmarinik asit'in Ocimum basilicum L. adventif kök kültüründe biyoreaktör sistemleriyle üretimi ve biyosentez genlerinin ekspresyonunun incelenmesi	24	39.991,94	19.436,37
2019/58	Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer KATAR	Otoimmün tiroiditli hastalarda L-Tiroksin tedavi öncesi ve sonrası Visfatin seviyelerinin değerlendirilmesi	11	6.048,00	4.752,00
2019/41	Doç.Dr. Hatice BALCI YÜCE	Demineralize dondurulmuş kurutulmuş sement/dentin içeren kemik benzeri materyal üretilmesi ve greft materyali olarak uygulanabilirliğinin araştırılması	24	39.926,48	33.799,04
2019/43	Prof.Dr. Ömer İŞILDAK	PORFİRİN TÜREVİ MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE POTANSİYOMETRİK TEMELLİ SENSÖR TASARIMINDA İYONOFOR OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI	18	39.992,92	31.801,00
2019/44	Arş.Gör.Dr. Hüseyin AKBAŞ	Tek ve İki Fonksiyonlu Ligantlarla Siklotrifosfazen Türevlerinin ve Tuzlarının Sentezleri, Yapısal Karakterizasyonları ve Biyolojik Aktiviteleri	24	39.230,03	24.523,69
2019/45	Dr.Öğr.Üyesi Hakan POLATCI	GÜNEŞ ENERJİLİ VAKUM TÜPLÜ BİR KURUTUCU TASARIMI VE	24	35.116,03	25.132,82

		PERFORMANSININ BELİRLENMESİ			
2019/46	Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin HATIRLI	Tükürükten İzolasyon ve Dehidratasyonun Diş Rengine Etkisi	12	39.943,00	39.589,00
2019/47	Dr.Öğr.Üyesi Fatma GEDİKLİ	Bitki Yetiştiriciliğinde Kullanılan ve Zararlı Olduğu Bilinen Paclobutrazol' e Moleküler Docking Yöntemleri ile Alternatif İnhibitör Tasarlanması	36	40.000,00	24.282,43
2019/48	Dr.Öğr.Üyesi Mustafa EKER	Demagnetizasyon Arızasının Şebeke Kalkışlı Eksenel Akıllı Sürekli Miknatıslı Senkron Motor Performansına Etkisi	12	39.880,01	5.954,99
2019/49	Prof.Dr. Yakup BUDAK	Yağ alkollerini bazlı yeni faz değişim malzemelerinin sentezi, karakterizasyonu ve ısı enerjisi depolama özelliklerinin belirlenmesi	12	29.051,60	16.041,63
2019/50	Arş.Gör.Dr. Saniye DEMİR	Türkiye için İklim Projeksiyonlarının İki Farklı Senaryo ve WEPP Model ile Değerlendirilmesi	12	10.287,50	4.920,62
2019/51	Prof.Dr. Mustafa CEYLAN	2-Substitute-4,5-dihidrotyazol ve 7-Benziliden-5- (substitute)bisiklo [3.2.0] heptan-6-on Türevlerin Sentezi ve Karakterizasyonu	18	38.718,16	20.696,61
2019/52	Öğr.Gör.Dr. Leyla AYDOĞAN	Laparotomi uygulanan sıçanlarda yara iyileşmesi üzerine Kalkon-imid türevinin etkisinin araştırılması.	18	32.901,64	23.927,18
2019/54	Doç.Dr. Burcu GÜRDERE	Tiyadiazol ve Lakton Substitüe Yeni Enamin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Tayini	18	39.223,20	26.362,14
2019/40	Prof.Dr. Hacı Ömer ATEŞ	Bir Yüzey Yapışma Proteini Olan E-Kaderinin Pterijum Gelişimindeki Rolünün Araştırılması	24	39.999,18	39.902,60
2019/99	Doç.Dr. Aslıhan DEMİRDÖVEN	ŞEFTALİ POSASINDAN DOĞA DOSTU YÖNTEMLERDE DOĞAL RENK MADDESİ VE PREBİYOTİK DİYET LİFİ ÜRETİMİ	24	38.535,83	34.190,68
2019/87	Prof.Dr. İbrahim TÜRKEKUL	TOKAT İLİ YAYLACIK DAĞI MAKROFUNGUSLARIN MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER TANIMLANMASI	18	14.070,45	0,00
2019/88	Doç.Dr. Köksal DEVECİ	Remisyon ve atak dönemi FMF hastalarında inflamazom oluşumunu tetikleyen bazı genlerin potansiyel rollerinin	24	39.976,94	31.347,80

		incelenmesi ve bu genlerdeki epigenetik düzenlenmenin araştırılması			
2019/89	Prof.Dr. Ömer IŞILDAK	Epilepsi Tedavisinde Kullanılan Valproik Aside Duyarlı Biyosensör Geliştirilmesi	24	37.380,04	29.286,74
2019/90	Dr.Öğr.Üyesi Ercan ÇAÇAN	Kemodirenç oluşumunda baskılayıcı rolü olan bir proteinin overekspresyonunun, over kanserinde kemodirenci düşürmek amacıyla potansiyel kullanımının araştırılması	24	39.898,93	37.307,22
2019/80	Dr.Öğr.Üyesi Seçil Erden TAYHAN	Meme ve kolon kanser hücre hatlarından kanser kök hücrelerinin izolasyonu ve karakterizasyonu	24	39.954,00	39.607,08
2019/91	Prof.Dr. Mustafa CEYLAN	1-Fenil-3-(4-(piridin-2-il)tiyazol-2-il)üre Türevlerin Sentezi ve Anti-kanser Aktivitelerinin İncelenmesi	12	39.208,53	0,00
2019/81	Arş.Gör.Dr. Sema BİLGİN	Kiral Polifenolik Bileşiklerin MCF7, HT29, PC3 Kanser Hücrelerinin Migrasyonu Üzerine Etkisinin Moleküler Düzeyde Araştırılması	24	39.995,90	35.739,73
2019/39	Arş.Gör.Dr. Hülya KUDUĞ CEYLAN	Büyük Ölçekli Biyoreaktörlerde DNA Polimeraz Üretiminin Optimizasyonu	18	39.999,99	34.007,14
2019/56	Dr.Öğr.Üyesi Zeynep ACUNGİL	Penisilin ile oluşturulan deneysel epilepsi modelinde resveratrolün epileptogenezdeki etkilerinin morfolojik olarak incelenmesi	24	38.951,30	1.880,92
2019/53	Dr.Öğr.Üyesi Yaşar GÜLMEZ	TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ'NDE DOĞAL BAL ÜRETİMİ VE YÖREYE ÖZGÜ BALIN KALİTE KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ	10	39.978,35	39.758,64
TOPLAM					687.726,11

Tablo 21: 2019 Yılı DPT Destekli Projeler Gerçekleşme Tablosu

Proje No	Proje Yöneticisi	Proje Adı	Başlanma ve Bitiş Süresi	Proje Bütçesi	2019 Yılı Harcaması
2009K120720	Ömer İŞILDAK	Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	14.07.2019	9.407.000,00	665.450,20
TOPLAM				9.407.000,00	665.450,20

Tablo 22: 2019 Yılı TUBİTAK Destekli Projeler Gerçekleşme Tablosu

Proje No	Proje Yöneticisi	Proje Adı	Başlanma ve Bitiş Süresi	Proje Bütçesi	2019 Yılı Harcaması
1160332	SEFA TARHAN	Modern Hayvancılık İşletmelerinde Hayvanların Sağlık Durumlarındaki Değişimlerin İzlenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi	1.03.2017 / 1.06.2020	317.040,00	76.273,76
1170874	NİHAT YEŞİLAYER	Isırgan Otu (Urtica Sp.), Kadife Çiçeği (Tagetes erecta), Yonca (Medicago sativa) Gibi Farklı Bitkilerden Elde Edilen Ekstraktların ve Sentetik Ksantofil (Lutein-Zeaksantin) Karotenoidin Yeme İlavesinin Sarı Prenses (Labidochromis caeruleus) Balığının Renklenme ve Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri	1.03.2018 / 1.03.2019	29.090,00	6.600,00
117S542	ÖZLEM EĞRİ	Hypericum Perforatum Yağı Yüklenmiş Polimerik Membranların Yanık Yara İyileşmesinde Skar Doku Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi	1.11.2017 / 1.11.2018	90.250,00	700,00
1180751	MEHMET METİN ÖZGÜVEN	Görüntü İşleme Tekniği Kullanılarak Geliştirilecek Platform Üzerinden Hıyar Bitkisinden Alınan Görüntülerle İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus Urticae Koch.) Zarar Düzeyinin Belirlenmesi	15.11.2018 / 15.11.2019	30.000,00	16.380,00
1180777	İLKER KEPENEKÇİ	Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Buğday Gal Nematodu [Anguina Tritici (Steinbuch) Filipjev]'na Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi	15.01.2019 / 15.01.2020	26.500,00	26.499,99

118Z422	ESRA KOÇ	Kiral Polifenoller: Sentezi, Karakterizasyonu, Kanser ve Kanser Kök Hücrelerine Karşı Etkilerinin Araştırılması	1.11.2018 / 1.05.2021	462.600,00	171.229,61
214O420	İLKER KEPENEKÇİ	Patates Böceği [Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)] Mücadelesinde Entomopatojenik Nematod ve Fungusların Kullanım Olanakları	15.04.2015 / 15.04.2019	313.400,00	55.292,34
215E141	YASEMİN ÇETİN KAYA	Bulut Bilişim Ve Yerel Sunucu Tabanlı Mobil Hesaplama Çerçeve Yazılımının Geliştirilmesi	1.05.2016 / 1.05.2018	93.808,00	12.100,90
215S692	HACI ÖMER ATEŞ	Pterijumlu Hastalarda Retinoik Asit Sinyal Yolağı İle İlişkili Genlerin Araştırılması	1.05.2016 / 1.11.2018	376.700,00	27.375,00
217M910	TUĞBA ÖZDEMİR	Fibrötik Rahatsızlıklarının Tedavisinde Kullanılmak Üzere, Küçülen Fiber Çapı Özelliği Gösteren Ve Hyaluronik Asit Bazlı Sentetik Hidrojel Kaplamalı, Üç Tabakalı Fiber Biyomühendislik Doku İskelelerinin Üretilmesi.	1.04.2018 / 1.01.2021	93.580,00	0,00
217S533	SİNAN EĞRİ	Laparoskopik Apandektomi İçin Biyobozunur Kelepçe Ve Uygulama Aparatının Üretimi	1.06.2018 / 1.06.2020	197.844,00	95.169,26
4150045	MİHRİBAN ÇOŞKUN ARSLAN	GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ (GÖPİGİM)	1.06.2015 / 31.05.2018	130.571,00	33.427,45
TOPLAM				2.161.383,00	521.048,31

2019 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME TABLOSU

Sektör: Eğitim

Bin TL.

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı (Dış)	Proje Tutarı (Toplam)	2019 Kumülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Likit	Aktarma Miktarı	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Toplam Kumülatif Harcama
439	2019H031710	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP)	Özel Bütçe	2019-2019	Tokat	0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	1994H031270	Kampüs Altyapısı (DOKAP)	Özel Bütçe	1994-2021	Tokat	0	98.040,00	3.058,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.298,00
439	1994H031280	Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)	Özel Bütçe	1994-2020	Tokat	0	17.264,00	7.925,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172,00
439	2019H031730	Muhtelif İşler (DOKAP)	Özel Bütçe	2019-2019	Tokat	0	7.900,00	9.380,00	0,00	0,00	7.900,00	1.815,00	-70,00	0,00	0,00	9.380,00
439	2019H030840	Yayın Alımı (DOKAP)	Özel Bütçe	2019-2019	Tokat	0	1.100,00	1.193,00	0,00	0,00	1.100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00
TOPLAM						0	124.404,00	21.556,00	0,00	0,00	20.000,00	2.015,00	-70,00	0,00	0,00	113.043,00

Sektör: Sağlık

Bin TL.

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı (Dış)	Proje Tutarı (Toplam)	2019 Kumülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Likit	Aktarma Miktarı	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Toplam Kumülatif Harcama
439	2019I000700	Muhtelif İşler(DOKAP)	Özel Bütçe	2019-2019	Tokat	0	14.100,00	12.159,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	190,00	0,00	0,00	12.159,00
TOPLAM						0	14.100,00	12.159,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	190,00	0,00	0,00	12.159,00

Sektör: Teknolojik Araştırma Sektörü

Bin TL.

YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı (Dış)	Proje Tutarı (Toplam)	2019 Kumülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	Likit	Aktarma Miktarı	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Toplam Kumülatif Harcama
439	2019K120610	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi (DOKAP)	Özel Bütçe	2019-2019	Tokat	0	849,00	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
TOPLAM						0	849,00	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI YATIRIM ÖZETİ

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2018 Sonu Kümülatif Harcama			2019 Yılı Program Ödenek			2019 Yılı Revize Ödenek			2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Ekleme	Aktarma		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		124.404			43.952			20.000	2.015	-70	21.945			21.556
Sağlık	1		14.100			14.485			14.100			14.100			12.159
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		849						849			849			849
TOPLAM	7	0	139.353	0	0	58.437	0	0	34.949	2.015	-70	36.894	0	0	34.564
